

ACC

10000/120/6228

RE/04/4 (52 BLU)

ENGINEERS SITREF

MAR. 19, 1945 - NOV. 5, 1945

1/4 (52 BLO)

ENGINEERS SITREF

MAR. 19, 1945 - NOV. 5, 1945

6275
6204

Subject: Italian Engz Ed Caga - Sitrep.

52 British Liaison Unit,
CEP.

5 Nov 45.

RS/04/4/45.

172 CE Works,
HQ 2 District.

Ref your letter CE/908/3 dated 22 Sep 45.

Attached herewith Engz Sitrep of LANCASHIRE Inf Div
as at 1 Nov 45.

RS

dl
Lieut-Col.
GS.

6275

729

Engineer Sitrep - IERIANO Inf Division.As at 1 Nov 45.

Name of Unit.	Ratio Strength Oftrs	Ratio Strength Oftrs	Working Strength Oftrs.	Working Strength Oftrs.	Location.	Type of Employment.
3 Field Coy.	6	281	2	160	BERGAMO BRESCIA	Local repairs and bridge maint.
51 Field Coy	3	300	2	210	PAVIA	Guards and tryg.
3 Field Park Coy	3	210	2	90	PAVIA	Tryg and bridge maint on River TICINO.

COMANDO DI DIVISIONE DI FANTERIA "LEGNANO"
Sezione Operazioni e Informazioni
Ordinamento

N. 013218

di pret.

Bergamo, P.M. 155, li 3 Novembre 45

Oggetto : Sitrep Genio.-ALLA 52^a BRITISH LIAISON UNITS E D E

Rif. F. R.E./04/4 del 24/9/45.

Allegato si trasmette lo specchio richieste riferito al

31 Ottobre 1945.-



d'ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

-Col. F. Garofoli-

6273

S.I.T.R.E.P. GENIO riferito al 31 ottobre 1945.-

6272

Nominativo del reparto	Forza presente	Forza disponibile	Dislocazione	Impiego
3 ^a compagnia artieri	6 e 281	2 e 160	{ Bergamo Brescia	locali riparazioni li manutenzione te <i>Brescia</i>
51 ^a compagnia artieri	3 e 300	2 e 210	Pavia	addestramento guardie <i>Tr</i>
3 ^a compagnia Parco Cam- pale Genio	3 e 210	2 e 90	Pavia	addestramento manutenzioni ti sul T. <i>Trig. 4 Brescia on River</i>



I.T.R.E.P. GENIO riferito al 31 ottobre 1945.-

0272

Parte	Forza presente	Forza disponibile	Dislocazione	Impiego
1	6 e 281	2 e 160	{ Bergamo Brescia	local repairs & riparazioni loca- li manutenzione pon- te Bridge Maint
ri	3 e 300	2 e 210	Pavia	addestramento guardie Trng & Gds
Cam-	3 e 210	2 e 90	Pavia	Addestramento manutenzione pon- ti sul Ticino Trng & Bridge Maint on River Ticino



43

Subject: Italian Engr Pd Coys: Sitrep.

52 British Indian Unit,
CMB.

18 Oct 45.

RE/C2/4/45

172 OH Works,
HQ 2 District.

Ref your letter CR/908/6 dated 22 Sep 45.

Attached herewith Engineer Sitrep of LBSHANO Inf
Division, as at 15 Oct 45.

IES

ll
Lieut-Col.
GS.

6271

Engineer Sitrep - LECIANO Inf Division.As at 15 Oct 45.

6270

Name of Unit.	Ration Strength		Working Strength.		Location.	Type of Employment.
	Offrs.	ORs.	Offrs.	ORs.		
3 Field Coy	6	237	2	130	Lugo di Romagna. Martinengo	Lifting mindfields.
51 Field Coy	3	230	2	85	Pavia.	Training.
3 Field Park Coy	3	130	2	70	Pavia Milan	Training and fitting out barracks.

COMANDO DI DIVISIONE DI PANTERIA "LEGNANO"
Sezione Operazioni e Informazioni
Ordinamento

N. 01/ 2982 di prot.

Bergamo, P.M. 155, li 17 ottobre 1945.-

Oggetto: Sitrep Genio.-

ALLA 52^a BRITISH LIAISON UNIT

S E D E

Rif. f. R.E./04/4 del 24/9/45.

Allegato si trasmette lo specchio richiesto riferito al 15 ottobre 1945.-



d'ordine
DEL CAPO DI STATO MAGGIORE
- Col. F. Garofoli -

[Handwritten signature]

6269

S.I.T.R.E.P. GENIO riferito al 15 ottobre 1945.-

Nominativo del reparto	Forza presente	Forza disponibile	Dislocazione	Impi
3 ^a compagnia artieri	6 e 237	2 e 130	{Lugo di Romagna {Martinengo	Boni camp
51 ^a compagnia artieri	3 e 230	2 e 85	Pavia	Adde
3 ^a compagnia Parco Cam- pale Genio	3 e 130	2 e 70	{Pavia {Milano	Adde Sist ne c

E.P. GENIO riferito al 15 ottobre 1945.-

del reparto	Forza presente	Forza disponibile	Dislocazione	Impiego
ia artieri	6 e 237	2 e 130	{Lugo di Romagna Martinengo	Bonifica campi minati
ia artieri	3 e 230	2 e 85	Pavia	Addestramen- to
ia Parco Cam-	3 e 130	2 e 70	{Pavia Milano	Addestramen- to Sistemazio- ne caserme

41

Subject: Italian Enger Pz Coys - Sitrep.

52 British Liaison Unit,
Camp.

3 Oct 45.

HE/OA/4/41

172 CE Works,
HQ 2 District.

Reference your letter CE/208/8 dated 22 Sep 45.

Attached herewith Engineer Sitrep of LEXZIANO Gruppo
as at 1 Oct 45.


Lieut-Col.
GS.

6267

6266

Engineer Sitrep - LIBERNANO Gruppo.As at 1 Oct 45.

Name of Unit.	Ration Strength.		Working Strength.		Location.	Type of Work
	Offrs.	CRs.	Offrs.	CRs.		
'3 Field Coy	6	232	2	120	Lugo di Romagna. Martigneto.	} Lifting
'51 Field Coy	4	220	2	80	Pavia.	
'3 Field Park Coy	3	120	2	60	Pavia. Milan.	} Fitting

6266

ed - LIREMANO GRADO.

Ration Strength.		Working Strength.		Location.	Type of Employment.
Offrs.	ORs.	Offrs.	ORs.		
6	232	2	120	Lugo di Romagna. Martinengo.	} Lifting minefields.
4	220	2	80	Pavia.	
3	120	2	60	Pavia. Milan.	} Fitting out barracks.

COMANDO GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
Sezione Operazioni e Informazioni
Ordinamento

N. 01/2698 di prot.

Bergamo, P.M. 155, li 2 ottobre 1945.-

Oggetto: Sitrep Genio.-

ALLA 52^a BRITISH LIAISON UNIT

S E D E

Rif. F. R.E./04/4 del 24/9/45.-

Allegato si trasmette lo specchio richiesto riferito
al 1^o ottobre 1945.-



d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
- Col. F. Carofoli -

Off.

Ref RE/04/4 del 24/9/45.

We attach the table requested. Situation as at 1/10/45.

6265

SUBJECT : Engineer Sitrep.

52 British Liaison Unit

CMF

24 Sep 45

RE/04/4

HQ Legnano Combat Group.

1. Will you please forward a return giving state as at 1st and 15th of each month, in respect of all Engineer Coys working under your command.
2. The return should give the following information:-
 - (a) Name of unit
 - (b) Ration strength
 - (c) Working strength
 - (d) Location
 - (e) Type of Employment
3. The return refers specifically to Engineer Units, units of other Arms employed on Engineer Work need not be included.
4. The first return state should be rendered to this HQ, by the 2nd of Oct 45.
5. Authority for the above is 172 C.E. Works HQ 2 District letter ref CE/908/8 dated 22 Sep 45.

/aa

fl
Lieut Col
GS

6264

RE/ 38
all
Subject:- Italian Engineer Field Coys - Sitron.

172 C.E. Works.
HQ. No. 2 Dist.
Tel : MILAN 12241-8
Ext : 146
Ref : CE/908/8

Date: 27 Sep 45.

51 B.L.U.
52 B.L.U.
53 B.L.U.
56 B.L.U.

1. Will you please forward to this HQ a return giving state as at 1st and 15th of each month, in respect of all Italian Engr Coys, working under your control.

2. The return should give the following information:-

- (a) Name of unit
- (b) Ration strength
- (c) Working strength
- (d) Location
- (e) Type of employment

3. The return refers specifically to Engineer Units. Units of other Arms employed on Engineer work need not be included.

J. B. Ponsich
Brigadier,
Chief Engineer.

/GTC.

Copy to:- 50 B.L.U.

6263

GRUPPO I COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Comando 11° Battaglione Genio =

n° 38

P.M. 155, li 27 aprile 1945

PERIODO / dalle ore 18,00 del 26/4/1945 alle ore 18,00 del 27/4/1945. =

A. - n. n.
B. - n. n.
C. - n. n.
D. - n. n.
E. - n. n.
G. - n. n.
H. - n. n.
Y. - n. n.
K. - n. n.
L. - n. n.
M. - n. n.

Sp/ro: Maggiore Enzo Vescovini)

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT


= Posta Militare 155 =

n° 38

P.M. 155,11 27 aprile 1945

PERIODO / dalle ore 18,00 del 26/4/1945 alle ore 18,00 del 27/4/1945. =

A. - n. n.
B. - n. n.
C. - n. n.
D. - n. n.
E. - n. n.
F. - n. n.
G. - n. n.
H. - n. n.
I. - n. n.
J. - n. n.
K. - n. n.
L. - n. n.
M. - n. n.

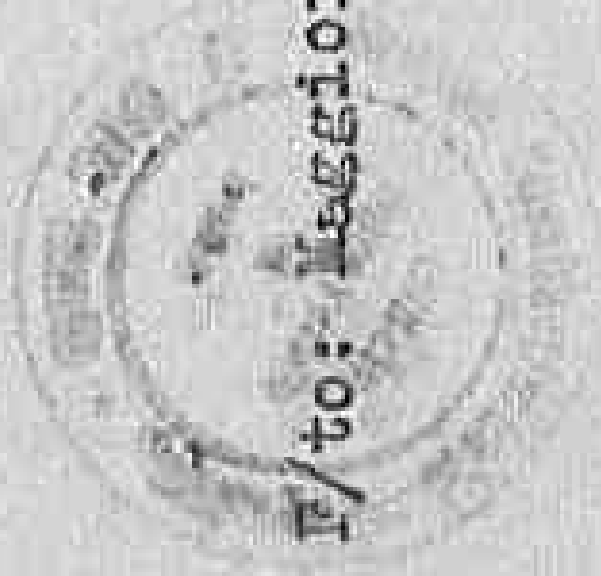

F.to: Maggiore Enzo Vescovini)

~~~~~

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

= Posta Militare 155 =

6262



37

GRUPPO DI COMBATTIMENTO LEGNANO  
Comando LI° Battaglione Genio

P.M.155, li 26 aprile 1945.-

n. 378.

PERIODO dalle ore 18,00 del 25/4/1945 alle ore 18,00 del  
26/4/1945.-

|    |    |    |
|----|----|----|
| A. | n. | n. |
| B. | n. | n. |
| C. | n. | n. |
| D. | n. | n. |
| E. | n. | n. |
| F. | n. | n. |
| G. | n. | n. |
| H. | n. | n. |
| I. | n. | n. |
| K. | n. | n. |
| L. | n. | n. |
| M. | n. | n. |

Firmato: MAGGIORE ENZO VESCOVINI



6261



at <sup>Hu</sup> 52 B.H. 36

N. 37 P.M. 155 li 25-4-45

Periodo dalle ore 1800 del 24-4-45 alle ore 1800 del  
25-4-45

A - n.n.

B - n.n.

C - n.n.

D - n.n.

E - n.n.

G - n.n.

H - n.n.

I - n.n.

K - n.n.

L - n.n.

M - n.n.

fto. Maff. Veronini

6267



at 52 R.L.U.

35

N.° 36 P.M. 165, L. 94-4-45

Periodo. dalle ore 1800 del 22-4-45 alle ore 1800 del 24-4-45.Dislocazione: ImmutataAttività operativa: 51<sup>a</sup> Compagnia Anticri - Primo e terzo plotoneDislocazione del quarto plotone Trebbio (862 550)2<sup>a</sup> Compagnia Anticri - Primo plotone dislocazione di un  
terzo plotone (846 567)

F.° Acciaio



6259



GRUPPO DI COMPARTIMENTO LEGNANO  
Comando II° Battaglione Genio

n. 31.-

P.M. 155, il 20 aprile 1945.-

PERIODO delle ore 1800 del 19/4/1945 - ore 1800 del 20/4/1945.-

AL 52° B. I. U.

a) - DISLOCAZIONE : 51<sup>a</sup> Compagnia Artieri : Immutata.-

- 1° Plotone si è spostato a (818326)
- 2° Plotone al seguito del 68° Rgt. Fanteria.-
- 3° Plotone si è spostato a (918326)
- 3<sup>a</sup> Compagnia Artieri : Immutata.-
- 1° Plotone : Immutata,
- 2° Plotone si è spostato a 918326)
- 3° Plotone al seguito del Btg. "Goito".-

b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

= 3<sup>a</sup> Compagnia Artieri :

= 1° Plotone : ha costituito un ponte BAILEY Bridge a C. Marchetti (934317); ha provveduto alla costruzione di una diversione a a Ca di Razzone (937324); ha scaricato le interruzioni di fondo Valle "Idice"; ha riparato un cratere a (936323).

II° Plotone : ha costruito un diversione a (928326) con guado sul fiume Zena.

III° Plotone : una squadra ha tolto circa 300 mine di tipo allentato a (937324); ha aperto varchi per carri armati fino a (950346) togliendo 51 mine "S" a 940327) 24 mine "TOPP" a 949344), 23 mine C S 42 a (941331); 53 OS 42 a (949344); mancano notizie del rimanente del plotone.-

= 51<sup>a</sup> Compagnia Artieri :

I° Plotone : ha lavorato su di una diversione da (918326) a (921328).

II° Plotone : ~~ha lavorato su di una diversione da~~ non si hanno notizie.-

III° Plotone : ha lavorato per riempimento crateri e sgombero strada da mine e macerie nel tratto da (921328) a (925322).-

Campo minato nemico (Stech mine) a (92073280). Tolti 20 stech mine.

RE/04/4-314



- a) - DISLOCAZIONE : 51<sup>a</sup> Compagnia Artiglieri : Immutata.
- 1<sup>o</sup> Plotone si è spostato a (818326)
  - 2<sup>o</sup> Plotone al seguito del 68<sup>o</sup> Rgt. Fanteria.-
  - 3<sup>o</sup> Plotone si è spostato a (918326)
  - 3<sup>a</sup> Compagnia Artiglieri : Immutata.-
  - 1<sup>o</sup> Plotone : Immutata,
  - 2<sup>o</sup> Plotone si è spostato a 918326)
  - 3<sup>o</sup> Plotone al seguito del Btg. "Goito".-

b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

= 3<sup>a</sup> Compagnia Artiglieri :

- = 1<sup>o</sup> Plotone : ha costruito un ponte BAILEY Bridge a C. Marchetti (934317); ha provveduto alla costruzione di una diversione a Ca di Razzene (937324); ha scaricato le interruzioni di fondo Valle "Idice"; ha riparato un cratere a (936323).
- II<sup>o</sup> Plotone : ha costruito un diversione a (928326) con guado sul fiume Zena.
- III<sup>o</sup> Plotone : una squadra ha tolto circa 300 mine di tipo allieto a (937324); ha aperto varchi per carri armati fino a (950346) togliendo 51 mine "S" a 940327) 24 mine "TOPF" a 949344), 23 mine C S 42 a (941331); 53 CS 42 a (949344); mancano notizie del rimanente del plotone.-

= 51<sup>a</sup> Compagnia Artiglieri :

- I<sup>o</sup> Plotone : ha lavorato su di una diversione da (918326) a (921328).
  - II<sup>o</sup> Plotone : ~~ha lavorato su di una diversione da (918326) a (921328).~~ non si hanno notizie.-
  - III<sup>o</sup> Plotone : ha lavorato per riempimento crateri e sgombero strada da mine e macerie nel tratto da (921328) a (925322).-
- Campo minato nemico (Stech mine) a (92073280). Tolti 20 stoch mine.-

6252





ConfirmationCONFIDENTIAL

LEGMANO COMBAT GROUP  
HQ 51st Engineer Bn

NO 32PM 155 20 Apr 45PERIOD: 1800hrs 19 Apr 45 to 1800hrs 20 Apr 45

(A) LOCATIONS: 21st Fd Coy HQ unchanged  
 First Pl moved to 818326  
 Second Pl following up 68th Inf Regt  
 Third Pl moved to 918326

3rd Fd Coy HQ unchanged  
 First Pl unchanged  
 Second Pl moved to 918326  
 Third Pl moving up with 601TO Bn  
 (Speciale Regt)

(B) EMPLOYMENT3rd Fd Coy

First Pl: constructed Bailey (40'0" S/S Class 30) at OASA di  
 MARCHETTI (934317), diversion (one way) at OASA di  
 RAZZONE (937324), removed obstacles in IDICE valley;  
 filled in crater at 935363

Second Pl: completed one way diversion at 928326

Third Pl: one squad lifted 300 mines of mixed allied types at  
 937324; cleared gap for armoured cars at  
 950346, lifting 51 '8' mines at 940327; 24 "TOPP"  
 mines at 949344; 23 C S 42 at 941331; 53 C S 42 at  
 949344. No news from remainder of Pl.

51st Fd Coy

First Pl: worked on diversion from 918326 to 921328.

Second Pl: no news

Third Pl: Filled in crater and cleared mines and rubble on rd  
 from 921328 to 925322.  
 20 stock mines lifted from stock minefield at  
 92073280.



(A) LOCATIONS: 51st FA Coy

HQ unchanged  
 First Pl moved to 818326  
 Second Pl following up 68th Inf Regt  
 Third Pl moved to 918326

3rd FA Coy

HQ unchanged  
 First Pl unchanged  
 Second Pl moved to 918326  
 Third Pl moving up with GOINO Bn  
 (Speciale Regt)

(B) EMPLOYMENT3rd FA Coy

First Pl: constructed Bailey (40'0" S/S Class 30) at CASA di  
 MAROHETTI (934317), diversion (one way) at CASA di  
 RAZZORE (937324), removed obstacles in IDICE valley;  
 killed in crater at 935383

Second Pl: completed one way diversion at 928326

Third Pl: one squad lifted 300 mines of mixed allied types at  
 927324; cleared gap for wounded armored cars at  
 950340. Lifting 51st Mines at 940327; 24 "TOPP"  
 mines at 949344; 23 G S 42 at 941331; 53 G S 42 at  
 949344. No news from remainder of Pl.

51st FA Coy

First Pl: worked on diversion from 918326 to 921326.

Second Pl: no news

Third Pl: Filled in crater and cleared mines and rubble on rd  
 from 921326 to 925322.  
 20 stock mines lifted from Stock Minefield at  
 92073260.

Coord Engr Bn

(signed) Major Enzo Vesgovini

6257



32  
CONFIDENTIAL

HQ Legnano Combat Group  
HQ 51 Engr Bn

Situation Report No 31Period 181800 to 191800

## A. Locations - unchanged.

## B. Employment:

51 Fd Coy

1st Pl: Reorg of tools and materials  
2nd Pl: Completed checking pt 590 (954308) for  
mines : NONE found.  
3rd Pl: Maint of rd from 932296 to 944271.

3 Fd Coy:

1st Pl: Maint of obstacles in bottom of IDICE  
valley; squad sent with raiding party  
to C.MERLA lifted 15 Schumines and 3  
'S' mines  
2nd Pl: Maint of rd from 926273 to 944271  
3rd Pl: Spt Special Regt in ops. Not known where  
action is taking place but will be congn  
later.

## C. Eqpt held:

Bridging (Bailey eqpt)  
Panel loads 1 )  
Decking loads 2 )  
Ramp loads 1 ) at Map ref 933317  
Accessory loads 1 )

Comd Engr Bn  
Signed Major E.VESCOVINI



## A. Locations - unchanged.

B. Employment:51 Fd Coy

1st Pl: Reorg of tools and materials  
 2nd Pl: Completed checking pt 590 (954308) for  
 mines: NONE found.  
 3rd Pl: Maint of rd from 932296 to 944271.

3 Fd Coy:

1st Pl: Maint of obstacles in bottom of IDICE  
 valley; squad sent with raiding party  
 to C.MERLA lifted 15 Schumines and 3  
 'S' mines  
 2nd Pl: Maint of rd from 926273 to 944271  
 3rd Pl: Spt Special Regt in ops. Not known where  
 action is taking place but will be comm  
 later.

C. Eqpt held:

Bridging (Bailey eqpt)  
 Panel loads 1 )  
 Decking loads 2 )  
 Ramp loads 1 )  
 Accessory loads 1 )  
 at Map ref 933317

Comd Engr Bn  
 Signed Major E.VESCOVINI

6256



n. 31.-

GRUPPO DI COMBATTIMENTO REGIA

Comando 11° Battaglione Genio 11 19/4/1945.-

PERIODO/ore 1800 del 18/4/1945 alle ore 1800 del 19/4/1945.-

a) - DISLOCAZIONE : Immutata?=-b) - ATTIVITA' OPERATIVA :518 Compagnia Artieri :

- I° Plotone : Rieordino attrezzi e materiali.-

- II° Plotone : ha ultimato il lavoro di bonifica della quota 590 (954308); nessuna mina trovata.-

- III° Plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (944271).-

3° Compagnia Artieri :

- I° Plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo Valle Idice; la squadra inviata col Battaglione "AGILA" ha rinvenuto quindici Shamine e 3 S mine presso C. Morla.-

- II° Plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (944271).-

- III° Plotone : ha preso parte alle operazioni col Reggimento Speciale; non si sa ancora quale è stata la sua attività; si sarà data comunicazione in seguito.-

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE  
(Maggiore Enzo Vescovini)

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

6255



(31)

LAGNANO COMBAT GROUP  
HQ 51st Engineer Bn

PM 155 18 April 45

No 30

PERIOD 1800hrs 17 Apr 45 to 1800hrs 18 Apr 45

To : CG II US Corps  
Office of the Engineer

(A) LOCATIONS : Second Pl 51st Pz Coy moved to 957300. All other locations unchanged.

(B) EMPLOYMENT

51st Pz Coy

First Pl : reorganisation of tools and equipment.

Second Pl : Moved to 957300, begun clearance of mines at Pt 590 (954300)

Third Pl : maintenance of road from 932255 to 944271.

3rd Pz Coy

First Pl : maintenance of obstacles in bottom of IDICE valley ; maintenance of road from 926273 to 944271, two sappers took part in raid on CASA AREA.

Second Pl : Reorganisation of tools and stores.

Third Pl : Completed widening and improvement of track from 929323 to 929276.

(C) EQUIPMENT HELD

Bridging (Bailey Bqpt)

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| Panel Loads | 1 | ) |
| Decking "   | 2 | ) |
| Ramp        | 1 | ) |

at map ref 923317



(A) LOCATIONS :

Second Pl 51st RA Coy moved 204957800. All other locations unchanged.

(B) EMPLOYMENT51st RA Coy

First Pl : reorganization of tools and equipment.

Second Pl : Moved to 957300, began clearance of mines at Pt 590 (954300)

Third Pl : maintenance of road from 932256 to 944271.

3rd RA Coy

First Pl : maintenance of obstacles in bottom of POISE valley ; maintenance of road from 926273 to 944271, two sappers took part in raid on GABA AREA.

Second Pl : reorganization of tools and stores.

Third Pl : completed widening and improvement of track from 929323 to 929275.

(C) EQUIPMENT HELDBridging (Bailey Eqt)

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| Panel Loads | 1 | } at map ref 933317 |
| Decking "   | 2 |                     |
| Ramp "      | 1 |                     |
| Accessory " | 1 |                     |

0256

Comd Engr BN

(signed) Major Enzo Vescovini



GRUPPO DI COMBATTIMENTO LEBANO  
Comando LI° Battaglione Genio

n. 30.6

P.M. 155, li 18 aprile 1945.-

PERIODO : ore 1800 del 17/4/1945 alle ore 1800 del 18/4/1945.-

Al 92° B. I. U.

a) - DISLOCAZIONE : Il I° Plotone della 51° Compagnia Artieri si è spostato a (957300).-

b) - Attività operativa :

= 51° Compagnia Artieri :

I° Plotone : Riordino attrezzi e materiali.-

II° Plotone : Si è spostato a (957300); ha iniziato il lavoro di sgombero delle mine sulla quota 590 (954500).-

III° Plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (944271).-

= 3° Compagnia Artieri :

I° Plotone ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo Valle Idive. ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (944271); una pattuglia di due minatori ha preso parte all'azione del Reggimento Fanteria Speciale su Ca Meila.-

II° Plotone Riordino attrezzi e materiali.-

III° Plotone ha ultimato i lavori di allargamento e miglioramento del fondo del sentiero da (929525) a (929276).-

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE  
(MAGGIORE G. VESCOVINI)

6253



PERIODO : ore 1800 del 17/4/1945 alle ore 1800 del 18/4/1945.-

Al 51° B. I. N.

a) - DIRIGIBILITÀ : Il II° Plotone della 51ª Compagnia Artieri si è spostato a (957800).-

b) - Attività operativa :

- 51ª Compagnia Artieri :

I° Plotone : Riordino attrezzi e materiali.-

II° Plotone : SI è spostato a (957300); ha iniziato il lavoro di sgombero delle mine sulla quota 590 (954308).-

III° Plotone : ha provveduto alla manutenzione delle strade da (952296) a (944271).-

- 5ª Compagnia Artieri :

I° Plotone ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo Valle Idive. ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (944271); una pattuglia di due minatori ha preso parte all'azione del Reggimento Fanteria Speciale su G. Merle.-

II° Plotone Riordino attrezzi e materiali.-

III° Plotone ha ultimato i lavori di allargamento e miglioramento del fondo del sentiero da (929325) a (929276).-



IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE e f s  
(MAGGIORE E. VESCOVINI)  
*E. Vesconi*  
6253







(B) 2d Coy2d st rd CoyFirst Pl: Moved to location 929277Second Pl: Reorganization of tools and storesThird Pl: Modified O.F. and O.P. during the night; maint of rd from 932296 to 9442713rd rd CoyFirst Pl: Maint of obstacles in bottom of MICH Valley; maint of rd from 928273 to 944271Second Pl: Reorganization of tools and storesThird Pl: Enlarged and improved track from 929223 to 929276(C) EQUIPMENT FIELD

Bridging (Bailey Sapt)

|             |   |   |                |
|-------------|---|---|----------------|
| Panel loads | 1 | ) |                |
| Decking "   | 2 | ) | Map Ref 933317 |
| Pump "      | 1 | ) |                |
| Accessories | 1 | ) |                |

6252

COMM BRIG EN

(signed) Major Enzo Vescevisi



GRUPPO DI COMBATTIMENTO LEGGERO  
Comando 11° Battaglione Genio

n. 29.-

1945, 11-17 aprile 1945.-

PERIODO / ore 1800 del 16/4/1945 - ore 1800 del 17/4/1945.-

AL 52° B. M. U.

a) - DISLOCAZIONE : 1° Plotone 51° Cp. Artieri a 927277.-

b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

= 51° Compagnia Artieri :

I° Plotone : Si è spostato a (927277).-

II° Plotone : Riordino attrezzi e materiali.-

III° Plotone : Durante le ore notturne ha eseguito lavori di modifica all'osservatorio e posto di Comando; ha provveduto alla manutenzione della strada da (922296) a (944271).-

= 52° Compagnia Artieri :

I° Plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo Valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (925273) a (944271).-

II° Plotone : Riordino attrezzi e materiali.-

III° Plotone : ha provveduto all'allargamento e miglioramento del sentiero da (929323) a (929276).

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE  
(MAGGIORE VESOVINI)



6251



LEGHANO COMBAT GROUP  
Hq 21st Engineer BN

29  
 No 28

PM 155 16 Apr 45

PERIOD 1800Hrs 15 Apr 45 to 1800Hrs 16 Apr 45

(A) LOCATIONS No change

(B) EMPLOYMENT

51st Pz Cdr

First Pl : construction of O.P. and dugout

Second Pl : Reorganisation of tools and stores

Third Pl : Reorganisation of tools and stores : main  
 maintenance of Rd from 932296 to 944271

3rd Pz Coy

First Pl : maintenance of obstacles in bottom of LDIC3  
 valley ; maint of road from 926273 to 944271

Second Pl : Reorganisation of tools and stores

Third Pl : Reorganisation of tools and materials.  
 in Org - 1 & uniform. Track from  
 927323 to 939276

(C) EQUIPMENT HELD

Bridging (Bailey Bridge)

|             |     |
|-------------|-----|
| Panel loads | 1 ) |
| Decking "   | 2 ) |
| Ramp "      | 1 ) |
| Accessory   | 1 ) |

at map ref 933317



## (B) EMPLOYMENT

51st Pd Coy*moved to 927277*First Pl : construction of O.T. and dugoutSecond Pl : Reorganisation of tools and storesThird Pl : Reorganisation of tools and stores : ~~main~~

maintenance of Rd from 932295 to 944271

*modified OP & E.P. along the way**main rd. from*3rd Pd CoyFirst Pl : maintenance of obstacles in bottom of IDIOE valley ; maint of road from 926273 to 944271.Second Pl : Reorganisation of tools and storesThird Pl : Reorganisation of tools and materials.*In Comd of 2 companies. Task from 927323 to 979276.*

## (C) EQUIPMENT HELD

## Bridging (Bailey Equpt)

|             |   |   |  |
|-------------|---|---|--|
| Panel Loads | 1 | } |  |
| Decking "   | 2 | } |  |
| Ramp        | 1 | } |  |
| Accessory   | 1 | } |  |

at map ref 933317

Comd Lngr Bn

(signed) Major Enzo Vercovini

6250



GRUPPO DI COMBATTIMENTO LEGNANO  
Comando III° Battaglione Genio

n. 28.-

P.M.155, 11 16 aprile 1945.-

P E R I O D O / ore 1800 del 15/4/1945 alle ore 1800 del 16/4/1945.-

a)- DISLOCAZIONE : Inmutata.-

b)- ATTIVITA' OPERATIVA :

= 51° Compagnia Artieri :

I° Plotone : ha lavorato alla costruzione di un osservatorio e ricovero.-

II° Plotone : Riordino attrezzi e materiali.-

III° Plotone : riordino attrezzi e materiali; manutenzione della strada da (932296) a (944271).-

= 3° Compagnia Artieri :

I° Plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo Valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da ( 926273) a (944271).-

II° Plotone : Riordino attrezzi e materiali.-

III° Plotone : riordino attrezzi e materiali.-



IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE  
(MAGGIORE E. VESCOVINI)



- a)- DISLOCAZIONE : Immutata.-  
 b)- ATTIVITA' OPERATIVA :

= 51<sup>a</sup> Compagnia Artieri :

- I<sup>o</sup> Plotone : ha lavorato alla costruzione di un osservatorio e ricovero.-
- II<sup>o</sup> Plotone : Riordino attrezzi e materiali.-
- III<sup>o</sup> Plotone : riordino attrezzi e materiali; manutenzione della strada da (932296) a (944271).-

= 3<sup>a</sup> Compagnia Artieri :

- I<sup>o</sup> Plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo Valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da ( 926273) a (944271).-
- II<sup>o</sup> Plotone : Riordino attrezzi e materiali.-
- III<sup>o</sup> Plotone : riordino attrezzi e materiali.-



IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE  
 (MAGGIORE) Z. VESCOVINI

6249



LEGnano COMBAT GROUP  
HQ 51st Engineer Bn

15 APR 45

Mo 27

PERIOD 1800hrs 14 Apr 45 to 1800hrs 15 Apr 45

To : CG II US Corps  
(Office of the Engineer)

(A) LOCATIONS No change

(B) EMPLOYMENT

51 st Ed Coy

First Pl : construction of O.P. and dugout.

Second Pl : completed widening and improvement of track  
from 956303 to 958307 (one way), during hours  
of darkness

Third Pl : (plus part First Pl) completed construction of  
O.P., O.P. and dugout.

3rd Ed Coy

First Pl : maintenance of obstacles in IDICE valley, maint  
of road from 926273 to 944271

Second Pl: Reorganisation of tools and stores

Third Pl : widening and improving foundations of road  
from 921316 to 925315 (one way)

Diversion at CASA DEI MARCHETTI awaiting erection of 30' 0" S/S  
Bailey to complete. (Bailey to be erected on orders from HQ  
Legnano Combat Group)

(C) EQUIPMENT HELD

Bridging (Bailey Eqpt) :-

28



(A) LOCATIONS(B) EMPLOYMENT51st Fd Coy

First Pl : construction of O.P. and dugout.

Second Pl : completed widening and improvement of track from 956303 to 958307 (one way), during hours of darkness

Third Pl : (plus part First Pl) completed construction of O.P., G.P. and dugout.

3rd Fd Coy

First Pl : maintenance of obstacles in IDICE valley, maintenance of road from 926273 to 944271

Second Pl : Reorganisation of tools and stores

Third Pl : widening and improving foundations of road from 921316 to 925315 (one way)

Diversion at CASA DEL MARCHETTI awaiting erection of 30' 0" S/S Bailey to complete. (Bailey to be erected on orders from HQ Legnano Combat Group)

(C) EQUIPMENT HELDBridging (Bailey Eqmpt) :-

|             |     |                   |
|-------------|-----|-------------------|
| Panel units | 1 ) |                   |
| Decking "   | 2 ) |                   |
| Ramp "      | 2 ) |                   |
| Accessory " | 1 ) |                   |
|             |     | at map ref 933317 |

6248

Comd Engr Bn

(signed) Major Enzo Vescovinì



**GRUPPO DI COMBATTIMENTO LEGNANO**  
Comando 11° Battaglione Genio

P.M. 155, li 15 aprile 1945.-

n. 27.-

PERIODO / ore 1800 del 14/4/45 alle ore 1800 del 15/4/45.-

AL 52° B. L. U.

a) - DISLOCAZIONE : Inmutata.-

b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

- 51° Compagnia Artieri :

I° Plotone : ha lavorato alla costruzione di un osservatorio e ricovero.-

II° Plotone : ha ultimato lavori per miglioramento e allargamento pista da (956303) a (958307) lavorando durante le ore notturne.-

III° Plotone : con l'aiuto del 1° plotone ha ultimato la costruzione di un ricovero, un osservatorio e un posto di Comando.-

= 3° Compagnia Artieri :

I° Plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo Valle Idice; ha eseguito la manutenzione della strada da (926273) a (944271).-

II° Plotone : Riordino attrezzi e materiali.-

III° Plotone : ha provveduto al miglioramento del fondo e allargamento della strada da (921316) a (925315).-



IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE  
(MAGGIORE P. VESCOVINI)



a) - DISLOCAZIONE : Inmutata.-

b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

- 51° Compagnia Artiglieri :

I° Plotone : ha lavorato alla costruzione di un osservatorio e ricovero.-

II° Plotone : ha ultimato lavori per miglioramento e allargamento pista da (956303) a (958307) lavorando durante le ore notturne.-

III° Plotone : con l'aiuto del I° plotone ha ultimato la costruzione di un ricovero, un osservatorio e un posto di comando.-

- 3° Compagnia Artiglieri :

I° Plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo Valle Idice; ha eseguito la manutenzione della strada da (926273) a (944271).-

II° Plotone : Ricorda attrezzi e materiali.-

III° Plotone : ha provveduto al miglioramento del fondo e allargamento della strada da (921316) a (925315).-



COMANDANTE DEL BATTAGLIONE  
(MAGGIORE F. VESCOVINI)

*ef. f. f.*



CONFIRMATION

M/cu

ERCEANO COMBAT GROUP  
HQ 51st Engineer Bn

PM 155 14 April 45

No 26PERIOD 0800hrs 14 Apr 45 to 1800hrs 14 Apr 45

To : CG II US Corps  
(Office of the Engineer)

(A) LOCATIONS No change(B) EMPLOYMENT51st Fd CoyFirst Pl : camouflaging O.P.Second Pl : widening and improvement of rd, from 956302 to 958308.Third Pl : constructing O.P. and C.P.3rd Fd CoyFirst Pl : continued maintenance of road from 926273 to 944271; maintenance of obstacles in bottom of IDICE valley.Second Pl : continued preparation of diversion at CASA dei MARCHETTIThird Pl : Reorganisation of tools and equipment.

Comd Engineer Battalion

(signed) Major Enzo Vescovin

27



To : CG II US Corps  
(Office of the Engineer)

(A) LOCATIONS No change

(B) EMPLOYMENT

51st Pz Coy

First Pl : camouflaging O.P.

Second Pl : widening and improvement of rd, from 956302 to 958308.

Third Pl : constructing O.P. and C.P.

3rd Pz Coy

First Pl : continued maintenance of road from 926273 to 944271; maintenance of obstacles in bottom of IDICE valley.

Second Pl : continued preparation of diversion at CASA dei MARCHETTI

Third Pl : Reorganisation of tools and equipment.

Comd Engineer Battalion  
(signed) Major Enzo Vescovini

6246



M/cu;

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"  
 = Comando 51° Battaglione Genio =  
 ~~~~~

n° 26

P.M. 255, 11 14 aprile 1945

PERIODO / dalle ore 0800 del 14/4/45 alle ore 1800 del 14/4/45.

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT
 ~~~~~

a) - DISLOCAZIONE / Inmutata.-

b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

= 51° Compagnia Artigieri :

- I° plotone : ha eseguito lavori di ricovero dell'osservato-  
rio.-
- II° plotone : ha eseguito lavori per allargamento e migliora-  
mento della strada da (956302) a (958303) du-  
rante la ore notturne.-
- III° plotone : ha eseguito lavori per l'osservatorio e il po-  
sto di comando.-

= 30° Compagnia Artigieri :

- I° plotone : ha eseguito la manutenzione della strada da  
(926273) a (944271); ha provveduto alla manu-  
tenzione delle interruzioni di fondo valle  
Idice.-
- II° plotone : ha eseguito lavori preparatori per diversio-  
ne di Ca. Marchetti.-
- III° plotone : riordina attrezzi e materiali.-

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE

(Maresciallo Enzo Vesnovini)

6245



MS/cu

LEGNANO COMBAT GROUP  
HQ 51st Engineer Bn.

(26)

NO 25PM 155 14 Apr 45PERIOD 0800hrs 13 Apr 45 to 0800hrs 14 Apr 45(A) LOCATIONS No change(B) EMPLOYMENT51st En CoyFirst Pl : reorganisation of Tools and EqptSecond Pl : reorganisation of Tools and EqptThird Pl : maintenance of rd from 932296 to 944271 :  
C.P. and O.P. completed.3rd En CoyFirst Pl : maintenance of rd from 926273 to 944271Second Pl : continued preparation of diversion at CASA dei  
MARCHETTIThird Pl : reorganisation of Tools and Eqpt.

Comd Engr Bn.

(signed) Major Enzo Vescovini

6244



MS/cv.

GRUPPO DI SOGGIORNAMENTO "LEGNANO"  
 = Comando 51° Battaglione Genio =  
 ~~~~~

n° 25

F.N. 155, 11 14 aprile 1945

P E R I O D O / dalle ore 0600 del 13/4/45 alle ore 0800 del 14/4/45.

a) - DISLOCAZIONE : Inmutata.-b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

= 51° Compagnia Artieri :

- I° plotone : riordino attrezzi e mezzi.-
- II° plotone : riordino attrezzi e mezzi.-
- III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (944271); ha ultimato i lavori per la costruzione di un osservatorio e di un posto comando.-

= 3° Compagnia Artieri :

- I° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (936273) a (944271).-
- II° plotone : ha eseguito lavori preparatori per diversione di Ca Marchetti.-
- III° plotone : riordino attrezzi e materiali.-

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE a f.s.
 (Vergione Enzo Vescovin)

Subject :- Situation Reports

52 British Liaison Unit
CMP

14 Apr 45

RE/04/4/25

Comd

51st Engr Bn

Confirming telephone conversation (Ten Dragons -
Capt Davies of 0915hrs 14 Apr).

The Corps Engineer now requires Situation Reports to
cover the period from 1800hrs to 1800hrs NOT 0800 - 0800hrs
as previously.

The translated Situation Report must reach the Office
of the Engineer by 1000hrs the following day.

Can you, therefore, please arrange for the Report to
reach this office by 1830hrs daily to enable the Dispatch
Rider from 11 Corps to take it with him at 1900hrs each
day from the BLU.

If there is any special work to report (e.g. compli-
ation of a diversion, etc) will you please telephone the
information to me immediately to enable me to forward it
to 11 Corps before the Situation Report arrives.

CLD/aa


Captain
S.O.R.E.

6242

M/ou

LEGHANO COMBAT GROUP
 HQ 51st Engineer Bn.

Mo 24PM 155 13 Apr 45PERIOD 0800hrs 12 Apr 45 to 0800hrs 13 Apr 45

To : CG II US Corps
Office of the Engineer

A. LOCATIONS No changeB. EMPLOYMENT51st Fd Coy

First Pl : maintenance and improvement of road from 948283 to 944271; mine sweeping carried out on rd from CASA DEI MARCHETTI (933318) to CASA DI FAZZONE (937323) during hours of darkness.

Second Pl : Reorganisation of M.T. and stores.

Third Pl : maintenance of road from 932296 to 928283; continued construction of C.P. and O.P. during hours of darkness.

3rd Fd Coy

First Pl : maintenance of obstacles in bottom of IDIOE valley; maintenance of road from 926273 to 929277 using 7 truckloads of stone.

Second Pl : preparation of diversion at CASA dei MARCHETTI (933318)

Third Pl : Re-organisation of equipment and stores.

Comd Engr Bn

(signed) Major Enzo Vescovini.

A. LOCATIONS

No change

B. EMPLOYMENT

51st Pz Coy

First Pl : maintenance and improvement of road from 948283 to 944271; mine sweeping carried out on rd from CASA DEI MARCHETTI (933318) to CASA DI RAZZONE (937323) during hours of darkness.

Second Pl : Reorganisation of M.T. and stores.

Third Pl : maintenance of road from 932296 to 928283; continued construction of C.P. and O.P. during hours of darkness.

3rd Pz Coy

First Pl : maintenance of obstacles in bottom of IDICE valley; maintenance of road from 926273 to 929277 using 7 truckloads of stone.

Second Pl : preparation of diversion at CASA dei MARCHETTI (933318)

Third Pl : Re-organisation of equipment and stores.

Comd Engr Bn

(signed) Major Enzo Vescovinì.

6241

M/ce.

GRUPPO COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Comando 51^o Battaglione Genio =

N° 24

P. M. 155, il 13 aprile 1945

PERIODO dalle ore 0800 del 12/4/45 alle ore 0800 del 13/4/45.

AL 52^o BRITISH LIAISON UNIT

a) DISLOCAZIONE : Limitata.b) ATTIVITA' OPERATIVA := 21^a Compagnia Artieri :

- I^o plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (944271); durante le ore notturne ha eseguito lavori di bonifica da mine sulla strada da Ca. Marobetti a Ca. di Razzo.

- II^o plotone : ha riordinato automezzi e materiali.

- III^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (928283); ha continuato anche durante le ore notturne il lavoro per un osservatorio e un posto Comando.

= 3^a Compagnia Artieri :

- I^o plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo Valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (939277) con trasporto di 7 autocarri di pietrisco.

- II^o plotone : ha eseguito lavori preparatori per deviazione di Ca. di Marobetti.

- III^o plotone : ha provveduto al riordino dei mezzi e dei materiali.

Comandante
COMANDANTE DEL BATTAGLIONE a. f. s.
Maggiore Enzo Vescovali

Testament

CONTRATTA 8

Second Article

1° plotone : ha provveduto alla difesa della strada da (948283) a (944271), durante le ore notturne ha eseguito lavori di bonifica da mine sulla strada da Ca Marobetta a Ca di Razzo-
no.

1. Identification of the subject


- Ito plotone : ha ritornato autonomo alla strada
- IIIo plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada anche durante (923283) ha continuato anche durante (923286) a lavorare per un osservatorio le ore notturne il lavoro per un osservatorio e un posto Comando."

20. Counterclaim Article 1

1° Compagnia Artieri :
 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle attrezzature alla mar-
 ni di fienile Valle Idice; ha provveduto alla manutenzione delle strade da (926273) a (929277).
 manutenzione delle strade da (926273) a (929277).
 con trasporto di 7 autocarri di materiale.

con trasporto su
tre elicotte. Al seguito lavori preparatori per deviazione

Il piombo : al Ca al Marsheset.
Il piombo : ha provveduto al fiorino dei mesi e del materia
Il piombo : li.

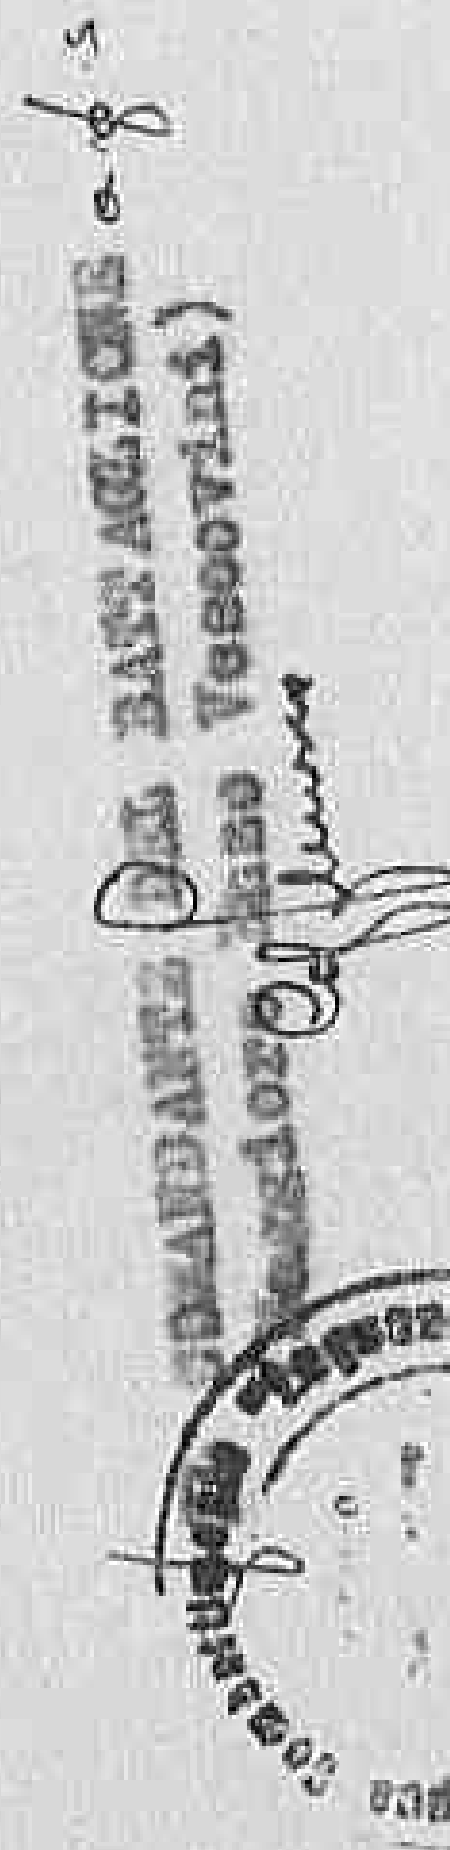

M/cu

LEGHANO COMBAT GROUP
HQ 51st Engineer Bn

No 23

PM 155 12 Apr 45

PERIOD 0800hrs 11 Apr 45 to 0800hrs 12 Apr 45.

To : CG II US Corps
Office of the Engineer.

(A) LOCATIONS : Second Pl 51st Id Coy changed location to 945290.
All other locations remain unchanged.

(B) EMPLOYMENT51st Id Coy

First Pl : maintenance and improvement of road from map ref
948283 to 944271.

Second Pl : moving to 945290.

Third Pl : maintenance and improvement of road from 933296 to
928283 using 13 truckloads of stones ; continued
construction of Command Post; 10 Shrapnel shells
landed in area HQ 51st Id Coy at 1730hrs.

3rd Id Coy

First Pl : maintenance of obstacles in bottom of IDICE Valley;
maintenance of road from 926273 to 929277 using 8
truck-loads of stone, revetted 15 m, of side drain
using logs and pickets.

Second Pl : maintenance of road from 929277 to 943243; During
hours of darkness, off loaded Bailey equipment and
laid Summerfeld track on diversion at CASA dei
MARCHETTI (933316)

Third Pl : maintenance of road from 934273 to 944271 ; contin-
ued construction of alternative rd at 944271.
During hours of darkness clearance of road from
923317 to 929326.

(C) CASUALTIES None.

(A) LOCATIONS : Second Pl 51st Fd Coy changed location to 945290.
All other locations remain unchanged.

(B) EMPLOYMENT

51st Fd Coy

First Pl : maintenance and improvement of road from map ref
948283 to 944271.

Second Pl : moving to 945290.

Third Pl : maintenance and improvement of road from 933296 to
928283 using 13 truckloads of stones ; continued
construction of Command Post; 10 Shrapnel shells
landed in area HQ 51st Fd Coy at 1730hrs.

3rd Fd Coy

First Pl : maintenance of obstacles in bottom of IDICE Valley;
maintenance of road from 926273 to 929277 using 8
truck-loads of stone, revetted 15 m. of side drain
using logs and pickets.

Second Pl : maintenance of road from 929277 to 943243; During
hours of darkness, off loaded Bailey equipment and
laid Summerfeld track on diversion at CASA dei
MARCHETTI (933316)

Third Pl : maintenance of road from 934273 to 944271 ; contin-
ued construction of alternative rd at 944271.
During hours of darkness clearance of road from
923317 to 929326.

(C) CASUALTIES None.

Comd 51 Engr Bn.
(signed) Major Enzo Vescovini.

6239

M/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNARO"
 = Comand. 51° Battaglione Genio =
 ~~~~~

n° 23

P.M. 155, il 12 aprile 1945

PERIODO delle ore 0800 dell' 11/4/45 alle ore 0800 del 12/4/45.-

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

~~~~~  
 a)- DISLOCAZIONE: Il II° plotone della 51° Compagnia Artieri si è spostato a (945290); per i rimanenti reparti invariata.-

b)- ATTIVITA' OPERATIVA:

= 51° Compagnia Artieri:

• I° plotone: ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (944271).-

• II° plotone: si è spostato a (945290).-

• III° plotone: ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (933296) a (928283) con trasporto di 13 autocarri di pietrisco; ha continuato anche durante le ore notturne il lavoro per un osservatorio e un posto comando.- Alle ore 19,30 n° 10 colpi a shrapnel sono arrivati sull'accampamento della 51° Compagnia Artieri.-

= 3° Compagnia Artieri:

• I° plotone: ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo Valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (928273) a (929277) con trasporto di 8 autocarri di pietrisco; ha rivestito con picchetti e tendoni n. 15 di cannetta.-

• II° plotone: ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943243); durante le ore notturne ha provveduto allo scarico del ponte Bayley Bridge e suo ~~temp~~ defilamento alla vista; sono state messe in opera sulle scarpate della diversione a reti antistruciolevoli.-

• III° plotone: ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (944271); ha continuato il lavoro

a)- DISTRIBUZIONE : Il II° plotone della 51ª Compagnia Artieri si è spostato a (945290); per i rimanenti reparti immutata.-

b)- ATTIVITA' OPERATIVA :

= 51ª Compagnia Artieri :

- I° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (944271).-
- II° plotone : si è spostato a (945290).-
- III° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (933296) a (928283) con trasporto di 13 autocarri di pietrisco; ha continuato anche durante le ore notturne il lavoro per un osservatorio e un posto comando.- Alle ore 19,30 n° 10 colpi a shrapnel sono arrivati sull'accampamento della 51ª Compagnia Artieri.-

= 3ª Compagnia Artieri :

- I° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle intersezioni di fondo Valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (928273) a (929277) con trasporto di 8 autocarri di pietrisco; ha rivestito con picchetti e tondoni n. 15 di canet-
ta.-

- II° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943243); durante le ore notturne ha provveduto allo scarico del ponte Bayley Bridge e suo ~~tras~~ defilamento alla vista; sono state messe in opera sulle scargate della diversione a reti antisidrauciolevoli.-

- III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (944271); ha continuato il lavoro della variante nei pressi di (944271); durante le ore notturne è stata bonificata la strada da (923317) a (929326).-

c)- PERDITE / : N. N. =



IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE o. f. s.
(Maggiore Enzo Vescovali)

El Junda

LECMANO DIF
HQ 51st Mixed Eng Bn

Ref No 22

11 Apr 45

Period: 100800 to 110800 hrs

HQ II Corps.
(Office of Engineer)

a) Location: Unchanged.

b) Operational Activity:
51 Sapper Coy.

1 Pl: Maintained and improved road tract: 948283 - 944271; constructed approx 40 metres of drainage trench (40 x 20 cm); during night completed construction of an OP; OC of Pl carried out during night a Recon patrol of road tract - C. Di MARONETTI - C. Di RAZZONE.

2 Pl: Maintained and improved tracks: 953288 - 957300; 957300 - 957306; 957300 - 954311; working partly during the night.

3 Pl: Maintained road tract - 932296 - 928283 using 15 truck loads of gravel; commenced works of one OP and OP.

3 Sapper Coy.

1 Pl: Maintained obstacles on bottom of IDICE valley; maintained road tract 928273 - 929277 using 7 truck loads of gravel; revetted 15 m of drainage trench with beams and pickets.

2 Pl: During night 9th/10th carried out preparatory works for diversion of obstacle C. di MARONETTI; a total of 80 A/T and 15 A/P mines were removed; where tracing of diversion is defiladed, the entire construction works were carried out.

3 Pl: Maintained road tract 934273 - 944271; continued construction of alternative in vic. 944271; during night road tract 934320 - 929326 was cleared.

22

a) Location: Unchanged.

b) Operational Activity:

51 Sapper Coy.

1 Pl: Maintained and improved road tract: 948283 - 944271; constructed approx 40 metres of drainage trench (40 x 20 cm); during night completed construction of an OP; OC of Pl carried out during night a Reconce patrol of road tract - C. Di LANCHETTI - C. Di RAZZONE.

2 Pl: Maintained and improved tracks: 953288 - 957300; 957300 - 957306; 957300 - 964311; working partly during the night.

3 Pl: Maintained road tract - 932296 - 928283 using 15 truck loads of gravel; commenced works of one OP and CP.

3 Sapper Coy.

1 Pl: Maintained obstacles on bottom of IDICE valley; maintained road tract 926273 - 929277 using 7 truck loads of gravel; revetted 15 m of drainage trench with beams and pickets.

2 Pl: During night 9th/10th carried out preparatory works for diversion of obstacle C. di MARCHETTI; a total of 80 A/T and 15 A/P mines were removed; where tracing of diversion is defiladed, the entire construction works were carried out.

3 Pl: Maintained road tract 934273 - 944271; continued construction of alternative in vic. 944271; during night road tract 934320 - 929326 was cleared.

Comd Engr Bn
Major ENZO Vescovini.

6237

M/cm.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNARO"
 = Comando 51° Battaglione Geni.

n° 22

P.M. 155, il 11 aprile 1945

PERIODO dalle ore 0800 del 10/4/45 alle ore 0800 dell' 11/4/45.-

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a)- DISLOCAZIONE : Inmutata.-b)- ATTIVITA' OPERATIVA :

= 51° Compagnia Artieri :

- . I plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (944271); ha costruito circa m. 30 di cunetta di sezione 30 x 20 cm.; durante le ore notturne ha ultimato la costruzione di un osservatorio; durante la notte il Comandante del plotone con una pattuglia ha eseguito una ricognizione nel tratto G.di Marchetti - G.di Regzone.-

- . II plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (957306), da (957300) a (964311), lavorando in parte durante la notte.-

- . III plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (928283) con trasporto di 15 autocarri di pietrisco; ha iniziato il lavoro per un osservatorio e un posto di comando.-

= 3° Compagnia Artieri :

- . I plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto di 7 autocarri di pietrisco; ha rivestito m. 15 di cunetta con tondoni e picchetti.-

- . II plotone : Durante le ore notturne del giorno 9 e 10 ha svolto lavoro preparatorio per la diversione sull'interruzione di G.di Marchetti; complessivamente sono state rimosse n° 80 mine A/T e 15 mine A/P; dove il tracciato della diversione è defilato alla vista è stata compiuta il lavoro definitivo.-


b)- ATTIVITA' OPERATIVA:= 51^a Compagnia Artieri:

- I plotone: ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (944271); ha costruito circa m. 30 di cunetta di sezione 80 x 20 cm.; durante le ore notturne ha ultimato la costruzione di un osservatorio; durante la notte il Comandante del plotone con una pattuglia ha eseguito una ricognizione nel tratto G. di Marchetti - G. di Razzo.
- II plotone: ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (957306), da (957300) a (964311), lavorando in parte durante la notte.
- III plotone: ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (928283) con trasporto di 15 autocarri di pietrisco; ha iniziato il lavoro per un osservatorio e un posto di comando.

= 3^a Compagnia Artieri:

- I plotone: ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto di 7 autocarri di pietrisco; ha rivestito m. 15 di cunetta con tendoni e picchetti.
- II plotone: Durante le ore notturne del giorno 9 e 10 ha svolto lavoro preparatorio per la diversione sull'interruzione di G. di Marchetti; complessivamente sono state rimosse n° 80 mine A/T e 15 mine A/P; dove il tracciato della diversione è defilato alla vista è stata compiuta il lavoro definitivo.
- III plotone: ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (944271); ha continuato il lavoro della variante nei pressi di (944271); durante le ore notturne è stata bonificata la strada da (934320) a (929326).

6236
 COMANDANTE DEL BATTAGLIONE
 (Maggiore Rinaldo Vescovini)

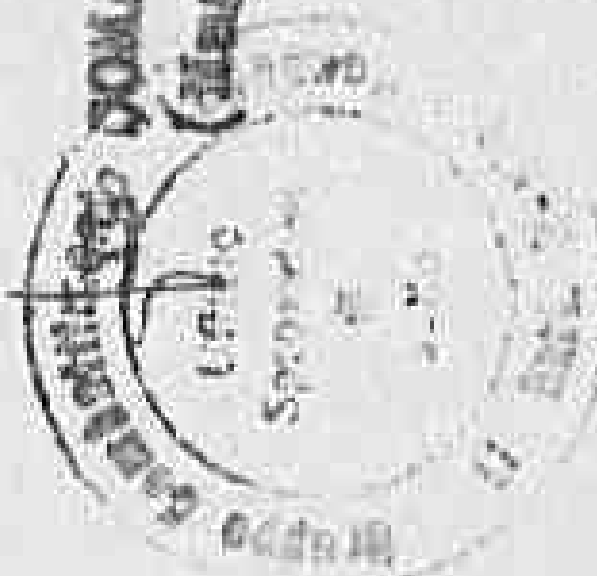

E/cu

TRANSLATION

LOGANHO COMBAT GROUP

HQ 51st Engineer Bn.

No 21

PM 155 10 Apr 45

PERIOD 0800hrs 9 Apr 45 to 0800hrs 10 Apr 45

To : CG II US Corps
Office of the Engineer.

A. LOCATIONS No change

B. EMPLOYMENT

51st Fd Coy

First Pl : maintenance and improvement of road from map ref 948283 to 944271 ; 50 m of side drain 40 cm x 20 cm constructed; began construction of O.P.

Second Pl : maintenance and improvement of tracks from 953288 to 957300; 957300 to 957306, 957300 to 964311 working partly during darkness.

Third Pl : maintenance of road from 932296 to 928283 using 9 truckloads of stone; continued to road at 949285 Many artillery shells in vicinity of HQ Coy during the night.

3rd Fd Coy

First Pl : continued maintenance of obstacles in bottom of IDICA valley; maintenance of road from 926273 to 929277 using 9 truckloads of stone, 20 metres of side drain revetted with logs and pickets.

Second Pl : maintenance of road from 929277 to 943243; 50 m of side drain revetted with logs.
80 m of barbed wire fence constructed for P.O.W. reception camp; preparatory works carried out for diversion at C. dei Marchetti (933317)

Third Pl : maintenance of road from 934273 to 944271; continued construction of alternative road at 944271.
Mortar bombs fell at 931275 at 0130hrs.

21

A. LOCATIONS No change

B. EMPLOYMENT

51st Fd Coy

First Pl : maintenance and improvement of road from map ref 948283 to 944271 ; 50 m of side drain 40 cm x 20 cm constructed; began construction of O.P.

Second Pl : maintenance and improvement of tracks from 953288 to 957300; 957300 to 957306, 957300 to 964311 working partly during darkness.

Third Pl : maintenance of road from 932296 to 928283 using 9 truckloads of stone; continued to road at 949285 Many artillery shells in vicinity of HQ Coy during the night.

3rd Fd Coy

First Pl : continued maintenance of obstacles in bottom of IDICE valley; maintenance of road from 926273 to 929277 using 9 truckloads of stone, 20 metres of side drain revetted with logs and pickets.

Second Pl : Maintenance of road from 929277 to 943243; 50 m of side drain revetted with logs.
80 m of barbed wire fence constructed for P.O.W. reception camp; preparatory works carried out for diversion at C. dei Marchetti (933317)

Third Pl : maintenance of road from 934273 to 944271; continued construction of alternative road at 944271. Mortar bombs fell at 931275 at 0130hrs.

C. CASUALTIES : One man wounded.

Comd Engr Bn.

6238

(signed) Major Enzo Vescovini

● 買/買

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Comando 51° Battaglione Genio =

= Comando 51º Battaglione Genio =

०५

P.M. 155,11 10 aprile 1945

P E N I O D O / dalle ore 0300 del 2/4/45 alle ore 0800 del 19/4/1945. =

AT 520 BRITISH LIAISON UNIT

A

e)- DISLOCATION : Immutata -

6)- ATTIVITA' OPERATIVA :

- 51^o Compagnia Artieri ;

1° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (944271); ha costruito circa m. 50 di cunetta di sezione 40 x 20 cm.; durante le ore notturne ha iniziato la costruzione di un osservatorio.-

• 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (957306), da (957300) a (954311), lavorando in parte durante la notte.--

• III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (928283) con trasporto di 9 autocarri di pietrisco; ha continuato il lavoro di rettificazione della strada nei pressi di (949285). -- Molti colpi d'artiglieria caduti durante la notte nei pressi dell'accompanamento della 51ª Comp. Artieri. =

- 3^a Compagnia Artieri :

1. 1.° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo Valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto di 5 autocarri di pietrisco; ha rivestito con tondoni e picchetti n. 20 di cunetta. -

• 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943243); ha rivestito m. 50 di cunetta con tondoni; una squadra ha costruito m. 80 di ~~mur~~ per recinzione campo prigionieri di guerra; una squadra durante le ore notturne ha eseguito lavori preparatori per deviazione di Ca dei Marchetti.-

III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da

- 51^a Compagnia Artieri :

- 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (944271); ha costruito circa m. 50 di cunetta di sezione 40 x 20 cm.; durante le ore notturne ha iniziato la costruzione di un osservatorio.-
- II° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (957306), da (957300) a (954311), lavorando in parte durante la notte.-
- III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (928283) con trasporto di 9 autocarri di pietrisco; ha continuato il lavoro di rettificazione della strada nei pressi di (949285).- Molti colpi d'artiglieria caduti durante la notte nei pressi dell'accampamento della 51^a Comp. Artieri.-

- 3^a Compagnia Artieri :

- 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto di 9 autocarri di pietrisco; ha rivestito con tondoni e picchetti m. 20 di cunetta.-
- II° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943243); ha rivestito m. 50 di cunetta con tondoni; una squadra ha costruito m. 80 di ~~maia~~ ~~maia~~ ~~maia~~ reticolato a siepe triangolare per recinzione campo prigionieri di guerra; una squadra durante le ore notturne ha eseguito lavori preparatori per deviazione di Ca dei Marchetti.-
- III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (944271); ha continuato il lavoro della variante nei pressi di (944271).- Colpi di mortaio caduti su 931275 alle ore 01,30.-

c)- PERDITE : n° 1 ferito.-

COMANDANTE DEL BATTAGLIONE a. f. s.
(Maggiore Enzo Vescovin)

673/

REGTANO COMBAT GROUPEa 51st Engineer Bn.No 20PM 155 9th Apr 45PERIOD From 0800hrs 8 Apr 45 to 0800hrs 9 Apr 45.CG II US Corps
(Office of the Engineer)(a) Locations Unchanged(b) Operational Activities51st Rd Coy1st Pl. Maint and improvement of road from 948283 to 953271 construction of 70 m of side-drain 40 x 20 cm, reducing of gradient in the vicinity of 948282, have transported and scattered 9 truck loads of stone, have constructed a timber box-culvert 40 x 20 cm x 4 m at 948282.2nd Pl : Maint and improvement of track from 953258 to 957300 from 957300 to 957306 from 957300 to 954311 working during the night.3rd Pl : Maint of road from 932296 to 929283 using 8 truck loads of stone, rectification of road in the vicinity of 949285 Finished O.P. during the night.3rd Rd Coy1st Pl : Maint of obstacles at the bottom of IDICE valley. Maint of road from 926273 to 929277 using 11 truck loads of stone. Have revetted with timber 20 m of side-drain, have improved edge of road using 50 sandbags.2nd Pl : Maint of road from 929277 to 943273 have revetted 70 m of side-drain with timber, have improved edge of road using 200 salvaged sandbags, construction of a passing point at 931275.3rd Pl : Maint of road from 934273 to 943271. Reducing gradients in the vicinity of 944271.

(b) Operational Activities

51st Rd Coy

1st Pl. Maint and improvement of road from 948283 to 953271 construction of 70 m of side-drain 40 x 20 cm, reducing of gradient in the vicinity of 948282, have transported and scattered 9 truck loads of stone, have constructed a timber box-culvert 40 x 20 cm x 4 m at 948282.

2nd Pl : Maint and improvement of track from 953288 to 957300 from 957300 to 957306 from 957300 to 954311 working during the night.

3rd Pl : Maint of road from 932296 to 929283 using 8 truck loads of stone, rectification of road in the vicinity of 949285 Finished O.F. during the night.

3rd Rd Coy

1st Pl : Maint of obstacles at the bottom of IDICE valley. Maint of road from 926273 to 929277 using 11 truck loads of stone. Have revetted with timber 20 m of side-drain, have improved edge of road using 50 sandbags.

2nd Pl : Maint of road from 929277 to 943273 have revetted 70 m of side-drain with timber, have improved edge of road using 200 salvaged sandbags, construction of a passing point at 931276.

3rd Pl : Maint of road from 934273 to 943271. Reducing gradients in the vicinity of 944271.

Comd Engr Bn.

(signed) Major Enso Vescovini

6238

EE/OU:

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Tomando 51° Battaglione Genio =

no 29

P. M. 155, 11 9 april 1945

PERIODO dalle ore 0800 dell'8/4/45 alle ore 0800 del 9/4/1945.--

AL 520 BRITISH LIAISON UNIT

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

a)- DISLOCAZIONE : Immutata.

VALUED VITALITY - (q)

= 51.ª Compagnia Artieri :

1° protone: ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (963271); costruzione di m. 70 circa di cunetta di sezione 40x20 cm.; ha continuato il lavoro di sterro per diminuzione delle pendenze nei pressi di (948282); ha portato e sperso 9 autocarri di pietrisco; ha costruito con tavoloni un tombino 40x20 cm. x 4 metri a (948282).-

Il° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (957306), da (957300) a (956431), lavorando in parte durante la notte.-

... 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (929283) con trasporto di 8 autocarri di pietrisco; ha continuato il lavoro di rettificazione della strada nei pressi di (949285); durante le ore notturne ha ultimato un osservatorio. =

III 3^a Compagnia Artieri :

1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle del Fiume Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (928273) a (929277) con trasporto di 11 autocarri di pietri scos; ha rivestito con tonioni n.20 di cunetta; ha migliorato il bordo a valle della strada con lo impiego di 50 sacchetti a terra.-

il° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943273); ha rivestito m. 70 di cunetta con tondoni; ha migliorato il bordo a valle della strada con l'impiego di circa 200 sacchetti a terra ricuperati; ha iniziato la costruzione di una piazzola di ricambio a (931276).--

... 211° Motone : ha provveduto alla manutenzione della strada da

b)- ATTIVITA' OPERATIVA := 51^a Compagnia Artieri :

- 1^o plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (963271); costruzione di m. 70 circa di cunetta di sezione 40x20 cm.; ha continuato il lavoro di sterro per diminuzione delle pendenze nei pressi di (948282); ha portato e sparso 9 autocarri di pietrisco; ha costruito con tavoloni un tombino 40x20 cm. x 4 metri a (948282).-
- 11^o plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (957305), da (957300) a (964311), lavorando in parte durante la notte.-
- 111^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (929283) con trasporto di 8 autocarri di pietrisco; ha continuato il lavoro di rettificazione della strada nei pressi di (949285); durante le ore notturne ha ultimato un osservatorio.-

M 3^a Compagnia Artieri :

- 1^o plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle del Fiume Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto di 11 autocarri di pietrisco; ha rivestito con tondoni m.20 di cunetta; ha migliorato il bordo a valle della strada con lo impiego di 50 sacchetti a terra.-
- 11^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943273); ha rivestito m. 70 di cunetta con tondoni; ha migliorato il bordo a valle della strada con l'impiego di circa 200 sacchetti a terra recuperati; ha iniziato la costruzione di una piazzola di ricambio a (933276).-
- 111^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (943271); ha continuato il lavoro della variante nei pressi di (944271).-



IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE e. p. i
Maggiore Enzo Vescovini

6237

LEGNANO COMBAT GROUPHQ 51st Engineer BnNo 13.PM 8th Apr 45PERIOD From 0800hrs 7 Apr 45 to 0800hrs 8 Apr 45CG II US Corps
(Office of the Engineer)

- (a) Locations unchanged
- (b) Operational Activities

51st Fd Coy

1st Pl : Maint and improvement of road from 948283 to 963271
Construction of 30 m of side-drain 40 X 20 cm ;
Reducing gradients, broadening road and improving
slope at 948282.

2nd Pl : Maint and improvement of track from 953288 to 957300
from 957300 to 967206 from 957300 to 964311, work is
being carried out at night.

3rd Pl : Maint of road from 932296 to 928283 using 14 truck
loads of stone; rectification of road in the vicinity
of 949205 is being continued. Have worked in the
construction of an observatory - during the hours of
dusk.

3rd Fd Coy

1st Pl : Maint of obstacles at the bottom of IDICE valley.
Maint of road from 926273 to 929277 using 12 truck
loads of stone. Have revetted with timber and pickets
25 m of side-drain.

2nd Pl : Maint of road from 929277 to 943273. Have revetted
with timber and pickets 60 m of side-drain, have
improved edge of road using about 300 salvaged sandbags

3rd Pl : Maint of road from 934273 to 943271, and have continued
work on road in the vicinity of 944271.

(19)

(a) Locations unchanged(b) Operational Activities51st Rd Coy

1st Pl : Maint and improvement of road from 948283 to 963271
Construction of 30 m of side-drain 40 X 20 cm :
Reducing gradients, broadening road and improving
slope at 948282.

2nd Pl : Maint and improvement of track from 953286 to 957300
from 957300 to 967206 from 957300 to 964311, work is
being carried out at night.

3rd Pl : Maint of road from 932296 to 928283 using 14 truck
loads of stone; rectification of road in the vicinity
of 949205 is being continued. Have worked in the
construction of an observatory - during the hours of
dusk.

3rd Rd Coy

1st Pl : Maint of obstacles at the bottom of LDICE valley.
Maint of road from 926273 to 929277 using 12 truck
loads of stone.. Have revetted with timber and pickets
25 m of side-drain.

2nd Pl : Maint of road from 929277 to 943273. Have revetted
with timber and pickets 60 m of side-drain, have
improved edge of road using about 300 salvaged sandbags

3rd Pl : Maint of road from 934273 to 943271, and have continued
work on road in the vicinity of 944271.

Comd Engr Br.

0231

(signed) Major Enzo Vescovini

B/cv.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
 = Comando 51° Battaglione Genio =

n° 19

P.m. 155, 11 8 aprile 1945

PERIODO / dalle ore 0800 del 7/4/45 alle ore 0800 dell'8/4/1945.-

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a) - DISLOCAZIONE / Immutata.-

b) - ATTIVITA' OPERATIVA /

= 51° Compagnia Artieri :

- 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (953271); costruzione di m. 30 di cunetta di sezione 40 x 20 cm.; ha continuato il lavoro di sterro per allargamento della strada e miglioramento delle pendenze a (948282).-

- 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (967306) e da (957300) a (964311), lavorando in parte nelle ore notturne.-

- 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (928283) con trasporto di 14 autocarri di pietrisco; ha continuato il lavoro di rettificazione della strada nei pressi di (949285); durante le ore notturne ha lavorato per la costruzione di un osservatorio.-

= 3° Compagnia Artieri :

- 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo Valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto di 12 autocarri di pietrisco; ha rivestito con tondoni e picchetti m. 25 di cunetta.-

- 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943273); ha rivestito con tondoni e picchetti di m. 60 di cunetta; ha migliorato il bordo e valle della strada con impiego di circa 300 sacchetti a terra recuperati.-

a) - DISLOCAZIONE / Immutata.b) - ATTIVITA' OPERATIVA /= 51^a Compagnia Artieri :

- . 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (963271); costruzione di m. 30 di cunetta di sezione 40 x 20 cm.; ha continuato il lavoro di sterro per allargamento della strada e miglioramento delle pendenze a (948282).--
- . 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (967306), da (957300) a (964311), lavorando in parte nelle ore notturne.--
- . 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (952296) a (928283) con trasporto di 14 autocarri di pietrisco; ha continuato il lavoro di rettificazione della strada nei pressi di (949285); durante le ore notturne ha lavorato per la costruzione di un osservatorio.--

= 3^a Compagnia Artieri :

- . 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo Valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto di 12 autocarri di pietrisco; ha rivestito con tendoni e picchetti m. 25 di cunetta.--
- . 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943273); ha rivestito con tendoni e picchetti m. 60 di cunetta; ha migliorato il bordo a valle della strada con impiego di circa 300 sacchetti a terra recuperati.--
- . 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (943271); ha continuato il lavoro allavariante nei pressi di (944271).--

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE
(Maggiore Enzo Vescovini)



833

LEGNAME COMBAT GROUPHQ 51st Engineer BnNo 18PM 155 7th April 45PERIOD From 0800hrs 6 Apr 45 to 0800hrs 7 Apr 45.CG II US Corps
(Office of the Engineer)(a) Locations Unchanged.(b) Operational Activities51st Fa Coy1st Pl. Maintenance and improvement of road from 948283 to 953271 : Construction of 25 m side-drain 40 x 20 : Reducing gradients at 948282.2nd Pl : Maintenance and improvement of track from 953288 to 957300, from 957300 to 957306 from 957300 to 964311.3rd Pl : Maintenance of road from 932296 to 928283 using 17 truck loads of stone. Rectification of road in the vicinity of 949285. Artillery shells landed at 947293.3rd Md Coy1st Pl : Maintenance of obstacles at the bottom of IDICE valley. Maintenance of road from 928273 to 929277 using 11 truck loads of stone. Have revetted with timber and pickets 30 m of side-drain. Reinforced edges of road using 200 m sandbags, salvaged from old defence posn.2nd Pl : Maintenance of road from 929277 to 943273. Have revetted with timber and pickets 60 m of side-drain. Improved edge of road, using 300 salvaged sandbags.3rd Pl : Maintenance of road from 934273 to 943271. Gradients being reduced at 942272.

(Office of the Engineer)

- (a) Locations Unchanged.
- (b) Operational Activities

51st Fu Coy.

1st Pln. Maintenance and improvement of road from 948283 to 963271 : Construction of 25 m side-drain 40 x 20 : Reducing gradients at 948282.

2nd Pl : Maintenance and improvement of track from 953288 to 957300, from 957300 to 957306 from 957300 to 964311.

3rd Pl : Maintenance of road from 932296 to 928283 using 17 truck loads of stone. Rectification of road in the vicinity of 949285. Artillery shells landed at 947293.

3rd Rd Coy

1st Pl : Maintenance of obstacles at the bottom of IDICE valley. Maintenance of road from 929273 to 929277 using 11 truck loads of stone. Have revetted with timber and pickets 30 m of side-drain. Reinforced edges of road using 200 m sandbags, salvaged from old defence posn.

2nd Pl : Maintenance of road from 929277 to 943273. Have revetted with timber and pickets 60 m of side-drain. Improved edge of road, using 300 salvaged sandbags.

3rd Pl : Maintenance of road from 924273 to 943271. Gradients being reduced at 942272.

Comd Engr Bn.

(signed) Major Enzo Vescevoli

6229

II/civ.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Comando 51^o Battaglione Genio =

810

P. M. 155, 11 7 April 1945

On

PERIOD O / 0800 del 6/4/45- ore 0300 del 7/4/1945. =

At 526 BRITISH LIAISON UNIT

AAAAAAAAAAAA

a)- DISLOCAZIONE / Immagine -

b)- ATTIVITA' OPERATIVA /

51^a Compagnia Artieri :

1° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada (948283) a (963271); costruzione di m. 25 di cunetta di sezione 40 x 20; ha continuato lavoro di sterro per miglioramento delle pendenze a (948282).--

il 1° plotone è ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) e (957300), da (957300) e (957306), da (957300) e (964311).--

- III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (928283) con trasporto di 17 autocarri di pietrisco; ha continuato il lavoro di rettificazione della strada nei pressi di (949285).
Un colpo di artiglieria caduto su (947293).-

= 3^o Compagnia Artieri :

1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto di 11 autocarri di pietrisco; ha rivestito con tendoni e picchetti M. 30 di onnetta; ha rinforzato il margine a valle della strada con l'impiego di 200 sacchetti a terra recuperati.

11° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943283); ha rivestito con tonioni e picchetti ml. 60 di cunetta; ha migliorato il bordo a valle della strada con impiego di 300 sacchetti a terra recuperati.-

a)- DISLOCAZIONE / Immutata.b)- ATTIVITA' OPERATIVA= 51^a Compagnia Artieri:

- 1^o plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada (948283) a (963271); costruzione di m. 25 di cunetta di sezione 40 x 20; ha continuato lavoro di sterro per miglioramento delle pendenze a (948282).-

- 11^o plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (957306), da (957300) a (964311).-

- 111^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (928283) con trasporto di 17 autocarri di pietrisco; ha continuato il lavoro di rettificazione della strada nei pressi di (949285).-

Un colpo di artiglieria caduto su (947293).-

= 3^a Compagnia Artieri:

- 1^o plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto di 11 autocarri di pietrisco; ha rivestito con tendoni e picchetti m. 30 di cunetta; ha rinforzato il margine a valle della strada con l'impiego di 200 sacchetti a terra recuperati. -

- 11^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943273); ha rivestito con tendoni e picchetti m. 60 di cunetta; ha migliorato il bordo a valle della strada con impiego di 300 sacchetti a terra recuperati. -

- 111^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (943271); ha eseguito lavori di sterro per miglioramento delle pendenze a (942272).-

c)- PERDITE : N. N.

6228
COMANDANTE DEL BATTAGLIONE
(Maggiore Enzo Vescovini)



LEGnano COMBAT GROUPHQ 51st Engineer Bn.No 17PM 155 6 Apr 45Period :- From 0800 hrs 5 Apr 45 to 0800 hrs 6 Apr 45.CG II US Corps(Office of the Engineer).

(a)

Locations

Unchanged

(b)

Operational activities51st Field Company

I Pln Maintenance and improvements of road from 948283 to 943271; construction of 20 m side-drain, 40 x 20 cm; have constructed timber box-culvert 40 x 20 x 400 at 949281. Road at 949282 still being improved.

II Pln Maintenance of seed track from 953288 to 957300; from 957300 to 957306, from 957300 to 964311.

III Pln Maintenance of road from 932296 to 948283, using 12 truck-loads of stone; road being rectified at 949285. Five small artillery shells were dropped at 0810 hrs in the vicinity of Company HQ (MR 946293) and between 2000 and 0500 hrs of the 5th/6th Apr 45, 20 shrapnel shells and 60 mortar bombs were dropped in the vicinity of 945292. Casualties NIL.

I Pln

3 Field Company Maintenance of obstacles in the bottom of IDIC valley. Maintenance of road from 926273 to 929277 using 12 truck-loads of gravel. Retaining wall at 926273. Have revetted with timber 20 m of side-drain; constructed passing point at 926274 using 150 sandbags.

II Pln Maintenance of road from 929277 to 943273; built retaining wall at 930276 and have revetted with timber 60 m of side-drains; improvements to road at 929276 using 300 sandbags salvaged from old defence positions.

III Pln Maintenance of road from 934273 to 943271; alternative line of road being altered.

CG II US Corps
(Office of the Engineer).

Unchanged

Locations

(a)

Operational activities

(b)

31st Field Company

I Pln Maintenance and improvement of road from 948283 to 943271; construction of 20 m side-drain, 40 x 20 cm; have constructed timber box-culvert 40 x 20 x 400 at 949281. Road at 949282 still being improved.

II Pln Maintenance of road track from 953288 to 957300; from 957300 to 957306, from 957300 to 964311.

III Pln Maintenance of road from 932296 to 948283, using 12 truck-loads of stone; road being rectified at 949285. Five small artillery shells were dropped at 0810 hrs in the vicinity of Company HQ (MH 946293) and between 2000 and 0500 hrs of the 5th/6th Apr 45, 20 shrapnel shells and 60 mortar bombs were dropped in the vicinity of 945292. Casualties NIL.

3 Field Company Maintenance of obstacles in the bottom of IDIGE valley. Maintenance of road from 926273 to 929277 using 12 truck-loads of gravel. Retaining wall at 926273. Have revetted with timber 20 m of side-drain; constructed passing point at 926274 using 150 sandbags.

II Pln Maintenance of road from 929277 to 943273; built retaining wall at 930276 and have revetted with timber 60 m of side-drains; improvements to road at 929276 using 300 sandbags salvaged from old defence positions.

III Pln Maintenance of road from 934273 to 943271; ~~alternative~~ line of road being altered at 944271 using Bulldozer; gradients being reduced at 942272 and at 934273.

6227

Comd, Engr Bn
(signed) Major Enzo Vescovini

M/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNAM"
 = Comando 51° Battaglione Genio =

n° 17

P.M. 155, li 6 Aprile 1945

PERIODO dalle ore 0800 del 5/4/45 alle ore 0800 del 6/4/1945. =

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a) - DISLOCAZIONE / Immutata. =

b) - ATTIVITA' OPERATIVA /

= 51° Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (943271) e costruzione di 20 m. di cunetta - sezione 40x20; ha costruito un tombino in tavoloni della sezione di 40x20x400 a (949281); ha continuato lavori di sterro per miglioramento delle pendenze a (949282)

= 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle piste : da (953288) a (957300), da (957300) a (957306) da (957300) a (964311). =

= 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948283), trasporto di 12 autocarri di pietrisco; ha continuato lavori di rettifica della strada nei pressi di (949285). - Alle ore 0810 sono caduti nei pressi del Comando della Compagnia (946293) n° 5 colpi artiglieria di piccolo calibro. =

= 3° Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo valle Idice, ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto 18 autocarri ghiaia; ha messo in opera una rete antisdrucchiolo a (926273); ha rivestito con tondoni m. 20 di cunetta; ha costruito una piazzola di scambio a (926274) con impiego di 150 sacchi a terra recuperati. =

= 11° plotone : manutenzione della strada da (929277) a (943273)

c)- DISLOCAZIONE / Immutata.b)- ATTIVITA' OPERATIVA /= 51^a Compagnia Artieri:

= 1^o plotone: ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (943271) e costruzione di 20 m. di cunetta - sezione 40x20; ha costruito un tombino in tavoloni della sezione di 40x20x400 a (949281); ha continuato lavori di sterro per miglioramento delle pendenze a (949282)

= 21^o plotone: ha provveduto alla manutenzione delle piste: da (953288) a (957300), da (957300) a (957306) da (957300) a (964311).-

= 111^o plotone: ha provveduto alla manutenzione della strada da (952296) a (948283), trasporto di 12 autocarri di pietrisco; ha continuato lavori di rettificazione della strada nei pressi di (949285).- Alle ore 0810 sono caduti nei pressi del Comando della Compagnia (946293) n. 5 colpi artiglieria di piccolo calibro.-

= 3^a Compagnia Artieri:

= 2^o plotone: ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo valle Idice, ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) con trasporto 12 autocarri ghiaia; ha messo in opera una rete antidruciocivile a (926273); ha rivestito con tendoni n. 20 di cunetta; ha costruito una piazzola di scambio a (926274) con impiego di 150 sacchi a terra recuperati.-

= 11^o plotone: manutenzione della strada da (929277) a (943273); ha messo in opera una rete antidruciocivile a (930276); ha rivestito con tendoni n. 60 di cunetta; ha migliorato il bordo a valle nella strada a (929276) con impiego di 300 sacchi a terra recuperati.-

= 111^o plotone: ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (943271); ha continuato i lavori per la variante a (944271) con impiego del bulldozer ha eseguito lavori di sterro per miglioramento delle pendenze a (942272) ed a (934273).-

c)- PERDITE / N. N. =

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE
(maggior *[firma]* Enzo Vescovalini)

LEGNAO COMBAT GROUPHCQ.51st Engineer BnNo 16PM 155 5 Apr 45PERIOD From 0800hrs 4 Apr 45 to 0800hrs 5 Apr 45.

CG II US Corps

(Office of the Engineer)(a) Locations Unchanged(b) Operational Activities51st Fd CoyI Pln.

Maintenance and improvements of road from 940263 to 943271
Constructed 50 m of side-drains 40 x 20 cm at approx 948283.
Have improved road, using about 800 sandbags salvaged from
old defence posns.

II Pln.

Maintenance and improvement ~~and~~ of track from 953288 to
957300 from 951300 to 956302 from 957300 to 959304, work
is being carried out during the night.

III Pln.

Maintenance of road from 932296 to 948283 using 24 truck
loads ~~add~~ of stone, rectification of road approx at LR
949285. Have constructed a pipe culvert of 15 cm in diameter
to drain water from a spring, which was found in the middle
of the road at 933293. One squad on water point duties.
At 1230hrs four small bombs were dropped in the vicinity of
51st Fd Coy, at 1330hrs another 3 bombs were dropped.
Casualties NIL.

3rd Fd CoyI Pln.

Maintenance of obstacles in the bottom of ~~LDICE~~ valley.
Maintenance of road from 926273 to 929277; ~~these~~ ^{these} reverted
with timber a 20 m side-drain. Constructed timber box-
culvert, dimensions 40 x 20 x 4 meters at 928275.

II Pln.

Maintenance of road from 929277 to 943273 have reverted about
70 m of side-drains with timber, constructed a timber box-
culvert, dimensions 30 x 20 mm x meters at 930275.
Improvements of road at 939276 using about 400 sandbags.

III Pln.

Maintenance of road from 934273 to 943271 work is being ~~carried~~
carried out in reducing gradients on road 934273.

(a) Locations Unchanged
(b) Operational Activities

51st Fd Coy

I Pln. Maintenance and improvements of road from 940283 to 943271. Constructed 50 m of side-drains 40 x 20 cm at approx 948283. Have improved road, using about 800 sandbags salvaged from old defence posns.

II Pln. Maintenance and improvement ~~work~~ of track from 953288 to 957300 from 951300 to 956302 from 957300 to 959304, work is being carried out during the night.

III Pln. Maintenance of road from 932296 to 948283 using 24 truck loads ~~and~~ of stone, rectification of road approx at MR 949285, Have constructed a pipe culvert of 15 cm in diameter to drain water from a spring, which was found in the middle of the road at 933295. One squad on water point duties. At 1230hrs four small bombs were dropped in the vicinity of 51st Fd Coy, at 1330hrs another 3 bombs were dropped. Casualties NIL.

3rd Fd Coy

I Pln. Maintenance of obstacles in the bottom of LDICE valley. Maintenance of road from 926273 to 929277; ~~these~~ ^{these} reverted with timber a 20 m side-drain. Constructed timber box-culvert, dimensions 40 x 20 x 4 meters at 926275.

II Pln. Maintenance of road from 929277 to 943273 have reverted about 70 m of side-drains with timber, constructed a timber box-culvert, dimensions 30 x 20 ~~mm~~ x meters at 930276. Improvements of road at 939276 using about 400 sandbags.

III Pln. Maintenance of road from 934273 to 943271 work is being ~~carried~~ carried out in reducing gradients on road 934273.

6225

Comd Engr Bn;

(sgd) Major Euseo Vescovini.

m/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGHANI"
= Comando 51° Battaglione Genio =

n° 16

P.M. 155, 11 5 Aprile 1945
PERIODO / dalle ore 0800 del 4/4/45 alle ore 0800 del 5/4/45. =

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a) - DISLOCAZIONE / Inmutata. =b) - ATTIVITA' OPERATIVA /

= 51° Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (943271); costruzione di m. 50 di cunetta della sezione di cm. 40x20 nei pressi di (948283) è stata migliorata la strada con l'impiego di circa 800 sacchetti e terra recuperati da postazioni alleate abbandonate. =

= 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (956302), da (957300) a (959304); il lavoro viene eseguito in parte di notte. =

= 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948283), portando 24 autocarri di pietrisco; ha continuato i lavori di rettifica della strada nei pressi di (949285); ha costruito un tombino, con tubi di eternit del diametro di cm. 15 per incanalare l'acqua di una sorgente trovata in mezzo alla strada a (933293). = Una squadra ha fatto servizio al Water Point. = Alle ore 12,30 4 bombe di piccolo calibro sono arrivate presso l'accampamento della 51° Compagnia Artieri; alle ore 13,30 ne sono arrivate 3. = *Redd. N.N.*

- 3° Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle fiume Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277); ha rivestito con tendoni circa m. 20 di cunetta; ha costruito un tombino con tavoloni della dimensione 40x20 x 4metri a (928276). =

= 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943273); ha rivestito con tendoni

a)- DISLOCAZIONI / Insultate.b)- ATTIVITA' OPERATIVA= 51' Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (943271); costruzione di m.50 di cunetta della sezione di cm.40x20 nei pressi di (948283) è stata migliorata la strada con l'impiego di circa 800 sacchetti e terra recuperati da postazioni alleate abbandonate.

= 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento delle piste da (953288) a (957300), da (957300) a (956302), da (957300) a (959304); il lavoro viene eseguito in parte di notte.

= 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948283), portando 24 autocarri di pietrisco; ha continuato i lavori di rettifica della strada nei pressi di (949285); ha costruito un tombino con tubi di eternit del diametro di cm.15 per incanalare l'acqua di una sorgente trovata in mezzo alla strada a (933293). Una squadra ha fatto servizio al Water Point. Alle ore 12,30 4 bombe di piccolo calibro sono arrivate presso l'accampamento della 51' Compagnia Artieri; alle ore 13,30 ne sono arrivate 3. = *Perdite: N.N.*

- 3' Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle fiume Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277); ha rivestito con tondoni circa m. 20 di cunetta; ha costruito un tombino con tavoloni della dimensione 40x20 x 4 metri a (928276).

= 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (943273); ha rivestito con tondoni circa m.70 di cunetta; ha costruito un tombino con tavoloni di dimensioni 30x20 cm.x4 metri a (930276); ha migliorato il bordo a valle della strada a (929276) con impiego di circa 400 sacchetti e terra recuperati.

= 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (943271); ha continuato il lavoro per diminuire la pendenza della strada a (934273).



COMANDANTE DEL BATTAGLIONE

(Maggiore Enzo Vascovini)

6022

MECHANICAL COMBAT GROUPHQ 51st Engineer Bn.No 15.PERIOD From 0800hrs 3 Apr 45 to 0800hrs 4 Apr 45.CG II US Corps
(Office of the Engineer).(a) Locations Unchanged(b) Operational Activities51st Pz CoyI Pln.

Maintenance and improvements of road from 948283 to 943271, 20 m side-drains 40 x 20 cm constructed.

II Pln.

Maintenance and improvements of track from 951288 to 957300 from 957300 to 956302 and of track from 957300 to 956304. (Part of the) work is being carried out at night.

III Pln.

Maintenance of road from 931296 to 948283 using 23 truck loads of stone; rectification of road in the vicinity of 949285. One squad on water point duties.

3rd Pz CoyI Pln.

Maintenance of obstacles at the bottom of IDICE valley. Maintenance of road ^{from} 926273 to 929277. Have revetted with timber a side-drain of approx 20 m. Retaining wall at built at 926274.

II Pln.

Maintenance of road from 929277 to 934273; have revetted with timber a 50 m side-drain, have improved the slope on curve at MR 930276. Improvements of road at 920276. Using about 400 sandbags salvaged from old defence posts.

III Pln.

Maintenance of road from 934273 to 943271; work is being continued in reducing gradients on road at 934273.

(a) Locations Unchanged
(b) Operational Activities

51st Rd Coy.

I Pln. Maintenance and improvements of road from 948283 to 943271, 20 m side-drains 40 x 20 cm constructed.

II Pln. Maintenance and improvements of track from 953288 to 957300 from 957300 to 956302 and of track from 957300 to 955304. (Part of the) work is being carried out at night.

III Pln. Maintenance of road from 932296 to 948283 using 23 truck loads of stone; rectification of road in the vicinity of 949285. One squad on water point duties.

3rd Rd Coy.

I Pln. Maintenance of obstacles at the bottom of IDICE valley. Maintenance of road ~~from~~ ^{from} 926273 to 929277. Have revetted with timber a side-drain of approx 20 m. Retaining wall ~~xx~~ built at 926274.

II Pln. Maintenance of road from 929277 to 934273; have revetted with timber a 50 m side-drain, have improved the slope on curve at NR 930276. Improvements of road at 920276 using about 400 sandbags salvaged from old defence posns.

III Pln. Maintenance of road from 934273 to 943271; work is being continued in reducing gradients on road at 934273.

Comd Engr Bn.

(signed) Major Euso Vescovini.

0228

GRUPPO DI COMBATTIMENTO LEGNANO
Comando Battaglione Genio

n. 15.=

PERIODO /delle ore 0800 del 3/4/1945 alle ore 0800 4/4/1945.=

AL 52° B. L. U.

a) - DISLOCAZIONE : Immutata.=

b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

51° Compagnia Artieri :

= I° Plotone : Ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (943271) ; costruzione di m. 20 di cunetta di sezione 40X20 cm.; movimenti di terra per la sistemazione di pendenze troppo forti.=

= II° Plotone : Ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300); della pista da (957300) a (956302) e della pista da (957300) a (959304); il lavoro viene eseguito in parte di notte.=

= III° Plotone : Ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948283) portando 23 autocarri di pietrisco; ha eseguito lavori di rettificazione della strada nei pressi di (949285). Una squadra ha fatto servizio al Water Point.=

3° Compagnia Artieri :

= I° Plotone : Ha provveduto alla manutenzione delle intersezioni di fondo valle Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) ha rivestito con tononi circa m. 20 di cunetta ha messo in opera un'opera antisdrucciololettole a (926274).=

= II° Plotone : Ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (934273); ha rivestito con tononi m. 50 di cunetta; ha migliorato la pendenza della curva a (930276); ha migliorato il bordo a valle della strada a (920276) impiantando circa 400 sacchetti a terra recuperati dalle postazioni alleate lasciate.=

= III° Plotone : Ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (943271); continua il lavoro per

a) - DISLOCAZIONE : Immutata. =

b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

21^a Compagnia Artieri :

- = I^o Plotone : Ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della strada da (948283) a (943271) ; con costruzione di m. 20 di cunetta di sezione 40X20 cm. ; movimenti di terra per la sistemazione di pendenze troppo forti. =
- = II^o Plotone : Ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300) ; della pista da (957300) a (956302) e della pista da (957300) a (959304) ; il lavoro viene eseguito in parte di notte. =
- = III^o Plotone : Ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948283) portando 23 autocarri di pietrisco ; ha eseguito lavori di rettifica della strada nei pressi di (949225). Una squadra ha fatto servizio al Water Point. =

3^a Compagnia Artieri :

- = I^o Plotone : Ha provveduto alla manutenzione delle intersezioni di fondo valle Idice ; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277) ha rivestito con tondoni circa m. 20 di cunetta ha messo in opera unarete antisdruciolevole a (926274). =
- = II^o Plotone : Ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (934273) ; ha rivestito con tondoni m. 50 di cunetta ; ha migliorato la pendenza della curva a (930276) ; ha migliorato il bordo a valle della strada a (920276) impiegando circa 400 sacchetti a terra recuperati dalle postazioni alleate lasciate. =
- = III^o Plotone : Ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (943271) ; continua il lavoro per diminuire la pendenza della strada a (934273). =



UFFICIO COMANDANTE DEL BATTAGLIONE
(MAGGIORE E. VESCOVINI)

1944

LEGNANO COMBAT GROUP

HQ 51st Engineer Bn

No 14

PM 155 2 Apr 45

PERIOD From 0800 hrs 2 Apr 45 to 0800 hrs 3 Apr 45.

CG II US Corps
(Office of the Engineer).

Locations Unchanged

Operational activities

51st Field Company

1st platoon. Maintenance and improvement of Road from (948283) to (949271); construction of a 100 m Side drain, dimensions 40 X 20 cm.

II Platoon. Maintenance and improvement of track from (953288) to (957300); improvement and maintenance of track from (957300) to (956302) and from (957300) to (959304).

III Platoon. Maintenance of road from (932296) to (948283) using 25 truck loads of stone; dug a 30 m Side drain, dimensions 40 X 20 cm. Constructed timber box-culvert 20 X 30 and 4 m long at M.R.(947284); one squad on water point duties.

3 Field Company

1st Platoon. Maintenance of obstacles in the bottom of IDICE valley. Maintenance of Road from (926273) to (929277); have revetted a 25 m Side drain with timber at M.R.(929277)

II Platoon Maintenance of road from (934273) to (943271)
No 2 Squad of this Platoon are reducing gradients on road approx
MR (934273)

Comd Engr Bn.

(signed) Major Euso Vescovini

Operational activities

51° Field Company

1st platoon. Maintenance and improvement of Road from (948283) to (949271); construction of a 100 m Side drain, dimensions 40 X 20 cm.

II Platoon. Maintenance and improvement of track from (953288) to (957300); improvement and maintenance of track from (957300) to (956302) and from (957300) to (959304).

III Platoon. Maintenance of road from (932296) to (948283) using 25 truck loads of stone; dug a 30 m Side drain, dimensions 40 X 20 cm. Constructed timber box-culvert 20 X 30 and 4 m long at M.R.(947284); one squad on water point duties.

3 Field Company

1st Platoon. Maintenance of obstacles in the bottom of IDICE valley. Maintenance of Road from (926273) to (929277); have revetted a 25 m Side drain with timber at M.R.(929277)

II Platoon Maintenance of road from (934273) to (943271)
No 2 Squad of this platoon are reducing gradients on road approx
MR (934273)

Comd Engr Bn.

(signed) Major Euso Vescovini

6227

M/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Comando 51° Battaglione Genio =

n° 14

P.M. 155, 11 3 Aprile 1945

PERIODO / dalle ore 0800 del 2/4/45 alle ore 0800 del 3/4/1945. =

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a) - DISLOCAZIONE : Inmutata. -b) - ATTIVITA' OPERATIVA /51° Compagnia Artieri :

= I° plotone : manutenzione e miglioramento della strada nel tratto da (948283) a (949271); costruzione di 100 m. cunetta, dimensioni 40 x 20 cm. -

= II° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300) miglioramento e manutenzione della pista da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304). =

= III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948283) portando 25 automezzi di pie-trisce; ha scavato m. 30 di cunetta, dimensioni 40 x 20 cm. ha costruito un tombino mediante tavoloni a (947284) dell'ascezione di 20 x 30 e lungo 4 m. ; una squadra ha fatto servizio al Water Point Americano. -

3° Compagnia Artieri :

= I° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle del fiume Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277); ha rivestito con tondoni m. 25 di cunetta. -

= II° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (934273); ha messo in opera una rete antisdruciolabile a (930275); ha rivestito m. 25 di cunetta con tondoni. -

= III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da

a)- DISLOCAZIONE : Inmutata.-

b)- ATTIVITA' OPERATIVA :

51^a Compagnia Artieri :

- = 1° plotone : manutenzione e miglioramento della strada nel tratto da (948283) a (949271); costruzione di 100 m. cunetta, dimensioni 40 x 20 cm..-
- = 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300) miglioramento e manutenzione della pista da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304).=-
- = 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948283) portando 25 automezzi di pie-trisco; ha scavato m. 30 di cunetta, dimensioni 40 x 20 cm. ha costruito un tombino mediante tavoni e (947284) dell'assezione di 20 x 30 e lungo 4 m. ; una squadra ha fatto servizio al Water Point Americano.-

3^a Compagnia Artieri :

- = 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle del fiume Idice; ha provveduto alla manutenzione della strada da (926273) a (929277); ha rivestito con tendoni m. 25 di cunetta.-
- = 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (929277) a (934273); ha messo in opera una rete antisdruciololevole a (930275); ha rivestito m. 25 di cunetta con tendoni.-
- = 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (934273) a (943271); n° 2 squadre del plotone stanno facendo una variante per diminuire la pendenza della strada nei pressi di (934273).=-

Gr. 51^a Comp. Art. "Legnano" - 11^a B. I.
 IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE a. f. s.
 (Maggiore Enzo Vascovini)
 6220

(13)

PLANO COMBAT GROUP
HQ 51st Engineer Bn

No 13

PM 155 2nd Apr 1945PERIOD :- From 0300hrs 1 Apr 45 to 0800hrs 2 Apr 45TO :- CG II US Corps
(Office of the Engineer)(a) Locations :- unchanged.(b) Operational Activities1st Td Coy1st Pln :- Dug 100 m of side drains and improved the formation of the track between NR 948283 to 949281 ; section of side drains 40 x 20 cm.Second Pln :- Maintenance and improvement of track from 953288 to 957300, improvement and maintenance of track from 957300 to 956302 and from 957300 to 959304.Third Pln :- Built retaining wall at 949285 maintenance of road from 932296 to 948283 ; 18 truck loads of stone used.
One squad on water point duties.3 Rd Coy1st Pln :- Maintenance of obstacles in the bottom of IDICM valley.
One squad has revetted 30 m of side drains at 927275.
One squad maintenance of track from 926273 to 928277.Second Pln :- Built two retaining walls at 929277. Have revetted 25 m of side drains with timber at 927274.
Maintenance on road from 928277 to 933274.Third Pln :- Dug 60 m side drains in rock 40 x 20 cm, using a compressor truck at 935273. Maintenance on road from 933274 to 943971, worked on water points.

10-15 (Office of the Engineer)

(a) Locations :- unchanged.

(b) Operational Activities

1st Pln Coy

1st Pln :- Dug 100 m of side drains and improved the formation of the track between MR 948283 to 949281 ; section of side drains 40 x 20 cm.

Second Pln :- Maintenance and improvement of track from 953288 to 957300, improvement and maintenance of track from 957300 to 958302 and from 957300 to 959304.

Third Pln :- Built retaining wall at 949285 maintenance of road from 932296 to 948283 ; 18 tractor loads of stone used.
One squad on water point duties.

3rd Pln Coy

1st Pln :- Maintenance of obstacles in the bottom of IDICE valley.

One squad has revetted 30 m of side drains at 927275.

One squad maintenance of track from 926273 to 928277.

Second Pln :- Built two retaining walls at 929277. Have revetted 25 m of side drains with timber at 927274. Maintenance on road from 928277 to 933274.

Third Pln :- Dug 60 m side drains in rock 40 x 20 cm, using a compressor truck at 935273. Maintenance on road from 933274 to 943971; worked on water points.

Comd, Engr Bn.
(signed) Major MUZO VERGOVINI

6014

HQ TROOP

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
- Comando 52° Battaglione Genio =

B. A. 155, 11 2 Aprile 1945

no 13

PER IODO / Dalle ore 0800 dell'1/4/45 alle ore 0800 del 2/4/45. -

AL COMANDO II° CORPO D'ARMATA AMERICANO
- Ufficio Genio -

e) -- DISLOCAZIONE : Immunità.

b) - ATTIVITA' OPERATIVA /

- 51^a Compagnia Artieri :

51. Compagnia Artieri :
= 1.º plotone : ha provveduto allo scavo di m. 100 di cunetta ed al miglioramento del fondo della pista nel tratto da (948283) a (949281) sezione della cunetta 40x20. -

Il 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300) miglioramento e manutenzione della pista da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304). -

Il 1° plotone : ha messo in opera una rete antisdrucchiolo e a (949285) ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (949283) portando 18 autocarri di pietrisco. - Una squadra ha fatto servizio al Water Point. -

- } Compagnia Artieri :

3^a Compagnia Artiglieri :
= 1^o plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzio-
ni di fondo valle Idice. - Una squadra ha rivesti-
to con tondoni m. 30 di cunette a (927275); Una
squadra ha provveduto alla manutenzione della pi-
sta da (926273) a (928277). -

sta da (928277) a (928274). -

= III° plotone : ha scavato m. 60 di cunetta in roccia (40x20) con impiego del motocompressore e (935273); ha provveduto alla manutenzione della strada da (943074) a (943071); ha fatto servizio al Water

AL COLONNELLO LIO CONDO
- Ufficio Genio -

a) - DISLOCAZIONE: Inmutata.-
b) - ATTIVITA' OPERATIVA /

- 51^a Compagnia Artieri:
- = 1^o plotone: ha provveduto allo scavo di m. 100 di cunetta ed al miglioramento del fondo della pista nel tratto da (948283) a (949281) sezione della cunetta 40x20.-
 - = 11^o plotone: ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300) miglioramento e manutenzione della pista da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304).-
 - = 111^o plotone: ha messo in opera una rete antisdrucchiolante a (949285) ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948283) portando 18 autocarri di pietrisco.- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

- 3^a Compagnia Artieri:

- = 1^o plotone: ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle Idice.- Una squadra ha rivestito con tondoni m. 30 di cunette a (927275); Una squadra ha provveduto alla manutenzione della pista da (926273) a (928277).-
- = 11^o plotone: ha messo in opera due reti antisdrucchiolanti a (929277) ha rivestito con tondoni m. 25 di cunetta a (927274); ha provveduto alla manutenzione della strada da (928277) a (933274).-
- = 111^o plotone: ha scavato m. 60 di cunetta in roccia (40x20) con impiego del motocompresse a (935273); ha provveduto alla manutenzione della strada da (933274) a (943971); ha fatto servizio al Water Point.-

COMANDANTE DEL BATTAGLIONE
(Mangiolo Rizo Vescovalini)



M/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNAME"
= Comando 51° Battaglione Genio =

n° 13

P. M. 155, li 2 Aprile 1945

PERIODO / Dalle ore 0800 dell'1/4/45 alle ore 0800 del 2/4/45.-

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a) - DISLOCAZIONE : Inmutata.-b) - ATTIVITA' OPERATIVA /

- 51ª Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto allo scavo di m. 100 di cunetta ed al miglioramento del fondo della pista nel tratto da (948283) a (949281) sezione della cunetta 40x20.-

= 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300) miglioramento e manutenzione della pista da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304).-

= 111° plotone : ha messo in opera una rete antisidruccioloievole a (949285) ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948283) portando 18 autocarri di pietrisco.- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

- 3ª Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle Idice.- Una squadra ha rivestito con tondoni m. 30 di cunette a (927275); Una squadra ha provveduto alla manutenzione della pista da (926273) a (928277).-

= 11° plotone : ha messo in opera due reti antisidruccioloievole a (929277) ha rivestito con tondoni m. 25 di cunetta a (927274); ha provveduto alla manutenzione della strada da (928277) a (933274).-

= 111° plotone : ha scavato m. 60 di cunetta in roccia (40x20) con impiego del motocompressore a (935273); ha provveduto alla manutenzione della strada da

(12)


e)- DISLOCAZIONE: Inmutata.-b)- ATTIVITA' OPERATIVA:- 51^a Compagnia Artieri:

- = 1^o plotone: ha provveduto allo scavo di m. 100 di cunetta ed al miglioramento del fondo della pista nel tratto da (948283) a (949281) sezione della cunetta 40x20.-
- = 11^o plotone: ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300) miglioramento e manutenzione delle piste da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304).-
- = 111^o plotone: ha messo in opera una rete antisdruciolevole a (949285) ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948283) portando 18 auto-carri di pietrisco.- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

- 3^a Compagnia Artieri:

- = 1^o plotone: ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle Idice.- Una squadra ha rivestito con tendoni m. 30 di cunette a (927275); Una squadra ha provveduto alla manutenzione della pista da (926273) a (928277).-
- = 11^o plotone: ha messo in opera due reti antisdruciolevoli a (929277) ha rivestito con tendoni m. 25 di cunetta a (927274); ha provveduto alla manutenzione della strada da (928277) a (933274).-
- = 111^o plotone: ha scavato m. 60 di cunetta in roccia (40x20) con impiego del motocompressore a (935273); ha provveduto alla manutenzione della strada da (933274) a (943971); ha fatto servizio al Water Point.-

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE
(Maggiore Nino Vescovini)

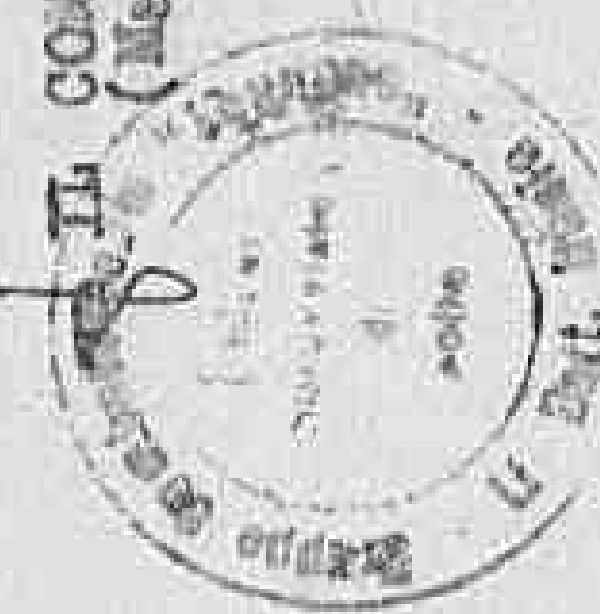

6117

Scavare a dig

} rete antisdruciolevole = retaining wall

11
 LPO-ASO COMBAT GROUP

HQ 51st Engineer Bn

No 12

PM 155 1 April 45

PERIOD 0800hrs 31 Mar 45 to 0800hrs 1 Apr 45

To
 CG II US Coys
 (Office of the Engineer)

(a) LOCATIONS First Pln 51st Coy moved to 948272, remainder unchanged.

(b) OPERATIONAL ACTIVITIES

FD
 51st Coy

First Pln :- Quarried 43 truckloads of gravel, constructed 40 m. of side drains 40 cm X 20 cm on track from 930275 to 942275; in afternoon changed Pln location.

Second Pln :- maintenance and improvement of track from 953288 to 957300 maintenance and improvement of track from 957300 to 958302 and from 957300 to 959201.

Third Pln :- maintenance of road from 932295 to 948222; revetted approx 60 m. of side drains from 935295 to 934295; constructed and revetted 10 m. of side drains (40 cm X 30 cm) on alternative approach road to 63th Inf Regt 949287 to 949285; constructed, on same road 70 m. of side drains 40 cm X 20 cm; constructed one timber box-culvert 20 cm X 30 cm at 948265; revetted cutting at 949286. One squad on Water point duties.

3rd Pn Coy

First Pln : Maintenance of obstacles in bottom of Idice Valley; one squad constructed 15 m. of stone side drain 40 cm X 20 cm at 926275, using compressor.

Second Pln: constructed and revetted 55 m. of side drains at 928276; retaining wall revetted with 200 sand bags (928276).

Third Pln : one squad continued clearance of enemy minefield at 941272; one squad constructed 30 m. of side drains in stone, 40 cm X 20 cm at 935273; one squad carried out Water point duties; one squad reconnected minefields 88 - 22; 88 - 20; one squad reconnected minefields 88 - 23; 88 -

(b) OPERATIONAL ACTIVITIES

FD
51st Coy

First Pln :- quarried 43 truckloads of gravel, constructed 40 m. of side drains 40 cm X 20 cm on track from 930275 to 942275; in afternoon changed Vln location.

Second Pln :- maintenance and improvement of track from 953288 to 957300 maintenance and improvement of track from 957300 to 956302 and from 957300 to 959404.

Third Pln :- maintenance of road from 932296 to 948222; revetted approx 60 m. of side drains from 939295 to 934295; constructed and revetted 10 m. of side drains (40 cm X 30 cm) on alternative approach road to 68th Inf Regt 949287 to 949286; constructed, on same road 70 m. of side drains 40 cm X 20 cm; constructed one timber box-culvert 20 cm X 30 cm at 940202; revetted cutting at 949286. One squad on water point duties.

3rd Rd Coy

First Pln :- maintenance of obstacles in bottom of Idice Valley; one squad constructed 15 m. of stone side drain 40 cm X 20 cm at 926275, using compressor.

Second Pln: constructed and revetted 55 m. of side drains at 928276; retaining wall revetted with 200 sand bags (928276).

Third Pln :- one squad continued clearance of enemy minefield at 944272; one squad constructed 30 m. of side drains in stone, 40 cm X 20 cm at 935273; one squad carried out water point duties; one squad reconnected minefields serials 88 - 22; 88 - 20; one squad reconnected minefields 88 - 23; 88 - 31.

6016

Comd, Engr Bn,
(signed) Major Enzo Vescovini.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO LEG. NO
Comando II° Battaglione Genio

n. 12.=

P.M. 155, il 1° aprile 1945.=

PERIOD O / Dalle ore 0800 del 31/3/1945 alle ore 0800 del
1 aprile 1945.=

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a) - DISLOCAZIONE : Il 1° Plotone della 51ª Cp. Artieri si è spostato a (946272) - per i rimanenti comandi e reparti, dislocazione immutata.=

b) - ATTIVITA' OPERATIVA /

- 51ª Compagnia Artieri :

= I° plotone : ha provveduto allo scarico di 43 autocarri di ghisa; ha costruito 40 m. di cunetta di 40 X 20 nel tratto di pista da (930275) a (942275) nel pomeriggio ha effettuato lo spostamento.=

= II° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953283) a (957300); miglioramento, manutenzione delle piste da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304).-

= III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (943282); ha rivestito circa 60 metri di cunetta da (935295) a (934295); ha costruito m. 10 di cunetta rivestita con tavoloni di 0,40x0,30 sulla variante strada accesso al 68° Reggimento Panteria da (949287) a (949286) ha costruito su detta variante m. 70 di cunetta di 0,40x0,20; ha costruito un tombino in tavoloni di 0,20x0,30x4,00 a (948285); ha messo in opera una rete antiaerea (949286).- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

- 3ª Compagnia Artieri :

= I° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle intersezioni di fondo valle Idice.- Una squadra ha provveduto alla costruzione di m. 15 di cunetta in roccia di 40x20 con impiego di motocompresse sore a (926275).-

6215

a) - DISLOCAZIONE : Il 1° Plotone della 51^a Cp. Artieri si è spostato a (946272) - per i rimanenti comandi e reparti, dislocazione inmutata.-

b) - ATTIVITA' OPERATIVA /

- 51^a Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto allo scarico di 43 autocarri di ghisa; ha costruito 40 m. di cunetta di 40 X 20 nel tratto di pista da (930275) a (942275) nel pomeriggio ha effettuato lo spostamento.-

= II° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300); miglioramento, manutenzione della pista da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304).-

= III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948282); ha rivestito circa 60 metri di cunetta da (935295) a (934295); ha costruito m. 10 di cunetta rivestita con tavoloni di 0,40x0,30 sulla variante strada accesso al 68° Reggimento Fanteria da (949287) a (949286) ha costruito su detta variante m. 70 di cunetta di 0,40x0,20; ha costruito un tombone in tavoloni di 0,20x0,30x4,00 a (948285); ha messo in opera una rete antiaerociclovolo a (949286).- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

6215

- 3^a Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni di fondo valle idice.- Una squadra ha provveduto alla costruzione di m. 15 di cunetta in roccia di 40x20 con impiego di motocompresse sore a (926275).-

= II° plotone : ha provveduto alla sistemazione e rivestimento con tavoloni di m. 55 di cunetta (928276); sono state fatte delle scarpate con trasporto ed impiego di 200 sacchetti a terra.-

= III° plotone : Una squadra ha continuato la bonifica del campo minato nemico a (941272).- Una squadra ha costruito m. 30 di cunetta in roccia di 40x20 (935273).- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.- Una squadra ha revisionato i campi minati n° 88-22 - 88-20.- Alta squadra ha revisionato i campi minati 88-23; 88-31.-



MB/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Comando 51° Battaglione Genio =

n° 11

P.M. 155, 11 31 Marzo 1945

PERIODO / Dalle ore 0800 del 30/3/1945 alle ore 0800 del 31 Mar
zo 1945. =

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a) - DISLOCAZIONI : Immutata. =b) - ATTIVITA' OPERATIVA /

- 51ª Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha continuato il miglioramento della pista da quota 349 (930275) a (934274) con trasporto e spargimento di 43 autocarri di pietrisco. =

= 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300); miglioramento e manutenzione delle piste da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304). =

= 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948282); ha lavorato alla costruzione di una variante da (949237) a (949286); detta variante è ultimata, mancano le cunette ed un tombino. = Una squadra ha fatto servizio al Water Point. = Una squadra ha revisionato i campi minati n° 34-24, 19-3, 19-2, e 88-17. =

- 3ª Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo valle Idice. = Una squadra ha revisionato i campi minati n° 88-26, 88-32. = Una squadra ha provveduto alla manutenzione della strada da (927273) a (927275) con la costruzione di cunette in roccia per la lunghezza di m. 10 sezione 40x20. =

= 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (927275) a (929277); ha costruito un tombino con tavoloni della Sezione di 20x30 e lungo 50 metri di cunette.

a)- DISLOCAZIONE : Inmutata.-b)- ATTIVITA' OPERATIVA /- 51^a Compagnia Artieri :

- = 1^o plotone : ha continuato il miglioramento della pista da quota 349 (930275) a (934274) con trasporto e spargimento di 43 autocarri di pietrisco.-
- = 11^o plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300); miglioramento e manutenzione delle piste da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304).-
- = 111^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (932296) a (948282); ha lavorato alla costruzione di una variante è ultimata, mancano (949286); detta variante è ultimata, mancano le cunette ed un tombino.- Una squadra ha reso servizio al Water Point.- Una squadra ha revisionato i campi minati n° 34-24; 19-3; 19-2; e 88-17.-

- 3^a Compagnia Artieri :

- = 1^o plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo Valle Idice.- Una squadra ha revisionato i campi minati n° 88-26, 88-32.- Una squadra ha provveduto alla manutenzione della strada da (927273) a (927275) con la costruzione di cunette in roccia per la lunghezza di m.10 sezione 40x20.-
- = 11^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della strada da (927275) a (939277); ha costruito un tombino con tavoloni della sezione di 20x30 e lunghezza m. 4 a (927275) ha rivestito 50 metri di cunette con tondoni, ha rivestito m. 25 della scarpata a monte della strada con ramaglia e pali di ferro.-
- = 111^o plotone : ha ultimato la variante da (934273) a (935273) ha continuato la bonifica del campo minato nel n° 88-24 (941272).- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

IL
COMANDANTE DEL BATTAGLIONE - 1^o s
(Maggiore Enzo Vescovini)

M/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGANO"
= Comando 51° Battaglione Genio =

n° 10

P.M. 155, li 30 Marzo 1945

PERIODO / Ore 0800 29 Marzo 1945 at Ore 0800 30 Marzo 1945. =

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a)- DISLOCAZIONE : Immutata. -b)- ATTIVITA' OPERATIVA /

- 51ª Compagnia Artieri :

= I° plotone : ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275); costruzione di cunette con l'uso del motocomprensore; costruzione di tombini con tavoloni a (930276). -

= II° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300); miglioramento delle piste da (957300) a 956302 e da (957300) a (959308). -

= III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della rotabile da (932296) a (948282); ha lavorato alla costruzione di una variante alla strada di accesso al Comando 68° Fanteria (948286). - Una squadra ha fatto la revisione dei campi minati n° 34-32 34 - 31; 85 - 5. - Una squadra ha fatto servizio al Water Point. -

- 3ª Compagnia Artieri :

= I° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo valle dell'Idice. - Una squadra ha provveduto alla manutenzione delle cunette sulla pista da (927277) a (931275). -


= II° plotone : ha continuato il lavoro di rivestimento delle cunette con tondoni; ha trasportato 43 autocarri di roccia. - *from what map Ref. 16 with map*

= III° plotone : ha continuato i lavori di trasformazione in camminabile della pista da (934273) a (936273); ha continuato la bonifica del campo minato nemico a (941272). - Una squadra ha fatto servizio al Water Point. -

a)- DISLOCAZIONE : Immutata.

b)- ATTIVITA' OPERATIVA :

- 51^a Compagnia Artieri :
 - = 1° plotone : ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275); costruzione di cunette con l'uso del motocompresse; costruzione di tombing con tavoloni e (930276).-
 - = 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300); miglioramento delle piste da (957300) a (956302) e da (957300) a (959302).-
 - = 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della rotabile da (932296) a (948282); ha lavorato alla costruzione di una variante alla strada di accesso al Comando 68° Fanteria (948286).- Una squadra ha fatto la revisione dei campi minati n° 34-35 ha fatto la revisione dei campi minati n° 34-35 34 - 31; 35 - 5.- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-
- 3^a Compagnia Artieri :
 - = 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo valle dell'Idice.- Una squadra ha provveduto alla manutenzione delle cunette sulla pista da (927277) a (931275).-
 - = 11° plotone : ha continuato il lavoro di rivestimento delle cunette con tondoni; ha trasportato 43 autocarri di roccia.-
 - = 111° plotone : ha continuato i lavori di trasformazione in campo minabile della pista da (934273) a (936273); ha continuato la bonifica del campo minato nemico a (941272).- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

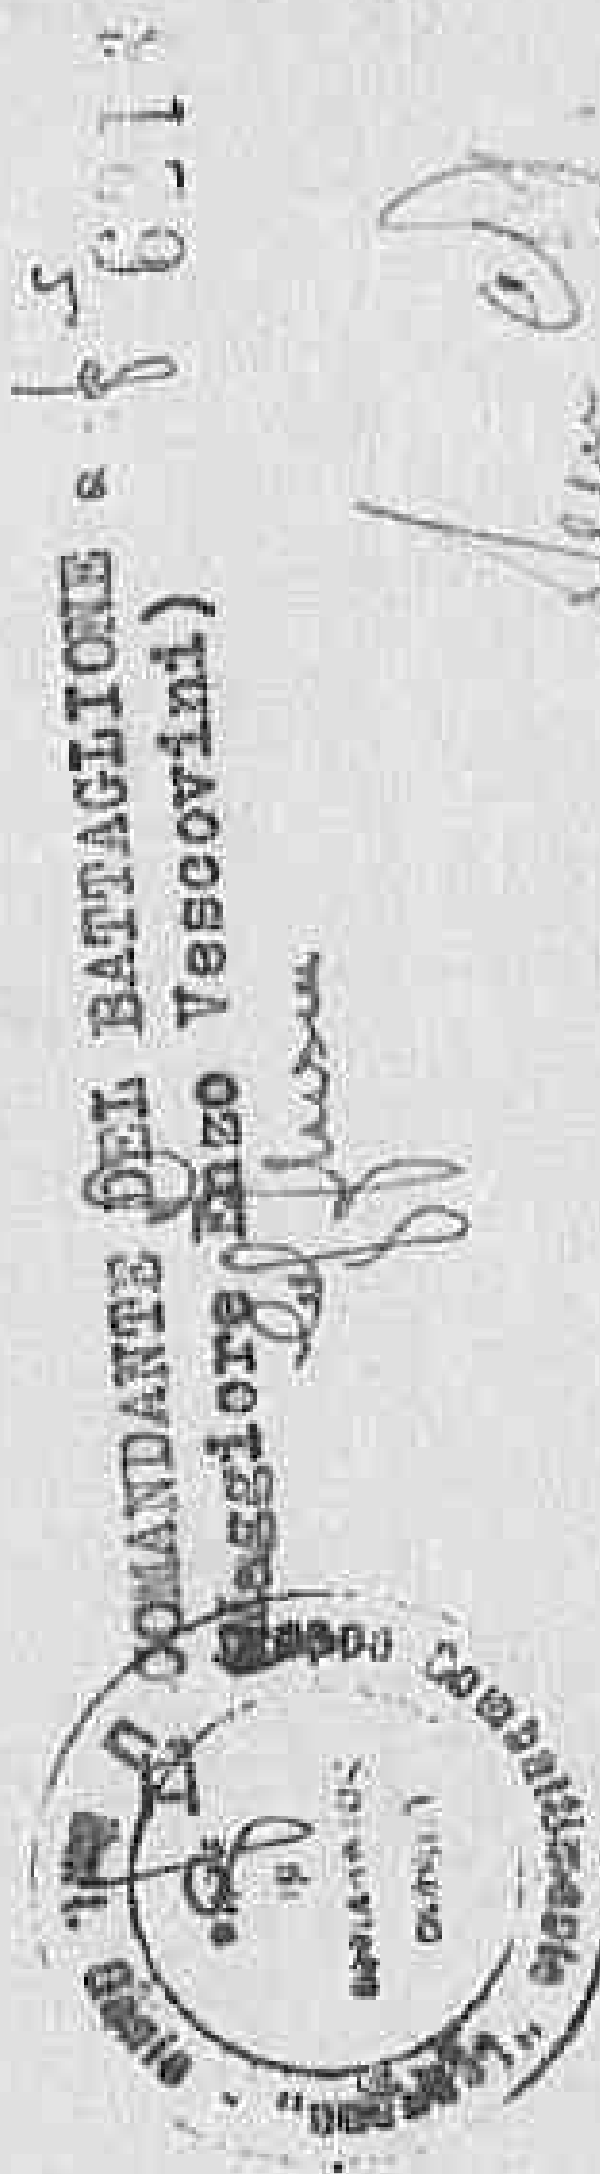

M/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Comando 51° Battaglione Genio =

n° 9

P.M. 155, 13 29 Marzo 1945

0800

PERIODO / 28 Marzo 1945 at ore 0800 29 Marzo 1945.-

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a) - DISLOCAZIONE / Immutata.-b) - ATTIVITA' OPERATIVA /51° Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275); costruzione di cunette con l'uso del motocompressore.-

= 11° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288 a (957300); ha iniziato il lavoro di miglioramento della pista da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304).-

= 111° plotone : ha provveduto alla manutenzione della rotabile da (932296) a (948282); ha lavorato alla costruzione di una variante alla strada di accesso al Comando 68° Fanteria; Una squadra ha revisionato 2 campi minati 83 - 15; 34 - 23; 34 - 33.- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

948283.

3° Compagnia Artieri :

= 1° plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo valle dell'Idice; Una squadra ha provveduto alla manutenzione delle cunette sulla pista da (927277) a (931275).-

= 11° plotone : ha continuato il lavoro di rivestimento della cunette con tondoni; ha trasportato 52 autocarri di roccia.-

= 111° plotone : ha continuato i lavori di trasformazione in camionabile della pista da (934273) a (936273).- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE

a) - DISLOCAZIONE / Immutata.-

b) - ATTIVITA' OPERATIVA /

51^a Compagnia Artieri :

= I^o plotone : ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275); costruzione di cunette con l'uso del motocompressore.-

= II^o plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288 a (957300); ha iniziato il lavoro di miglioramento della pista da (957300) a (956302) e da (957300) a (959304).-

= III^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della rotabile da (932296) a (948282); ha lavorato alla costruzione di una variante alla strada di accesso al Comando 68^o Panteria; Una squadra ha revisionato i campi minati 88 - 15; 34 - 23; 34 - 33.- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

948283.

3^a Compagnia Artieri :

= I^o plotone : ha provveduto alla manutenzione delle interruzioni del fondo valle dell'Idice; Una squadra ha provveduto alla manutenzione delle cunette sulla pista da (927277) a (931275).-

= II^o plotone : ha continuato il lavoro di rivestimento della cunette con tondoni; ha trasportato 52 autocarri di roccia.-

= III^o plotone : ha continuato i lavori di trasformazione in camionabile della pista da (934273) a (936273).- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE
(Maggiore Enzo Vescovini)



8217

M/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNAME"
= Comando 51° Battaglione Genio =

n° 8

P.M. 155, 11 28 Marzo 1945

PERIODO / Ore 0800 27 Marzo at 0800 28 Marzo 1945.-

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

Il primo plotone della 51° Compagnia Artieri si è spostato da (927277) a (931275).
Per gli altri plotoni e Comandi dislocazione immutata.-

ATTIVITA' OPERATIVA- 51° Compagnia Artieri :

= I° plotone : ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275); costruzione di cunette con l'uso del motocompressore; costruzione di tombino con tavoloni in legno.-

*Cunette - completed
20 cm 20 cm apart
Completed.*

width 3 1/2 meters.

= II° plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300).-

= III° plotone : ha provveduto alla manutenzione della rotabile da (932296) a (943282); ha lavorato alla costruzione di una variante alla strada di accesso al 68° Fanteria.- Una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

*revision
948283*

- 3° Compagnia Artieri :

= I° plotone : ha revisionato le interruzioni n° 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34.- Una squadra ha costruito le cunette sulla pista da (927277) a (931275).-

= II° plotone : ha lavorato sulla pista suddetta costruendo un tombino con tavoloni; ha usato il motocompressore.- Una squadra è stata adibita al rifinito di tononi per il rivestimento delle cunette; ha trasportato 47 autocarri di roccia.-

= III° plotone : ha continuato i lavori di trasformazione in camionabile della pista da 934273 a 936273.- Una squadra ha bonificato di un campo minato nemico

Il primo plotone della 51^a Compagnia Artieri si è spostato da (927277) a (931275).
Per gli altri plotoni e Comandi dislocazione immutata.

ATTIVITA' OPERATIVA

- 51^a Compagnia Artieri :

= I^o plotone : ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275); costruzione di cunette con l'uso del motocompressore; costruzione di tombino con tavoloni in legno.

= II^o plotone : ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300).

= III^o plotone : ha provveduto alla manutenzione della rotabile da (932296) a (948282); ha lavorato alla costruzione di una variante alla strada di accesso al 68° Fanteria. - Una squadra ha fatto servizio al Water Point.

*Versione 8 divisione:
948283*

- 3^a Compagnia Artieri :

= I^o plotone : ha revisionato le interruzioni n° 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34. - Una squadra ha costruito le cunette sulla pista da (927277) a (931275).

= II^o plotone : ha lavorato sulla pista suddetta costruendo un tombino con tavoloni; ha usato il motocompressore. - Una squadra è stata adibita al rifinito di toni per il rivestimento delle cunette; ha trasportato 47 autocarri di roccia.

= III^o plotone : ha continuato i lavori di trasformazione in camionabile della pista da 934273 a 936273. - Una squadra ha iniziato la bonifica di un campo minato nemico a 941272. - Una squadra ha fatto servizio al Water Point.



COMANDANTE DEL BATTAGLIONE
Maggiore Enzo Vescovini) a. f. s.

M/en.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Comando 51° Battaglione, Genio =
~~~~~

n° 7

P.M. 155, 11 27 Marzo 1945

AL 52° BRITISH LIAISON UNIT

a) - PERIODO / Ore 0300 26 Marzo 1945 et Ore 0300 27 Marzo 1945. =

~~~~~

e) - DISLOCAZIONE : Inmutata. -

b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

- 51° Compagnia Artieri :

- = I° plotone ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275). -
- = II° plotone ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300). -
- = III° plotone ha provveduto alla manutenzione della rotabile da 932296 a 948282 con trasporto di 15 autocarri di roccia; una squadra ha fatto servizio al Water Point. =

- 3° Compagnia Artieri :

- = I° plotone ha revisionato le interruzioni 24 - 25 - 26. -
- = II° plotone ha eseguito lavori di miglioramento delle onnette del fondo stradale con trasporto e spargimento di 37 autocarri di pietrisco, ed ha steso una rete antistrusciolevole. -
- = III° plotone ha continuato i lavori di trasformazione in cascinabile della pista da 934273 a 936273 con impiego del motocompresseore; una squadra ha fatto servizio al Water Point; una squadra ha revisionato i carri minati 19 - 0; 19 - 1; 19 - 5; 34 - 26. =

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE - f. s.
(Maggiore Enzo Vescovini)



1) - P E R I O D O / Ore 0800 26 Marzo 1945 at Ore 0800 27 Marzo 1945.-

a) - DISLOCAZIONE : Inmutata.-

b) - ATTIVITA' OPERATIVA :

- 51^a Compagnia Artieri :

- = 1^o plotone ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275).-
- = 11^o plotone ha provveduto alla manutenzione e miglioramento della pista da (953288) a (957300).-
- = 111^o plotone ha provveduto alla manutenzione della rotabile da 932296 a 948282 con trasporto di 15 autocarri di roccia; una squadra ha fatto servizio al Water Point.-

- 3^a Compagnia Artieri :

- = 1^o plotone ha revisionato le interruzioni 24 - 25 - 26.-
- = 11^o plotone ha eseguito lavori di miglioramento delle cunette del fondo stradale con trasporto e spargimento di 37 autocarri di pietrisco, ed ha steso una rete antisidrociclovolo.-
- = 111^o plotone ha continuato i lavori di trasformazione in caronabile della pista da 934273 a 936273 con impiego del motocompressore; una squadra ha fatto servizio al Water Point; una squadra ha revisionato i carri pi minati 19 - 0; 19 - 1; 19 - 5; 34 - 26.-

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE - f.s.
(Maggiore Enzo Vescovinci)
Enzo Vescovinci



6217

M/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "MEGHANO"
= Comando 51° Battaglione Genio =

n° 5

P.M. 155, 11 25 Marzo 1945

P E R I O D O / Ore 0800 24 Marzo 1945 at Ore 0800 25 Marzo 1945. =

AL 52° B. L. D. (the 2nd pl. of 51st Engineer Co. moved to 956302 in the afternoon of 24th. - Remained of HQ and subunits remain unchanged.)

Il secondo plotone della 51ª Compagnia Artieri si è trasferito a 956302 nel pomeriggio del 24/3/1945. - Rimangono comandi e plotoni di dislocazione immutati. -

ATTIVITA' OPERATIVA

- 51ª Compagnia Artieri - Primo plotone: ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275) con impiego del motocompressore e particolare riguardo alle funette. - Secondo plotone: nella mattinata ha continuato i lavori per il consolidamento della pista da 926272 a 930275. - Nel pomeriggio si è trasferito come sopra detto a 956302. - Terzo plotone: ha continuato la manutenzione della rotabile da 932296 a 948282 con trasporto di 20 autocarri di roccia. - Una squadra ha fatto servizio al Water Point. - Una squadra ha revisionato l'interruzione n° 41. =

- 3ª Compagnia Artieri - Primo plotone: ha proseguito alla ricognizione delle interruzioni del fondo valle; le interruzioni 5 e 6 revisionate sono state passate in consegna al Reggimento Fanteria Speciale. - Secondo plotone: ha continuato i lavori di costruzione e miglioramento dell'ovette; costruzione di graticoli per sostegno delle scarpate; ha eseguito lavori di miglioramento del fondo pista con spargimento e trasporto di 42 autocarri di roccia. - Terzo plotone: ha eseguito lavori di traslocazione in camionabile della pista da 934273 a 936273 con impiego del motocompressore, ha

Il secondo plotone della 51^a Compagnia Artieri si è trasferito a 956302 nel pomeriggio del 24/3/1945. - Rimanenti comandi e plotoni dislocazione immutata. -

ATTIVITA' OPERATIVA

- 51^a Compagnia Artieri - Primo plotone : ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275) con impiego del motocompressore e particolare riguardo alle funette. - Secondo plotone : nella mattinata ha continuato i lavori per il consolidamento della pista da 926272 a 930275. - Nel pomeriggio si è trasferito come sopradetto a 956302. - Terzo plotone : ha continuato la manutenzione della rotabile da 932296 a 943282 con trasporto di 20 autocarri di roccia. - Una squadra ha fatto servizio al Water Point. - Una squadra ha revisionato l'interruzione n° 41. -

- 3^a Compagnia Artieri - Primo plotone : ha proseguito alla ricognizione delle interruzioni del fondo valle; le interruzioni 5 e 6 revisionate sono state passate in consegna al Reggimento Fanteria Speciale. - Secondo plotone : ha continuato i lavori di costruzione e miglioramento delle scarpate; ha eseguito lavori di miglioramento del fondo pista con spargimento e trasporto di 42 autocarri di roccia. - Terzo plotone : ha eseguito lavori di trasferimento in camionabile della pista da 934273 a 936273 con impiego del motocompressore, ha eseguito notevoli movimenti di terra. - Ha iniziato la costruzione di una variante alla pista già esistente da 943271 a 944271 con impiego del Bulldozer. - Una squadra ha fatto servizio al Water Point. -

6309

COMANDANTE DEL BATTAGLIONE a. f. s.
(Maggiore Enzo Vescovini)



n/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Comando 51° Battaglione Genio =

n° 4 di prot.

P.M.155,11 24 Marzo 1945

P E R I O D O / Ore 0300 23 Marzo 1945 at Ore 0800 24 Marzo 1945.=

AL 52° B. I. U.

DISLOCAZIONE : - Inmutata.-ATTIVITA' OPERATIVA /

- 51° Compagnia Artieri - Primo plotone : ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275) con impiego del motocompressore.-
Secondo plotone : ha continuato i lavori per la costruzione della massicciata di una parte della pista sopradetta e trasporto di 45 autocarri di roccia.-
Terzo plotone : ha continuato la manutenzione della rotabile da 932296 a 948282 con trasporto di 16 autocarri di ghiaia; - Una squadra ha revisionato durante la notte le interruzioni n° 39.- Una squadra ha eseguito addestramento sul Water Point.=
- 3° Compagnia Artieri - Primo plotone : ha proseguito alla ricognizione delle interruzioni del fondo valle dell'Idice e delle interruzioni 35 e 36.-
Secondo plotone : ha costruito le cumette per scarico delle acque, impiegando il motocompressore; pulizia e miglioramento di quelle esistenti da 928275 a quota 349 (930275).-
Terzo plotone : ha eseguito lavori di trasformazione in camionabile della pista da 934273 a 936273 con impiego del motocompressore; ha eseguito notevoli movimenti di terra per migliorare la pendenza.- Una squadra ha eseguito addestramento sul Water Point.-

Comando 51° Battaglione Genio
Comandante del Battaglione a. f. s.
Maggiore Ando Vescovini

AL 52° B. L. U.

DISLOCAZIONE : - Inmutata.-

ATTIVITA' OPERATIVA /

- 51° Compagnia Artieri - Primo plotone : ha continuato il miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275) con impiego del motocompressore.- Secondo plotone : ha continuato i lavori per la costruzione della massicciata di una parte della pista sopradetta e trasporto di 45 autocarri di roccia.- Terzo plotone : ha continuato la manutenzione della rotabile da 932296 a 948282 con trasporto di 16 autocarri di ghiaia; - Una squadra ha revisionato durante la notte le interruzioni n° 39.- Una squadra ha eseguito addestramento sul Water Point.=
- 3° Compagnia Artieri - Primo plotone : ha proseguito alla ricognizione delle interruzioni del fondo Valle dell'Idice e delle interruzioni 35 e 36.- Secondo plotone : ha costruito le cumette per scarico delle acque, impiegando il motocompressore; pulizia e miglioramento di quelle esistenti da 928275 a quota 349 (930275).- Terzo plotone : ha eseguito lavori di trasformazione in camionabile della pista da 934273 a 936273 con impiego del motocompressore; ha eseguito notevoli movimenti di terra per migliorare la pendenza.- Una squadra ha eseguito addestramento sul Water Point.-



IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE a. f. s.
(Maggiore Enzo Vescovini)

6308

M/cu.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "ISCAMANO"
= Comando 51° Battaglione Genio =

n° 3

P.M. 155, il 23 Marzo 1945

PERIODO Ore 0800 22 Marzo 1945 at Ore 0800 del 23 Marzo 1945.

AL 52° B. L. U.

DISLOCAZIONE : - Immutata. -ATTIVITA' OPERATIVA :

- 51° Compagnia Artieri - Il primo plotone ha eseguito lavori di miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275) con impiego del motocompresso-
re, sono state fatte brillare 15 mine. -
Il secondo plotone ha eseguito lavori per la costruzione della massicciata di una parte della pista sopradetta con impiego del Bulldozer e con trasporto di 50 autocarri di roccia. -
Il terzo plotone ha provveduto alla manutenzione della strada da 932296 a 948282; sono stati trasportati 15 autocarri di roccia. -
Una squadra ha fatto addestramento sul Water Point. -
- 3° Compagnia Artieri - Il primo plotone ha proseguito alle riconquiste delle interruzioni del fondo valle del l'Allice. -
Il secondo plotone ha eseguito lavori di miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275) ; ha costruito due tombini e curette. -
Il terzo plotone ha eseguito lavori di trasformazione in camionabile della pista da 934273 a 936273 con impiego del motocompresso-
re. =

Il COMANDANTE DEL BATTAGLIONE e. f. s.
(Maggiore ENZO Vescovini)

DISLOCAZIONE: - Immutata.-ATTIVITA' OPERATIVA:

- 51° Compagnia Artieri - Il primo plotone ha eseguito lavori di miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275) con impiego del motocompresse, sono state fatte brillare 15 mine.-
 Il secondo plotone ha eseguito lavori per la costruzione della massicciata di una parte della pista sopradetta con impiego del Bulldozer e con trasporto di 50 autocarri di roccia.-
 Il terzo plotone ha provveduto alla manutenzione della strada da 932295 a 948282; sono stati trasportati 15 autocarri di roccia.-
 Una squadra ha fatto addestramento sul Water Point.-
- 3° Compagnia Artieri- Il primo plotone ha proseguito alla ricognizione delle interruzioni del fondo valle del l'Alce.-
 Il secondo plotone ha eseguito lavori di miglioramento della pista da 926272 a quota 349 (930275); ha costruito due tombini e curette.-
 Il terzo plotone ha eseguito lavori di trasformazione in camionabile della pista da 934273 a 936273 con impiego del motocompresse.

IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE a. d. s.
 (Maggiore Enzo Vescovini)
Ed. f. m.

h. m. c. d.

M/ou.

AL 500 S. I. U.

GRUPPO DI COMBATTIMENTO "LEGNANO"
= Comando 51° Battaglione Genio =

3

N° 2

P.M.155,11 22 Marzo 1945

P E R I O D O / Ore 0800 21 Marzo 1945 at Ore 0800 del 22 Marzo 1945.-

DISLOCAZIONE:

- Comando 51° Battaglione Genio a (237919)
- Comando 3° Compagnia Artieri a (239919)
- Comando 51° Compagnia Artieri a (292945)
- 1° plotone 3° Comp. Artieri a (235918)
- 2° plotone 3° Comp. Artieri a (261925)
- 3° plotone 3° Comp. Artieri a (261925)
- 1° plotone 51° Comp. Artieri a (277927)
- 2° plotone 51° Comp. Artieri a (273927)
- 3° plotone 51° Comp. Artieri a (292945).-

ATTIVITA' OPERATIVA:

- 51° Compagnia Artieri - Il primo plotone ha continuato i lavori di trasformazione in camionabile della pista da quota 349 (275930) a (275932) eseguendo lavori in roccia con impiego di motocompressore.-
Il secondo plotone ha eseguito lavori di movimento di terra sulla pista aperta nel giorno 20 da (272925) a quota 349 (275930) con l'impiego di Bulldozer per circa ore due; ha effettuato il trasporto di dieci autocarri di ghiaia ha eseguito lavori in roccia con impiego di motocompressore.-
Il terzo plotone trasformazione in camionabile della pista da quota 501 (276978) a (276946) - una squadra ha eseguito lavori di manutenzione stradale tra (296932) a (282948); - una squadra ha fatto addestramento sul Water Pointi Americano.-

- 3° Compagnia Artieri - Primo plotone ricognizione delle interruzioni stradali nel settore della compagnia.- Una squadra ha preso in consegna le interruzioni numero 5 e 6.-
Secondo plotone ha continuato i lavori di trasformazione in camionabile della pista da

P E R I O D O / Ore 0300 21 Marzo 1945 al Ore 0300 del 22 Marzo 1945.

DISLOCAZIONE:

- Comando 51° Battaglione Genio a (237919)
- Comando 3° Compagnia Artieri a (239919)
- Comando 51° Compagnia Artieri a (292945)
- 1° plotone 3° Comp. Artieri a (235918)
- 2° plotone 3° Comp. Artieri a (261925)
- 3° plotone 3° Comp. Artieri a (261925)
- 1° plotone 51° Comp. Artieri a (277927)
- 2° plotone 51° Comp. Artieri a (273927)
- 3° plotone 51° Comp. Artieri a (292945).

ATTIVITA' OPERATIVA:

- 51° Compagnia Artieri - Il primo plotone ha continuato i lavori di trasformazione in camionabile della pista da quota 349 (275930) a (275932) eseguendo lavori in roccia con impiego di motocompressore. - Il secondo plotone ha eseguito lavori di movimento di terra sulla pista aperta nel giorno 20 da (272926) a quota 349 (275930) con l'impiego di Bulldozer per circa due ore; ha effettuato il trasporto di dieci autocarri di ghiaia ha eseguito lavori in roccia con impiego di motocompressore. - Il terzo plotone trasformazione in camionabile della pista da quota 501 (276978) a (276945) - una squadra ha eseguito lavori di manutenzione stradale tra (296932) a (282948); - una squadra ha fatto addestramento sul Water Pointt Americano. -

- 3° Compagnia Artieri - Primo plotone ricognizione delle interruzioni stradali nel settore della compagnia. - Una squadra ha preso in consegna le interruzioni numero 5 e 6. - Secondo plotone ha continuato i lavori di trasformazione in camionabile della pista da (275932) a (273934); ha eseguito lavori in roccia con motocompressore. - Terzo plotone - Una squadra ha eseguito lavori di bonifica da mine nella zona di schieramento del 2° e 4° Gruppo di Artiglieria (271939). - I rimanenti hanno eseguito lavori di trasformazione in camionabile di pista da (273934) a (273936). - Una squadra si è addestrata al Water Point. -

Il COMANDANTE DEL BATTAGLIONE a. f. s.
(Maggiore Enzo Vescozzini)

- Comando 51° Battaglione Genio a (237919)
- Comando 3° Compagnia Artieri a (239919)
- Comando 51° Compagnia Artieri a (292945)
- 1° plotone 3° Comp. Artieri a (235918)
- 2° plotone 3° Comp. Artieri a (261925)
- 3° plotone 3° Comp. Artieri a (261925)
- 1° plotone 51° Comp. Artieri a (277927)
- 2° plotone 51° Comp. Artieri a (273927)
- 3° plotone 51° Comp. Artieri a (292945).

ATTIVITA' OPERATIVA:

- 51° Compagnia Artieri -

Il primo plotone ha continuato i lavori di trasformazione in camionabile della pista da quota 349 (275930) a (275932) eseguendo lavori in roccia con impiego di motocompressore.

Il secondo plotone ha eseguito lavori di movimento di terra sulla pista aperta nel giorno 20 da (272925) a quota 349 (275930) con l'impiego di Bulldozer per circa ore due; ha effettuato il trasporto di dieci autocarri di ghiaia ha eseguito lavori in roccia con impiego di motocompressore.

Il terzo plotone trasformazione in camionabile della pista da quota 501 (276978) a (276946) - una squadra ha eseguito lavori di manutenzione stradale tra (296932) a (282948); - una squadra ha fatto addestramento sul Water Point Americano.

- 3° Compagnia Artieri

Primo plotone ricognizione delle interruzioni stradali nel settore della compagnia. - Una squadra ha preso in consegna le interruzioni numero 5 e 6.

Secondo plotone ha continuato i lavori di trasformazione in camionabile della pista da (275932) a (273934); ha eseguito lavori in roccia con motocompressore.

Terzo plotone - Una squadra ha eseguito lavori di bonifica da mine nella zona di schieramento del 2° e 4° Gruppo di Artiglieria (271939). - I rimanenti hanno eseguito lavori di trasformazione in camionabile di pista da (273934) a (273936). - Una squadra si è addestrata al Water Point.

Il COMANDANTE DEL BATTAGLIONE -
(Maggiore Enzo Vescovini)

Subject Engr Works and Situation Reports

52 British Liaison Unit
CMT

RE/04/4/2

21 MAR 45

(2)

HQ Legnano Combat Group

The Corps Engr at HQ II US Corps requires Daily Works Reports, to reach Corps HQ not later than 1000hrs each morning (i.e. Report for preceding 24hrs).

Will you please therefore, issue the necessary instructions to Comd 51 Engineer Bn to ensure that the Report reaches Corps HQ by the time stated.

CID/aa

C.D.
Captain
S.O.R.E.

Copy to :- Comd 51 Engr Bn (reference conversation Lieut Col Holley-Major Vescovini - Capt Davies)

6205

Subject :- Engineer Sitreps (Situation Reports)

52 British Liaison Unit
CMF

19 Mar 45

RE/04/4/1

Comd 51 Engr Bn,
LEGNANO COMBAT GROUP.

Reference conversation (Major Vescovini - Lt Col Holley - Capt Davies) of 18 Mar 45.

Forwarded herewith are copies of US II Corps Memorandum on Engineer Situation Reports, and of sample Sit.Reps. made by Divisional Engr, 91st US Div for (a) Forwarding to Division, and (b) forwarding to Corps.

Will you please return them to me as soon as possible.

CID/aa


Captain
S.O.R.E.

6204

0 2 2 0
