

ACC

10000 | 120 | 4161

G.M. 105

July 1961

10000 | 120 | 4161

G.M. 105

Repairs ETC. Piazza Colonna, 365

July 1946 - Aug. 1946

1895
1952

Subject: - MAINTENANCE REPAIRS.

8 British Liaison Unit,
C.M.F.
Tel. Rome - 843140.
5/9

24 August 1946.

10

To :- 8 Direzione Lavori e Servizi Genio.

8.p.c. 8 Territorial Command.

365 Piazza Colonna.

Approval has been received for the execution of work to the estimated value of 950,000 lire on the above named building.

The estimate submitted by you is returned with the request that work be completed as soon as possible.

HP/eg.

H. J. O. Prinsloo, Major. (RA).
D.A.A. & Q.M.G.

1952

Oggetto:- Riparazioni di Manutenzione.

8 British Liason Unit,
C.M.F.
Tel. Rome - 843140.
56/Q

24 Agosto 1946.

Per :- 8 Direzione Lavori e Servizi Genio.
e.p.c. 8 Comando Territoriale.

365 Piazza Colonna.

E' stata ricevuta l'approvazione per l'esecuzione dei lavori per il valore preventivato di lire 950,000 sul palazzo di cui sopra.

Il preventivo da Voi presentato viene restituito richiedendo che i lavori siano completati al piu presto possibile.

HP/eg.


H.J.O. PRINSLOO, Major. (RA).
D.A.A. & Q.M.G.

1951

8ª Direzione Lavori e Servizi Genio
ROMA

No 27196

di prot.

Roma, li

17 AGO 1946

O G G E T T O : Roma - lavori al fabbricato di
Piazza Colonna 365

All' 8º E. L. U.

presso il Comando Territoriale Militare
R O M A

Un funzionario di questa Direzione ieri 16 corr. è stato invitato dal Colonnello Glasscock del 2621 Graves Registration Unit a procedere ad un sopralluogo nel fabbricato di Piazza Colonna per la compilazione di un preventivo dei lavori occorrenti per la sistemazione e completamento del fabbricato in oggetto e sottoporlo per l'approvazione a codesto Comando.

Per la compilazione del preventivo in parola sono stati considerati soltanto i lavori strettamente indispensabili, adottando così il criterio della massima economia, per cui l'ammontare globale è risultato di £ 2.000.000,00.

I lavori preventivati consistono:

- 1 - pulizia di tutti i pavimenti;
- 2 - tinteggiature, coloriture e riprese varie d'intonaci nei vari piani;
- 3 - sistemazione di tutti gl'infissi con costruzione di quelli mancanti;
- 4 - sostituzione dei vetri rotti;
- 5 - sistemazione degli impianti;
- 6 - completamento dell'impianto elettrico;
- 7 - revisione di tutto l'impianto idrico, con im-

./.

pianto di caldaia per alimentazione dell'acqua calda delle doccie e lavandini in cucina.

I lavori sono stati indicati sopralluogo dal prefato Ufficiale.

Poichè l'esecuzione dei lavori nell'immobile è stata limitata dalle Autorità Alleate, questa Direzione non può aderire alla richiesta.




Per ordine dello stesso Ufficiale viene però trasmessa l'unità proposta e si resta in attesa delle decisioni.



IL COLONNELLO DIRETTORE
(R. Barela)

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.

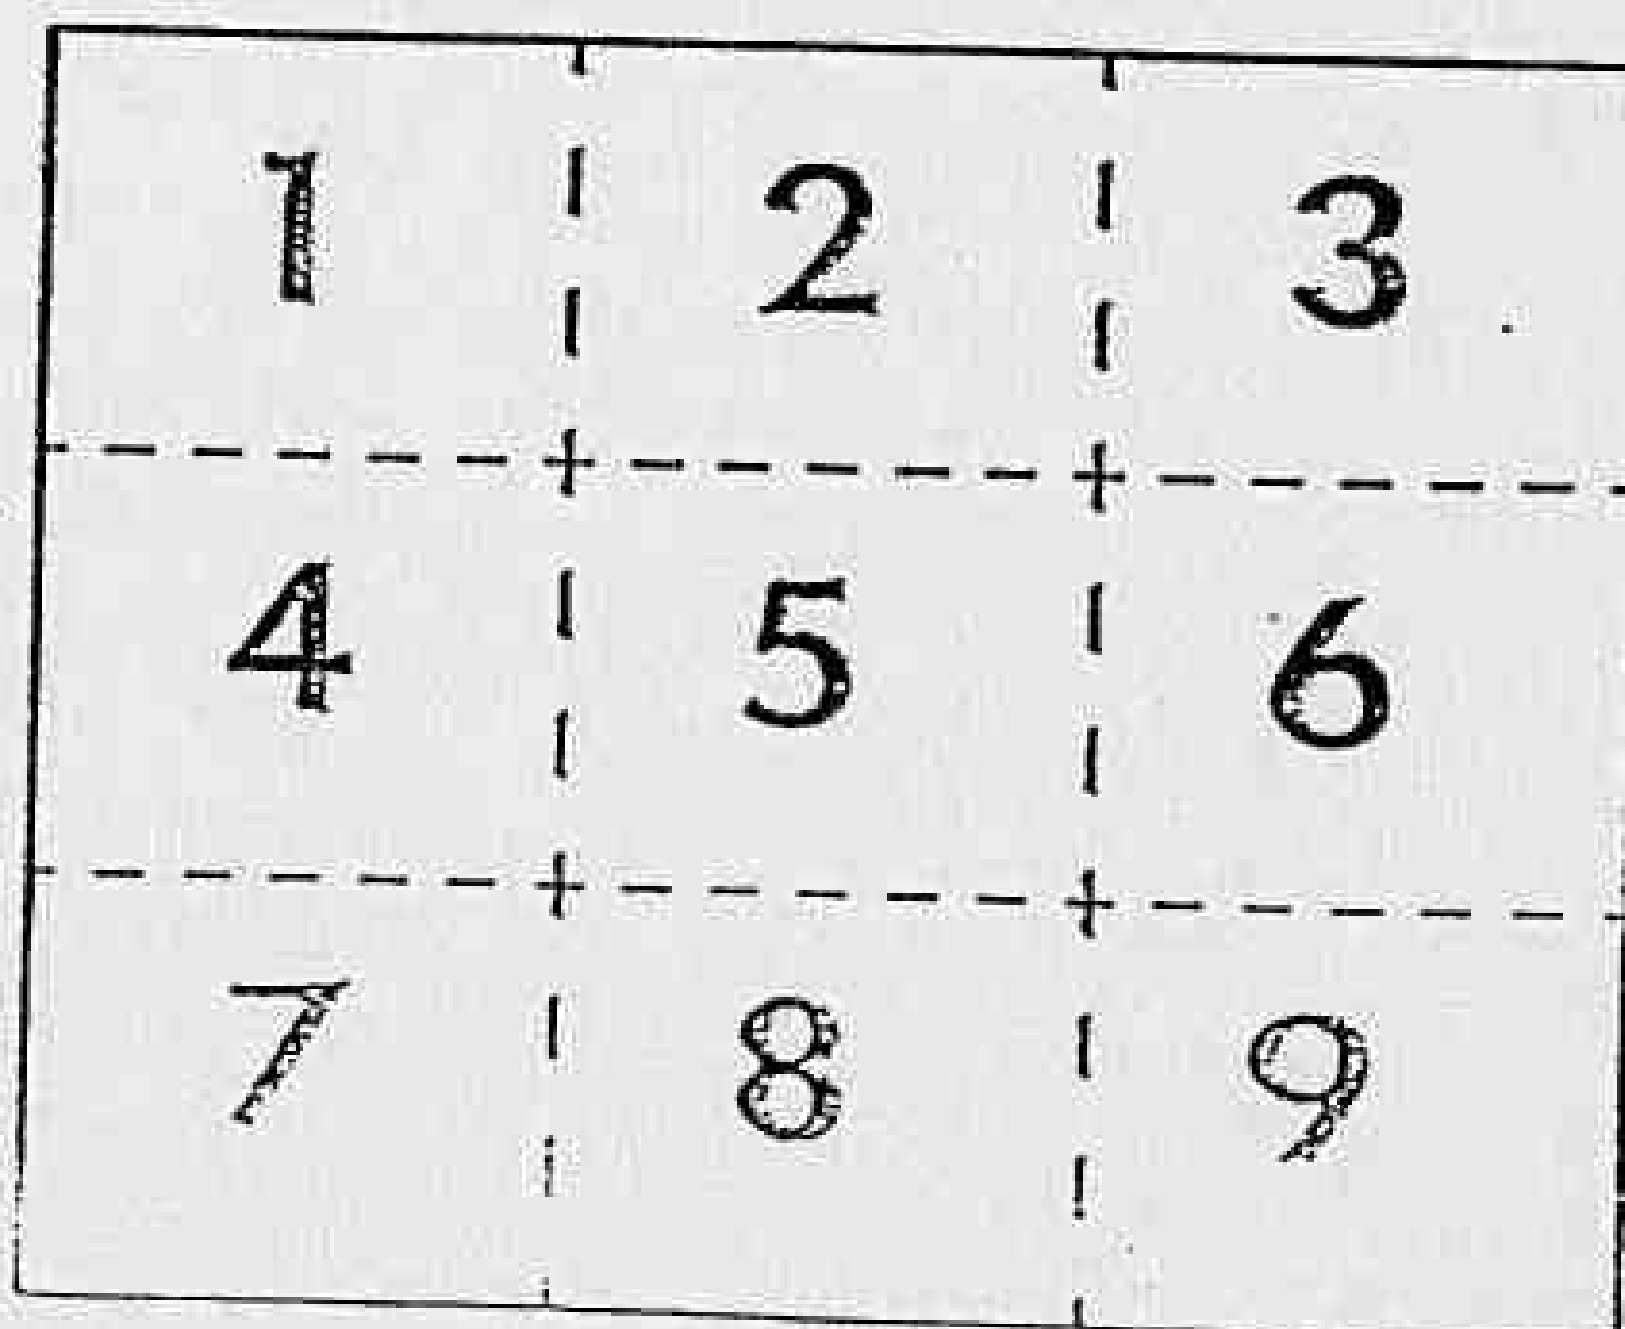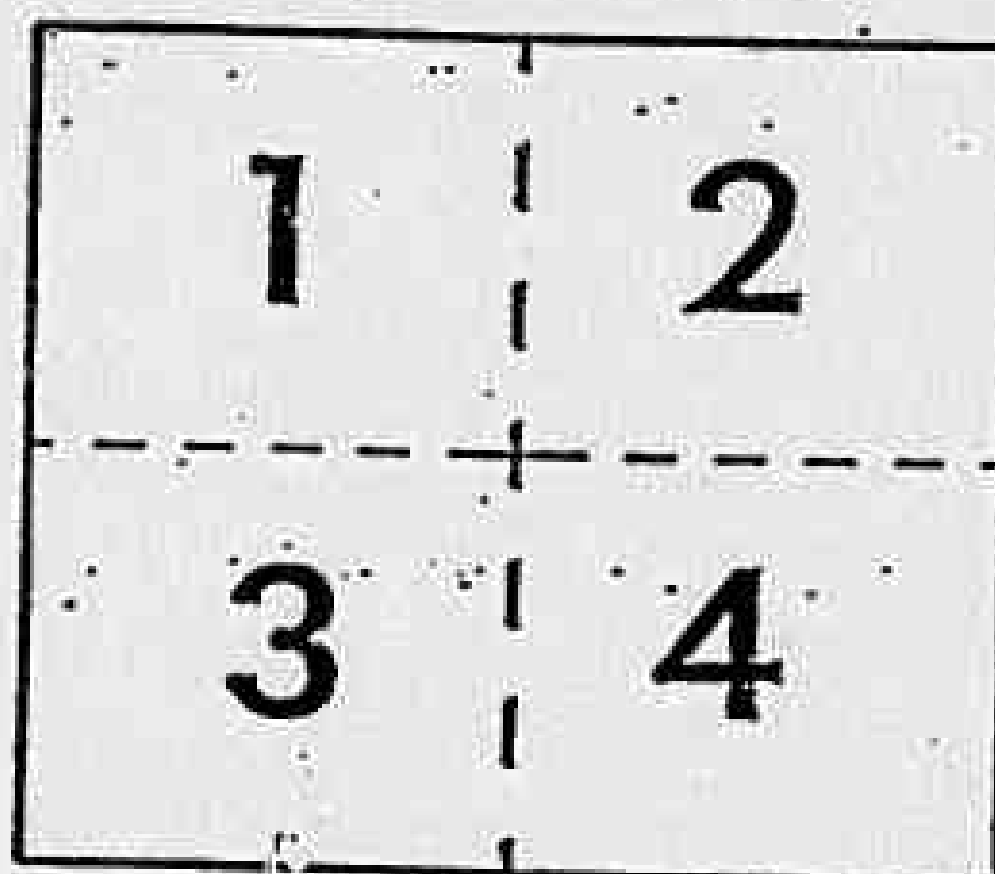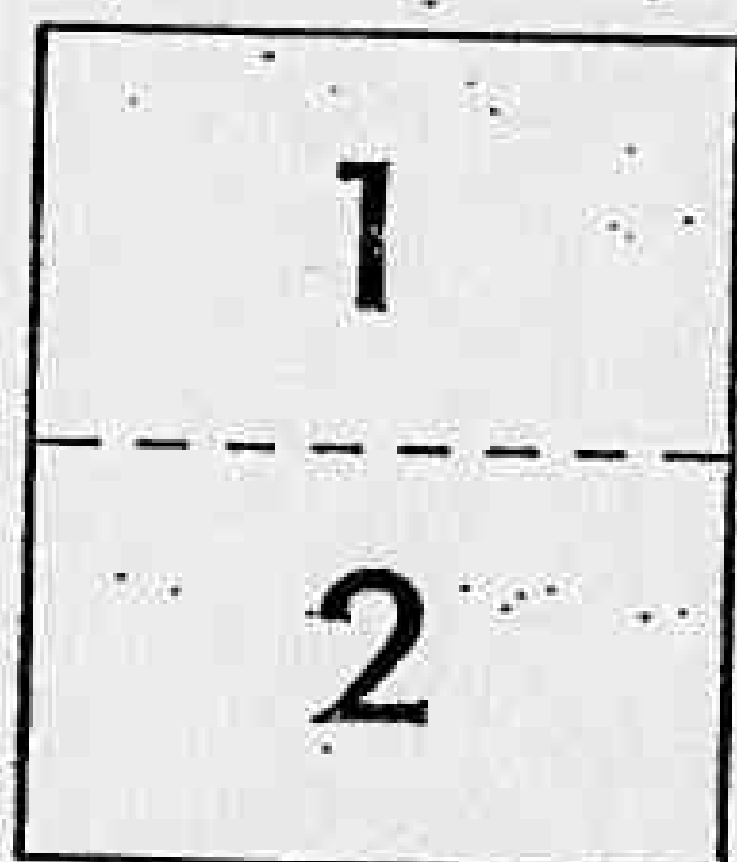

PREVENTIVO DEI LAVORI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO EL FABBRICATO
DELLA STAMPA IN PIAZZA BOLOGNA.

..==..==..==..==..==..

I - 3	Falegname per riparazione infissi	ore 80	68	5.440
2 - 4	Aiuto carpentiere aiuto falegname in aiuto	" 80	67	5.360
3 - 23	Manovale in recinto al muratore	" 60	60	3.600
4 - 35	Muratore per riprese varie di intonaco e pavimen- ti	" 60	65	3.900
5 - 38	Pittore di I ^a categoria per riprese varie di tinteggiature e co- loriture	" 100	70	7.000
6 - 949	Compensato di noce nostrale spessore da mm. 4 a 20 per riprese pareti e pannelli alle porte	mq. 25	600	15.000
7 - 566	Lastre di vetro semplici del semiperime- tro da cm. 71 a 90 in sostituzione di quelli mancanti	" 13	1150	14.950
8 - 567	Lastre di vetro semplici del semiperi- metro da cm. 91 a 110 in sostituzione di quelli mancanti	" 10	1200	12.000
9 - 568	Lastre di vetro semplici del semiperi- metro da cm. 111 a 135 in sostituzione di quelli mancanti	" 18	1250	22.500
10 - 569	Idem c.s. da cm. 136 a 170 in sostituzione di quelli rotti	" 20	1300	46.000
11 - 570	Aumento per ogni 20 cm. oltre il semipe- rimetro di cm. 170 delle lastre di ve- tro semplice quelle mancanti	" 25	60	1.500
12 - 575	Lastre di vetro rigato da copertura in sostituzione di quelli mancanti	" 5	2000	10.000
13 - 576	Lastre di vetro stampato in sostituzione di quelli mancanti	" 10	2800	28.000

1950

I - 3	Falegname per riparazione infissi	ore 80	68	5.440
2 - 4	Aiuto carpentiere aiuto falegname in aiuto	" 80	67	5.360
3 - 23	Manovale in recinto al muratore	" 60	60	3.600
4 - 35	Muratore per riprese varie di intonaco e pavimenti	" 60	65	3.900
5 - 38	Pittore di I ^a categoria per riprese varie di tinteggiature e coloriture	" 100	70	7.000
6 - 949	Compensato di noce nostrale spessore da mm. 4 a 20 per riprese pareti e pannelli alle porte	mq. 25	600	15.000
7 - 566	Lastre di vetro semplici del semiperimetro da cm. 71 a 90 in sostituzione di quelli mancanti	" 13	1150	14.950
8 - 567	Lastre di vetro semplici del semiperimetro da cm. 91 a 110 in sostituzione di quelli mancanti	" 10	1200	12.000
9 - 568	Lastre di vetro semplici del semiperimetro da cm. 111 a 135 in sostituzione di quelli mancanti	" 18	1250	22.500
10 - 569	Idem c.s. da cm. 136 a 170 in sostituzione di quelli rotti	" 20	1300	46.000
11 - 570	Aumento per ogni 20 cm. oltre il semiperimetro di cm. 170 delle lastre di vetro semplice quelle mancanti	" 25	60	1.500
12 - 575	Lastre di vetro rigato da copertura in sostituzione di quelli mancanti	" 5	2000	10.000
13 - 576	Lastre di vetro stampato in sostituzione di quelli mancanti	" 10	2800	28.000
14 - 823	Demolizione di impianti per ricostruzione pavimenti deteriorati	" 125	30	4.500
15 - 833	Raschiatura di pareti per tinteggiare le pareti	" 5000	4	20.000
16 - 837	Rimozione d'opere di pietra da taglio in lastre a riportare			

1950

	riporto				
	per sostituire quelle rotte	mq. 10	170	1.700	
17-864	Spicconatura di intonaci per ricostruire quelli salnitri e cadenti	" 300	15	4.500	
18-865	Spurgo di fogn. o chievichette grandi per quelle otturate	ml. 50	80	4.000	
19-866	Idem c.s. mezzane per quelle otturate	" 60	55	3.300	
20-867	Idem c.s. piccole per quelle otturate	" 80	40	3.200	
21-869	Spurgo, sturatura, pulitura di sifoni, chiusini, bocchettoni, pozzetti ecc. di qualsiasi materiale e dimensione	H. 70	90	6.300	
22-870	Spurgo di vasi da cesso di qualsiasi tipo	" 40	110	4.400	
23-871	Spurgo di colonne di latrine di qualsiasi diametro	ml. 200	65	13.000	
24-872	Pulizia di canna fumaria	" 60	27	1.620	
25-904	Trasporto di terra e materiali con recipienti a spalla d'uomo	mc. 15	160	2.400	
26-906	Trasporto con qualunque mezzo di terra e materiali alle pubbliche discariche distante fino a km.6	" 15	935	5.025	
27-927	Gettata all'asciutto di calcestruzzo ordinario di cretoni di pozzolana per risotruzione pavimento deteriorato	" 10	1350	13.500	
28-1011	Chievichette coperte piccole	ml. 21	560	11.760	
29-1051	Risarcimento di lesioni in battuto di asfalto - per riparazione terrazzo	" 100	40	4.000	
30-1067	Pulitura di pietre e marmi e qualsiasi specie	mq. 100	50	5.000	
31-1081	Gradini di marmo ricavati dalla lastra dello spessore di cm.3	" 10	1900	19.000	
32-1084	Pavimenti, rivestimento di muri, soglie lisce, lastre di marmo, orinatoi, frontoni, sottogradi, zoccolo con qualche battente, con foro, in camerazioni, smussi arrotondamento di ciglio ecc. in lastre dello spessore di c.2 con tutte le facce vi				

21.000

1400

15

20-867	Idem c.s. piccole per quelle otturate	"	80	40	3.200
21-869	Spurgo, sturettura, pulitura di sifoni, chiusini, bocchettoni, pozzetti ecc. di qualsiasi materiale e dimensione	m.	70	90	6.300
22-870	Spurgo di vasi da cesso di qualsiasi ti- po	"	40	110	4.400
23-871	Spurgo di colonne di latrine di qualsia- si diametro	ml.	200	65	13.000
24-872	Pulizia di canna fumaria	"	60	27	1.620
25-904	Trasporto di terra e materiali con reci- pienti a spalla d'uomo	mc.	15	160	2.400
26-906	Trasporto con qualunque mezzo di terra e materiali alle pubbliche discariche distante fino a km.6	"	15	935	5.025
27-927	Gettata all'asciutto di calcestruzzo or- dinario di cretoni di pozzolana per risotruzione pavimento deteriorato	"	10	1350	13.500
28-1011	Chiavichette coperte piccole	ml.	21	560	11.760
29-1051	Risarcimento di lesioni in battuto di asfalto - per riparazione terrazzo	"	100	40	4.000
30-1067	Pulitura di pietre e marmi e qualsiasi specie	mq.	100	50	5.000
31-1081	Gradini di marmo ricavati dalla lastra dello spessore di cm.3	"	10	1900	19.000
32-1084	Pavimenti, rivestimento di muri, soglie lisce, lastre di marmo, orinatoi, frontoni, sottogradi, zoccolo con qualche battente, con foro, in camerazioni, smussi approton- damento di ciglio ecc. in lastre dello spessore di cm.2 con tutte le facce vi- ste ruotate e pomiciate	"	15	1400	21.000
33-1087	Soglie di marmo di finestra ad un bat- tente dello spessore di cm.3	"	6	1850	11.100
34-1089	Idem c.s. a due battenti dello spessore di cm.3	"	7	2000	14.000
a riportare					348.555

348.555

riporto

35-1092	Ardesia di lavagne in lastre grosse mm. 10 per copertura di cornici tettoie ecc.	mq.	10 a 400-	4.000,-
36-1101	Intonaco di malta idraulica su superfici piane ocure	"	300 " " 110	33.000
37-1161	Cappa grossa cm. 2 anche bocciardata e riquadrata	"	80 " " 145	11.600
38-1176	Impiantito di campigiane arrostate da terrazzo	"	40 " " 285	11.400
39-1164	Battuto di asfalto naturale per pavimenti o terrazzi della grossezza di mm. 15	"	40 " " 410	16.400
40-1180	Impiantito di marmette a mosaico alla veneziana ad un colore	"	100 " " 620	62.000
41-1197	Impianto di tavolette di rovere o faggio	"	80 " " 800	64.000
42-1217	Surrogazione di tavolette di faggio o rovere	N°	200 " " 50	10.000
43-1203	Rivestimento di muri con mattonelle di maiolica di 1° scelta	mq.	80 " " 1350	108.000
44-1220	Lavatura e pulitura di pavimenti di qualsiasi specie con sabbia e segatura	"	1800 " " 10	18.000
45-1221	Raschiatura e pulitura impiantito di legno	"	1000 " " 36	36.000
46-1359	Imposte di porte con specchi lisci di tavole di abete grosse cm. 5	"	20 " " 2520	50.400
47-1386	Invetriate o sportelli a vetri di finestre di tavole di abete grosse cm. 5,5 scornielate	"	10 " " 3300	33.000
48-1516	Rimessa in sesto d'imposte di porte e finestre ad una o più partite del tipo mezzano	N°	50 " " 325	16.250
49-1517	Idem idem piccole	"	60 " " 235	14.100
50-1518	Rimessa in sesto di persiane complete	"	40 " " 380	15.200
51-1564	Tavolette da latrina di faggio con coperchio	"	15 " " 685	10.275
52-1609	Chiavini inodori di ghisa circolari			

1949

38-1176	e riquadrata	"	80	"	"	145	11.600
39-1164	Impiantato di campigiane arrostate da terrazzo	"	40	"	"	285	11.400
40-1180	Battuto di asfalto naturale per pa- vimenti o terrazzi della grossezza di mm. 15	"	40	"	"	410	16.400
41-1197	Impiantito di marmette a mosaico alla veneziana ad un colore	"	100	"	"	620	62.000
42-1217	Impianto di tavolette di rovere o fag- gio	"	80	"	"	800	64.000
43-1203	Surrogazione di tavolette di faggio o rovere	N°	200	"	"	50	10.000
44-1220	Rivestimento di muri con mattonelle di maiolica di l. scelta	mq.	80	"	"	1350	108.000
45-1221	Lavatura e pulitura di pavimenti di qualsiasi specie con sabbia e sega)	"	1800	"	"	10	18.000
46-1359	Raschiatura e pulitura impiantito di legno	"	1000	"	"	36	36.000
47-1386	Imposte di porte con specchi lisci di tavole di abete grosse cm. 5	"	20	"	"	2520	50.400
48-1516	Invetrate o sportelli a vetri di finestre di tavole di abete grosse cm. 5,5 scorniciate	"	10	"	"	3300	33.000
49-1517	Rimessa in sesto d'imposte di porte e finestre ad una o più partite del tipo mezzano	N°	50	"	"	325	16.250
50-1518	Idem idem piccole	"	60	"	"	235	14.100
51-1564	Rimessa in sesto di persiane com- plete	"	40	"	"	380	15.200
52-1609	Tavolette da latrina di faggio con coperchio	"	15	"	"	685	10.275
53-1611	Chiusini inodori di ghisa circolari o quadrati	Kg.	30	"	"	80	2.400
	Cassette scaricatrici di ghisa	N°	5	"	"	1170	5.850,
A Riportare							870.330

1949

		Kg.	a	Riparto	£
54-1621	Tubi di ghiera diritti per grondaie e latrine	00	76		870.330
55-1632	Cerniere a biacca od in grossezza con ghiande e d anelli di ottone di lama alta ad cm. 13 a 16	N° 120	" 60		" 6.080
56-1637	Catenacci per portoni e portoncina d'ingresso	Kg. 40	" 145		" 7.200
57-1640	Mollette con pomello di ottone e nasetto per controportelli	N° 200	" 60		" 5.800
58-1394	Mostre semplici di porte e finestre di abete grosse cm. 2 larghe cm. 4 a 6	ml. 200	" 98.		" 12.000
59-1649	Manopole di ottone per bussola montate su rosetta	N° 40	" 122		" 19.600
60-1650	Idem idem montate su piastre stampate	" 20	" 153		" 4.880
61-1652	Manopole di anticorodal	" 30	" 100		" 3.060
62-1658	Serratura a colpo e mandata in grossezza, allungata in senso verticale	" 30	" 415		" 3.000
63-1659	Serratura a colpo, e mandata a casetta ordinaria	" 20	" 440		" 12.450
64-1666	Serratura di sicurezza tipo Iale	" 5	" 1630		" 8.800
65-1738	Posizione in opera di lastre di vetro comuni	mq. 76	" 90		" 8.150
66-1743	Imbiancatura preparatoria con latte di calce dato col pennello su pareti e soffitti di ambienti alti fino a ml. 5	" 5000	" 3		" 6.840
67-1745	Tinteggiatura con latte di calce data col pennello a fine strati su pareti e soffitti alti sino a ml. 5	" 5000	" 9		" 15.000
68-1747	Strato eseguito in più del secondo con latte di calce dato con qualsiasi mezzo in ambienti interni alti sino a ml. 5	" 1000	" 4		" 45.000
69-1752	Fissaggio di tinteggiatura con colla di coniglio data con pompa	" 5000	" 3		" 4.000
70-1756	Tinteggiatura a tempera suintonaci verticali od orizzontali o su carta				" 15.000

Riparto £ 1.093.390

72-1763 Coloritura ad olio e bianco di zinco con colori ordinari a due strati sopra legnami o ferrementa mq. 300 a £ 145 " 43.500

73- " Sistemazione e completamento dell'impianto elettrico nello scantinato, secondo, terzo e quarto piano e scale 350.000

74- " Sistemazione e completamento dell'impianto idrico con impianto dell'acqua calda per alimentazione delle docce e lavatoi in cucina, impianto dei lavabi mancanti nei gabinetti dei vari piani 450.000

£ 1.936.890
" 63.110

per arrotondamento

£ 2.000.000

AMMONTARE TOTALE

=====



	riporto				348.555
35-1092	Ardesia di lavagna in lastre grosse mm. 10 per copertura di cornici tettoie ecc.	mq.	10 a. e.	400-	4.000,
36-1101	Intonaco di malta idraulica su superfici piane ocure	"	300	" "	110 33.000
37-1161	Cappa grossa cm. 2 anche toccardata e riquadrata	"	80	" "	145 11.600
38-1176	Impiantato di campigiane arrotondate da terrazzo	"	40	" "	285 11.400
39-1164	Battuto di asfalto naturale per pavimenti o terrazzi della grossezza di mm. 15	"	40	" "	410 16.400
40-1180	Impiantito di marmette a mosaico alla veneziana ad un colore	"	100	" "	620 62.000
41-1197	Impianto di tavolette di rovere o faggio	"	80	" "	800 64.000
42-1217	Surrogazione di tavolette di faggio o rovere	N°	200	" "	50 10.000
43-1203	Rivestimento di muri con mattonelle di maiolica di 1° scelta	mq.	80	" "	1350 108.000
44-1220	Lavatura e pulitura di pavimenti di qualsiasi specie con sabbia e segatura	"	1800	" "	10 18.000
45-1221	Raschiatura e pulitura impiantito di legno	"	1000	" "	36 36.000
46-1359	Imposte di porte con specchi lisci di tavole di abete grosse cm. 5	"	20	" "	2520 50.400
47-1386	Invetriate o sportelli a vetri di finestre di tavole di abete grosse cm. 5,5 scorniciate	"	10	" "	3300 33.000
48-1516	Rimessa in sesto d'imposte di porte e finestre ad una o più partite del tipo mezzano	N°	50	" "	325 16.250
49-1517	Idem idem piccole	"	60	" "	235 14.100
50-1518	Rimessa in sesto di persiane complete	"	40	" "	380 15.200
51-1564	Tavolette da latrina di faggio con coperchio	"	15	" "	685 10.275
52-1609	Chiusini inodori di bassa circo ari				

1947

37-1161	Cappa grossa cm. 2 anche lucciardata e riquadrata	"	80	"	"	145	11.600
38-1176	Impiantito di campigiane arrostate da terrazzo	"	40	"	"	285	11.400
39-1164	Battuto di asfalto naturale per pavimenti o terrazzi della grossezza di mm. 15	"	40	"	"	410	16.400
40-1180	Impiantito di marmette a mosaico alla veneziana ad un colore	"	100	"	"	620	62.000
41-1197	Impianto di tavolette di rovere o faggio	"	80	"	"	800	64.000
42-1217	Supporazione di tavolette di faggio o rovere	N°	200	"	"	50	10.000
43-1203	Rivestimento di muri con mattonelle di maiolica di 1° scelta	mq.	80	"	"	1350	108.000
44-1220	Lavatura e pulitura di pavimenti di qualsiasi specie con sabbia e segatura	"	1800	"	"	10	18.000
45-1221	Raschiatura e pulitura impiantito di legno	"	1000	"	"	36	36.000
46-1359	Imposte di porte con specchi lisci di tavole di abete grosse cm. 5	"	20	"	"	2520	50.400
47-1386	Invetrate o sportelli a vetri di finestre di tavole di abete grosse cm. 5,5 scorniciate	"	10	"	"	3300	33.000
48-1516	Rimessa in sesto d'imposte di porte e finestre ad una o più partite del tipo mezzano	N°	50	"	"	325	16.250
49-1517	Idem idem piccole	"	60	"	"	235	14.100
50-1518	Rimessa in sesto di persiane complete	"	40	"	"	380	15.200
51-1564	Tavolette da latrina di faggio con coperchio	"	15	"	"	685	10.275
52-1609	Chiusini inodori di ghisa circo ari o quadrati	Kg.	30	"	"	80	2.400
53-1611	Cassette scaricatrici di ghisa	N°	5	"	"	1170	5.850,
A Riportare							£ 870.330

1947

				Riparto	£ 870.330
+1621	Tubi di ghisa diritti per grondaie e latrine	Kg. 80	a 4	76	" 6.080
55-1632	Cerniere a biella od in grossezza con ghiande e d anelli di ottone di lama alta ad cm. 13 a 16	N° 120	" "	60	" 7.200
56-1637	Catenacci per portoni e portoncina d'ingresso	Kg. 40	" "	145	" 5.800
57-1640	Mollette con pomello di ottone e nasetto per controportelli	N° 200	" "	60	" 12.000
58-1394	Mostre semplici di porte e finestre di abete grosse cm. 2 larghe cm. 4 a 6	ml. 200	" "	98	" 19.600
59-1649	Manopole di ottone per bussola montate su rosetta	N° 40	" "	122	" 4.880
60-1650	Idem idem montate su piastre stampate	" 20	" "	153	" 3.060
61-1652	Manopole di anticorodal	" 30	" "	100	" 3.000
62-1658	Serratura a colpo e mandata in grossezza, allungata in senso verticale	" 30	" "	415	" 12.450
63-1659	Serratura a colpo, e mandata a casetta ordinaria	" 20	" "	440	" 8.800
64-1666	Serratura di sicurezza tipo Iale	" 5	" "	1630	" 8.150
65-1738	Posizione in opera di lastre di vetro comuni	mq. 76	" "	90	" 6.840
66-1743	Imbiancatura preparatoria con late di calce dato col pennello su pareti e soffitti di ambienti alti fino a ml. 5	" 5000	" "	3	" 15.000
67-1745	Tinteggiatura con latte di calce data col pennello a due strati su pareti e soffitti alti sino a ml. 5	" 5000	" "	9	" 45.000
68-1747	Strato eseguito in più del secondo con latte di calce dato con qualsiasi mezzo in ambienti interni alti sino a ml. 5	" 1000	" "	4	" 4.000
69-1752	Fissaggio di tinteggiatura con colla di coniglio data con pompa	" 5000	" "	3	" 15.000
70-1756	Tinteggiatura a tempera su intonaci verticali od orizzontali o su carta				

Riporto £ 1.093.390

72-1763 Coloritura ad olio e bianco di zinco con colori ordinari a due strati sopra legnami o ferramenta mq. 300 a £ 145 " 43.500

73- " Sistemazione e completamento dell'impianto elettrico nello scantinato, secondo, terzo e quarto piano e scale 350.000

74- " Sistemazione e completamento dell'impianto idrico con impianto dell'acqua calda per alimentazione delle docce e lavabi in cucina, impianto dei lavabi mancanti nei gabinetti dei vari piani 450.000

£ 1.936.890
" 63.110
per arrotondamento

AMMONTARE TOTALE £ 2.000.000

0132

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

1945

PREVENTIVO DEI LAVORI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO
DELLA STAMPA IN PIAZZA COZZONNA.

.....

64390
Spt. 6108

I - 3	Palegname per riparazione infissi	ore 80	68	5.440
2 - 4	Aiuto carpentiere aiuto falegname in aiuto	" 80	67	5.360
3 - 23	Manovale in recinto al muratore	" 60	60	3.600
4 - 35	Muratore per riprese varie di intonaco e pavimen- ti	" 60	65	3.900
5 - 38	Pittore di I ^a categoria per riprese varie di tinteggiature e co- loriture	" 100	70	7.000
6 - 949	Compensato di noce nostrale spessore da mm. 4 a 20 per riprese pareti e pannelli alle porte	mq. 25	600	15.000
7 - 566	Lastre di vetro semplici del semiperime- tro da cm. 71 a 90 in sostituzione di quelli mancanti	" 13	1150	14.950
8 - 567	Lastre di vetro semplici del semiperi- metro da cm. 91 a 110 in sostituzione di quelli mancanti	" 10	1200	12.000
9 - 568	Lastre di vetro semplici del semiperi- metro da cm. 111 a 135 in sostituzione di quelli mancanti	" 18	1250	22.500
10 - 569	Idem c.s. da cm. 136 a 170 in sostituzione di quelli rotti	" 20	1300	46.000
11 - 570	Aumento per ogni 20 cm. oltre il semipe- rimetro di cm. 170 delle lastre di ve- tro semplice quelle mancanti	" 25	60	1.500
12 - 575	Lastre di vetro rigato da copertura in sostituzione di quelli mancanti	" 5	2000	10.000
13 - 576	Lastre di vetro stampato in sostituzione di quelli mancanti	" 10	2800	28.000

Σ 1944

I - 3	Falegname per riparazione infissi	ore 80	68	5.440
2 - 4	Aiuto carpentiere aiuto falegname in aiuto	" 80	67	5.360
3 - 23	Manovale in recinto al muratore	" 60	60	3.600
4 - 35	Muratore per riprese varie di intonaco e pavimen- ti	" 60	65	3.900
5 - 38	Pittore di I ^a categoria per riprese varie di tinteggiature e co- loriture	" 100	70	7.000
6 - 949	Compensato di noce nostrale spessore da mm. 4 a 20 per riprese pareti e pannelli alle porte	mq. 25	600	15.000
7 - 566	Lastre di vetro semplici del semiperime- tro da cm. 71 a 90 in sostituzione di quelli mancanti	" 13	1150	14.950
8 - 567	Lastre di vetro semplici del semiperime- tro da cm. 91 a 110 in sostituzione di quelli mancanti	" 10	1200	12.000
9 - 568	Lastre di vetro semplici del semiperime- tro da cm. 111 a 135 in sostituzione di quelli mancanti	" 18	1250	22.500
10 - 569	Idem c.s. da cm. 136 a 170 in sostituzione di quelli rotti	" 20	1300	46.000
11 - 570	Aumento per ogni 20 cm. oltre il semipe- rimetro di cm. 170 delle lastre di ve- tro semplice quelle mancanti	" 25	60	1.500
12 - 575	Lastre di vetro rigato da copertura in sostituzione di quelli mancanti	" 5	2000	10.000
13 - 576	Lastre di vetro stampato in sostituzione di quelli mancanti	" 10	2800	28.000
14 - 823	Demolizione di impianti per ricostruzione pavimenti deteriora- ti	" 125	30	4.500
15 - 833	Raschiatura di pareti per tinteggiare le pareti	" 5000	4	20.000
16 - 837	Rimozione d'opera di pietra da taglio in lastre a riportare			

L. 1944

riporto

	per sostituire quelle tutte	mq. 10	170	1.700
17-864	Spicconatura di intonaci per ricostruire quelli salnitri e cadenti	" 300	15	4.500
18-865	Spurgo di fogna o chiavichette grandi per quelle otturate	ml. 50	80	4.000
19-866	Idem c.s. mezzane per quelle otturate	" 60	55	3.300
20-867	Idem c.s. piccole per quelle otturate	" 30	40	3.200
21-869	Spurgo, sturatura, pulitura di sifoni, chiusini, bocchettoni, pozzetti ecc. di qualsiasi materiale e dimensione	ml. 70	90	6.300
22-870	Spurgo di vasi da cesso di qualsiasi tipo	" 40	110	4.400
23-871	Spurgo di colonne di latrine di qualsiasi diametro	ml. 200	65	13.000
24-872	Pulizia di canna fumaria	" 60	27	1.620
25-904	Trasporto di terra e materiali con recipienti a spalla d'uomo	mc. 15	160	2.400
26-906	Trasporto con qualunque mezzo di terra e materiali alle pubbliche discariche distante fino a km. 6	" 15	935	5.025
27-927	Cattata all'asciutto di calcestruzzo ordinario di cretoni di pozzolana per risotruzione pavimento deteriorato	" 10	1350	13.500
28-1011	Chiavichette coperte piccole	ml. 21	560	11.760
29-1051	Risarcimento di lesioni in battuto di asfalto - per riparazione terrazzo	" 100	40	4.000
30-1067	Puliture di pietra e marmi e qualsiasi specie	mq. 100	50	5.000
31-1081	Gradini di marmo ricavati dalla lastra dello spessore di cm. 3	" 10	1900	19.000
32-1084	Pavimenti, rivestimento di muri, soglie lisce, lastre di marmo, orinatoi, frontoni, sottogradi, zoccolo con qualche battente, con foro, in camerazioni, smussi arrotondamento di ciglio ecc. in lastre dello spessore di c. 2 con tutte le facce viste ruotate e pomiciate	" 15	1400	21.000

19-866	Idem c.s. mezzane per quelle otturate	"	60	55	3.300
20-867	Idem c.s. piccole per quelle otturate	"	80	40	3.200
21-869	Spurgo, sturatura, puliture di sifoni, chiusini, bocchettoni, pozzetti ecc. di qualsiasi materiale e dimensione	ml.	70	90	6.300
22-870	Spurgo di vasi da cesso di qualsiasi ti- po	"	40	110	4.400
23-871	Spurgo di colonne di latrine di qualsiasi si diametro	ml.	200	65	13.000
24-872	Pulizia di canna fumaria	"	60	27	1.620
25-904	Trasporto di terra e materiali con reci- pienti a spalla d'uomo	mc.	15	160	2.400
26-906	Trasporto con qualunque mezzo di terra e materiali alle pubbliche discariche distante fino a km.6	"	15	935	5.025
27-927	Cettata all'asciutto di calcestruzzo or- dinario di cretoni di pozzolana per ricostruzione pavimento deteriorato	"	10	1350	13.500
28-1011	Chiavichette coperte piccole	ml.	21	560	11.760
29-1051	Risarcimento di lesioni in battuto di asfalto - per riparazione terrazzo	"	100	40	4.000
30-1067	Puliture di pietre e marmi e qualsiasi specie	mq.	100	50	5.000
31-1081	Gradini di marmo ricavati dalla lastra dello spessore di cm.3	"	10	1900	19.000
32-1084	Pavimenti, rivestimento di muri, soglie lisce, lastre di marmo, orinatoi, frontoni, sottogradi, zoccolo con qualche battente, con foro, in camerazioni, smussi arroton- damento di ciglio ecc. in lastre dello spessore di c. 2 con tutte le facce vi- ste ruotate e pomciate	"	15	1400	21.000
33-1087	Soglie di marmo di finestra ad un bat- tente dello spessore di cm.3	"	6	1850	11.100
34-1089	Idem c/s. a due battenti dello spessore di cm.3	"	7	2000	14.000
a riportare					348.555

8 Direzione Lavori e Servizi Genio
ROMA

No. 27196 di prot.

Rome, 17th August 1946

SUBJECT: Rome- works on the building of Piazza Colonna 365.

TO : 8 B.L.U. c/o Comando Territoriale Militare.
ROME.

A functionary of this Direction has been sent yesterday, the 16th of this month, by Col. Glascock of the 2621 Graves Registration Unit, to make an inspection of the building of Piazza Colonna to estimate the cost of the works needed for the repair and finishing of the above mentioned building and to present the estimate to the approval of this Command. Drawing up the mentioned estimate there have been considered only the strictly necessary works, adopting thus a directive of utmost economy, according to which the total amount results Lire 2.000.000.00

The estimated works are:

- 1.- Cleaning of all floors;
- 2.- Coloring, painting and various repairs of the walls of the various floors;
- 3.- Repair of all the fixtures and construction of all those lacking;
- 4.- Substitution of broken glasses;
- 5.- repair of the floors;
- 6.- Completion of the electric installations;
- 7.- Control of the whole hydraulic installation, with construction of a boiler to give warm water to the showers and to the kitchen.

The works have been indicated on the spot by the above mentioned Officer.

As the execution of the works in the building has been limited by the Allied Authorities, this Direction can not grant the request.

According to an order of the same Officer the enclosed proposal is transmitted and decisions re awaited.

THE COLONEL DIRECTING
(R. Barella)

■ 1943

ESTIMATE OF THE WORKS NEEDED FOR THE COMPLETION OF THE PRESS BUILDING
IN PIAZZA COLONNA.

1 - 3	Carpenter to repair fixtures	Hrs. 80	68	5.440
2 - 4	Helping carpenter helping joiner	" 80	67	5.360
3 - 23	Mason's labourer	" 60	60	3.600
4 - 35	Mason to repair walls and floors	" 60	65	3.900
X 5 - 38	1st Class painter to paint and color	" 100	70	7.000
X 6 - 949	Compensated nutwood from 4mm to 20mm thick, to repair walls and doors	m2 25	600	15.000
7 - 566	Simple glass panes with a semiperimeter from cm. 71 to 90, in substitution of those lacking	" 13	1150	14.950
8 - 567	Simple glass panes with a semiperimeter from cm. 91 to 110, in substitution of those lacking	" 10	1200	12.000
9 - 568	Simple glass panes with a semiperimeter from cm. 111 to 135, in substitution of those lacking	" 13	1250	22.500
X 10 - 569	As above from cm. 136 to 170 in substitution of those broken	" 20	1300	46.000
11 - 570	Augment for each 20 cm. over the semiperimeter of cm. 170 of the simple glass windowpanes those lacking	" 25	60	1.500
X 12 - 575	Panes of striped glass in substitution of those lacking	" 5	2000	10.000
X 13 - 576	Panes of printed glass in substitution of those lacking	" 10	2900	29.000
14 - 823	Demolition of deteriorated floors for reconstruction	" 125	30	4.500
X 15 - 833	Scratching of walls to color them	" 5000	4	20.000
16 - 837	Removal of hard stones to substitute those broken	" 10	170	1.700
17 - 864	Removal of plasters for reconstruction of those deteriorated	" 300	15	4.500

	sq	25	600	15,000
7 - 566 Simple glass panes with a semiperimeter from cm. 71 to 90, in substitution of those lacking	"	13	1150	14,950
8 - 567 Simple glass panes with a semiperimeter from cm. 91 to 110, in substitution of those lacking	"	10	1200	12,000
9 - 568 Simple glass panes with a semiperimeter from cm. 111 to 135, in substitution of those lacking	"	18	1250	22,500
X 10 - 569 As above from cm. 136 to 170 in substitution of those broken	"	20	1300	46,000
11 - 570 Augment for each 20 cm. over the semiperimeter of cm. 170 of the simple glass windowpanes those lacking	"	25	60	1,500
X 12 - 575 Panes of striped glass in substitution of those lacking	"	5	2000	10,000
X 13 - 576 Panes of printed glass in substitution of those lacking	"	10	2800	28,000
14 - 823 Demolition of deteriorated floors for reconstruction	"	125	30	4,500
X 15 - 833 Scratching of walls to color them	"	5000	4	20,000
16 - 837 Removal of hard stones to substitute those broken	"	10	170	1,700
17 - 864 Removal of plasters for reconstruction of those deteriorated	"	300	15	4,500
18 - 865 Cleaning of drains or large sewers for those obstructed	ml	50	80	4,000
19 - 866 Same for those of middle size	"	60	55	1,922
20 - 867 Same for small ones	"	80	40	3,200
21 - 869 Opening, removing obstructions, leaning of siphons and so on of any material and dimensions	n.	70	90	6,300

22 -	870	Removal of obstructions in latrines of any type	n.	40	110	4.400
23 -	871	Removal of obstruction in tubes of latrines of any type	ml.	200	65	13.000
24 -	872	Cleaning of smoke pipe	"	60	27	1.620
25 -	904	Transport of earth and materials in containers on the shoulders	mc.	15	160	2.400
26 -	906	Transport of earth and materials with any means to the public unloadings at a distance of 6 km.	"	15	935	5.025
27 -	927	Dry throwing of simple cement for reconstruction of deteriorated floors	"	10	1350	13.500
28 -	1011	Small covered sewers	ml.	21	550	11.750
29 -	1051	Repayment of damage of asphalt for reparation of terrace	"	100	40	4.000
30 -	1067	Cleaning of stones and marbles of any type	mq.	100	50	5.000
X 31 -	1081	Marble steps obtained from a pane 3 cm. thick	"	10	1900	19.000
X 32 -	1084	Floors, wallpapers, levigated door-steps, marble panes, latrines, gables, and so on	"	15	1400	21.000
X 33 -	1087	Marble thresh-holds on the windows 3 cm. thick	"	6	1850	11.100
X 34 -	1089	As above; on two sides 3 cm. thick	"	7	2000	14.000
total to be summed						348.555
35 -	1092	Slates in 10 mm. thick plates to cover roofs and so on.	mq.	10	400	4.000
X 36 -	1101	Plaster of hydraulic mortar on horizontal or slanted surfaces	"	300	110	33.000
37 -	1161	2 cm. thick cowl also squared	"	80	145	11.600
38 -	1176	Floor with terrace stones	"	40	285	11.400
39 -	1164	Natural asphalt for floors or				1941

		15	935	5.025
27 - 927	Dry throwing of simple cement for reconstruction of deteriorated floors	10	1350	13.500
28 - 1011	Small covered sewers	24	560	11.760
29 - 1051	Repayment of damage of asphalt for reparation of terrace	100	40	4.000
30 - 1067	Cleesing of stones and marbles of any type	100	50	5.000
X 31 - 1081	Marble steps obtained from a pane 3 cm. thick	10	1900	19.000
X 32 - 1084	Floors, wallpapers, levigated door-steps, marble panes, latrines, gables, and so on	15	1400	21.000
X 33 - 1087	Marble thresh-holds on the windows 3 cm. thick	6	1850	11.100
X 34 - 1089	As above; on two sides 3 cm. thick	7	2000	14.000
	total to be summed			348.555
35 - 1092	Slates in 10 mm. thick plates to cover roofs and so on.	10	400	4.000
X 36 - 1101	Plaster of hydraulic mortar on horizontal or slanted surfaces	300	110	33.000
37 - 1161	2 cm. thick cowl also squared	30	145	11.600
38 - 1176	Floor with terrace stones	40	285	11.400
39 - 1164	Natural asphalt for floors or terraces 15 mm. thick	40	410	16.400
X 40 - 1180	Mosaic floor in Venetian style in one color	100	620	62.000
X 41 - 1197	Installment of common oak or beechtree-wood panes	30	800	64.000
X 42 - 1217	Subrogation of the common oak or beechtree-wood panes	200	50	10.000
X 43 - 1203	Dressing the walls with earthenware tiles of 1st choosing	80	1350	108.000

1941

* 44 - 1220 Washing and cleaning of floors of any type with sand and sawdust	1800	10	18.000
* 45 - 1221 Scraping and cleaning of wooden floors	1000	36	36.000
46 - 1359 Doors with smooth pinewood panes 5 cm. thick	20	2520	50.400
47 - 1386 Windowpanes or glassdoors with pinewood panes 5,5 cm. thick	10	3300	33.000
48 - 1516 Repairing of window and door shutters of the middle type	50	325	16.250
49 - 1517 Same same small	60	235	14.100
50 - 1518 Repairing of complete window-sashes	40	380	15.200
51 - 1564 Beech-tree panes for latrine shutters	15	685	10.275
52 - 1609 Round or square scentless hids	30	80	2.400
53 - 1611 Iron boxes for the water	5	1170	<u>5.850</u>
Total			870.330
54 - 1621 Straight iron tubes for gutters and latrines	80	76	6.080
55 - 1632 Hinges with wedge or with brass rings with a 13 to 16 cm. high blade	120	60	7.200
56 - 1637 Bolts for big and small entan-ces	40	145	5.800
57 - 1640 Small springs with brass top and nose for double doors	200	60	12.000
58 - 1394 Simple door and window facings of pinewood 2 cm. thick and 4 to 6 cm. wide	200	98	19.600
59 - 1649 Brass hand-grips for swing doors	40	122	19.40 4.880
60 - 1650 Idem idem mounted on printed brass panes	20	153	3.060
61 - 1652 Hand-grips of anticorodal	30	100	3.000
62 - 1658 Lock with bit and tour in thick-			

49 - 1517 Same same small	"	60	235	14.100
50 - 1518 Repairing of complete window-sashes	"	40	380	15.200
51 - 1564 Beech-tree panes for latrine shutters	"	15	685	10.275
52 - 1609 Round or square scentless hids Kg.		30	80	2.400
53 - 1611 Iron boxes for the water	No.	5	1170	<u>5.850</u>
Total				870.330
54 - 1621 Straight iron tubes for gutters and latrines	Kg.	80	75	6.080
55 - 1632 Hinges with wedge or with brass rings with a 13 to 16 cm. high blade	No.	120	60	7.200
56 - 1637 Bolts for big and small entan-ces	Kg.	40	145	5.900
57 - 1640 Small springs with brass top and nose for double doors	No.	200	60	12.000
58 - 1394 Simple door and window facings of pinewood 2 cm. thick and 4 to 6 cm. wide	ml.	200	98	19.600
59 - 1649 Brass hand-grips for swing doors	No.	40	122	19.40 4.880
60 - 1650 Idem idem mounted on printed brass panes	"	20	153	3.060
61 - 1652 Hand-grips of anticorodal	"	30	100	3.000
62 - 1658 Lock with hit and tour in thick-ness, long in the vertical way	"	30	415	12.450
63 - 1659 Lock with hit, tour and sample box	"	20	440	8.800
64 - 1666 Safety lock Yale type	"	5	1630	8.150
65 - 1738 Placing of simple glass panes	ml.	76	90	6.840
66 - 1743 Preparatory whitewashing with lime milk given with brush on walls and ceilings of rooms to 5 ml. high	"	5000	3	15.000

67 - 1745	Painting with 1 st milk given with brush on two layers on walls and ceilings in rooms to 5 ml. high	mq.	5000	9	45.000
68 - 1747	Layer executed after the second one with lime milk applied with any means in rooms to 5 ml. high	"	1600	4	4.000
69 - 1752	Fixing of painting with rabbit glue applied with pump	"	5000	3	15.000
70 - 1756	Coloring with watercolors on vertical or horizontal plasters or on paper with fine colors in rooms to 5 ml. high	"	300	45	13.500
71 - 1774	Oil and zinc-white painting with ordinary colors on two layers including the preparation with strong glue on plasters	"	200	163	<u>32.600</u>

Total

1.093.390

72 - 1763	Oil and zinc-white painting with ordinary colors on two layers on wood or iron	"	300	145	43.500
73 - "	Repairing and completion of the electric installments in the cellars, all floors and stairs				350.000
74 - "	Repairing and completion of the hydraulic installments with installment of warm water for showers and kitchen, building of lacking wash-stands in the latrines on the various floors				<u>450.000</u>

L. 1.936.890

" 63.110

To make it round

2.000.000

1939

Subject: - REPAIRS TO REQUISITIONED PROPERTY

8 British Liaison Unit,
C.M.F.
Tel. Rome - 843140. (8)
56/8

th. July 1946.

To :- R.A.A.C.

Deputy Commander, H.Q. M.M.I.A.
8 Territorial Command.

1. Reference your AG 600.52 of the 16th. May, it is regretted that Works Order Request G.M. 105, the details of which have been received to-day, 29th. July, from the Rome Territorial Command, can not be approved by 8 British Liaison Unit.
2. Work on the building in question, amounting to over five million lire, is not considered to come within the terms of essential maintenance.
3. Your attention is directed to M.M.I.A. letter Q/001 Accommodation of the 26th. Feb 1946.
4. Copy of detailed work and estimated costs submitted by the Genio Militare is attached for your inspection.

RD/egs

R. Downing, Major
R. Downing, Major.
C II.

1938

A modifiche dell'ordinazione lavori indicati nel foglio n.

- c) ripresa di lavori ornamentali, cornici, pareti etc.-

improrogabilmente. —

Tit. Col. OMC

[illegible]

COMANDO GENIO MILITARE TERRITOR. DI ROMA

Prot. n. 2/16832

Roma, li 12 Luglio 1946

ALLA DIREZIONE LAVORI GENIO MILITARE
SEDE

... .. 22879 del 10 c.m. con preghiera di

d'ordine

fto Col. E. Vanelli

1937

n. _____ di prot.

Roma, li _____

OGGETTO: Ordinazione lavori R.A.A.C. - n. IC5 -

AL COMANDO GENIO DEL TERRITORIO

R O M A

e, per conoscenza:

AL COMANDO ALLEATO

R O M A

Con riferimento al foglio n. 8° B.L.U./Q.12 del 20 Giugno 1946; questa Direzione da sopralluogo esperito sul posto ha constatato che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori richiesti con foglio cui si fa riferimento è distinta come appresso in tre gruppi:

I) - OPERE MURARIE, FALCIGNANERIA, ECC.

- Demolizione e ricostruzione di intonaci al pianterreno -
- Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimento -
- Costruzione di parti di invetriate mancanti -
- Fornitura e posa in opera di serrature, maniglie, cremonesi, manopole, ecc. mancanti od inservibili alle porte e finestre situate al pianterreno, primo piano e scantinato -
- Riparazione di persiane previa sostituzione di parti marcite, alle finestre -
- Riparazione di porte, invetriate e finestre del tipo piccolo, mezzano, grande -
- Fornitura e posa in opera di vetri mancanti od in parte rotti alle finestre ed invetriate -
- Demolizione di tramezzi per spostamento doccie e ricostruzione di esse -
- Costruzione di chiavichette per smaltire acque luride e bianche -
- Raschiatura di pareti, per togliere i vecchi strati di tinteggiatura scantinato, piano terreno, piano I° -
- Dissolvimento di verniciature o coloriture ad olio per togliere la parte sudicie alle pareti murarie e porte, invetriate e serrande -
- Ripristino dello scantinato comprendente anche il trasporto di materia ivi esistente -
- Tinteggiature a calce a tre mani dei tre piani sopra distinti -
- Coloritura ad olio e bianco di zinco ed alla cementite alle porte finestre e su pareti murarie -
- Demolizione di tratti di cornici pericolanti e ricostruzione

Con riferimento al foglio n. 8° B.L.U./Q.12 del 20 Giugno 1946; questa Direzione da sopralluogo esperito sul posto ha constatato che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori richiesti con foglio cui si fa riferimento è distinta come appresso in tre gruppi:

1) - OPERE MURARIE, FALCENAMERIA, ECC.

- Demolizione e ricostruzione di intonaci al pianterreno -
- Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimento -
- Costruzione di parti di invetriate mancanti -
- Fornitura e posa in opera di serrature, maniglie, cremonesi, manopole, ecc. mancanti od inservibili alle porte e finestre situate al pianterreno, primo piano e scantinato -
- Riparazione di persiane previa sostituzione di parti marcite, alle finestre -
- Riparazione di porte, invetriate e finestre del tipo piccolo, mezzano, grande -
- Fornitura e posa in opera di vetri mancanti od in parte rotti alle finestre ed invetriate -
- Demolizione di tramezzi per spostamento doccie e ricostruzione di esse -
- Costruzione di chiavichette per smaltire acque luride e bianche -
- Raschiatura di pareti, per togliere i vecchi stucchi di tinteggiatura scantinato, piano terreno, piano I° -
- Dissolvimento di verniciature o coloriture ad olio per togliere la parte sudicie alle pareti murarie e porte, invetriate e serrande -
- Ripristino dello scantinato comprendente anche il trasporto di materia ivi esistente -
- Tinteggiature a calce a tre mani dei tre piani sopra distinti -
- Coloritura ad olio e bianco di zinco ed alla cementite alle porte finestre e su pareti murarie -
- Demolizione di tratti di cornici pericolanti e ricostruzione di esse -

1936

L'importo presunto dei lavori sopra distinti è di L.2.900.000

2) - OPERE PER IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E RISCALDAMENTO

- Fornitura e posa in opera di apparecchi da latrina

././

- in sostituzione di quelli rotti e mancanti -
 - Fornitura e posa in opera di rubinetterie in parte mancanti e per costruzione nuovi impianti -
 - Bocchettoni per latrine perchè mancanti e per costruzione nuovi impianti doccie -
 - Sostituzione di sifoni di piombo mancanti -
 - Fornitura e posa in opera di cassette scaricatorie perchè mancanti -
 - Fornitura e posa in opera di lavabi completi perchè mancanti -
 - Fornitura e posa in opera di vasche in cemento armato con relative opere murarie per lavare attrezzi da cucina -
 - Costruzione di condutture di ferro tipo Mannesmann, per completeamento impianto idrico-sanitario -
 - Costruzione di rogge allo scantinato per smaltire acque bianche dall'ambiente cucina e bagni doccie -
 - Fornitura e posa in opera ~~per~~ di caldaia per acqua calda doccie e cucina -
 - Fornitura e posa in opera di boiler e tubazioni per i vari allacciamenti -
 - Riparazione completa di tutto l'impianto di termosifone -
 - L'importo presunto ~~per~~ per i lavori sopra distinti è di L. 1.400.000
- 3 OPERE PER IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE

- Punti luce comprendenti la costruzione dell'impianto elettrico con linee principali e secondarie nei locali del piano seminterrato, piano terreno e piano I° -
 - Fornitura e posa in opera di diffusori in parte mancanti e in parte rotti -
 - Sistemazione dei nuovi quadri e costruzione di nuovi quadri per impianto di cui sopra al piano seminterrato, terreno, primo, -
 - Amperometri da quadro elettromagnetico scala 0-100 -
 - ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
 - AMMONTARE DELLA SPESA DEI LAVORI ELETTRICI è di 900.000

AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE OPERE

OPERE MURARIE L. 2.900.000
 OPERE IDRAULICHE " 1.400.000
 OPERE ELETTRICHE " 900.000

T o t a l e L. 5.200.000

IL COLONNELLO DIRETTORE
 (Riccardo Barela)

0171

- Fornitura e posa in opera di lavabi completi perchè mancanti -
- Fornitura e posa in opera di vasche in cemento armato con relative opere murarie, per lavare attrezzi da cucina -
- Costruzione di condutture di ferro tipo Mannesmann, per completamento impianto idrico-sanitario -
- Costruzione di fognie allo scantinato per smaltire acque bianche dall'ambiente cucina e bagni doccie -
- Fornitura e posa in opera ~~per~~ di caldaia per acqua calda doccie e cucina -
- Fornitura e posa in opera di boiler e tubazioni per i veri allacciamenti -
- Riparazione completa di tutto l'impianto di termosifone -

L'importo presunto ~~per~~ per i lavori sopra distinti è di L. I. 400.000

3 3 OPERE PER IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE

- Punti luce comprendenti la costruzione dell'impianto elettrico con linee principali e secondarie nei locali del piano seminterrato, piano terreno e piano I° -
- Fornitura e posa in opera di diffusori in parte mancanti e in parte rotti -
- Sistemazione dei nuovi quadri e costruzione di nuovi quadri per impianto di cui sopra al piano seminterrato, terreno, primo, -
- Amperometri da quadro elettromagnetivo scala 0-100 -

~~SPESA PER IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE~~

AMMONTARE DELLE SPESA DEI LAVORI ELETTRICI è di 900.000

AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE OPERE

OPERE MURARIE	L. 2.900.000
OPERE IDRAULICHE	" 1.400.000
OPERE ELETTRICHE	" 900.000

T o t a l e L. 5.200.000

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barela)

R E L A Z I O N E N°

a corredo del progetto relativo ai lavori di sistemazione del fabbricato ex Stampa sito in Piazza Colonna.-

P_R_E_M_E_S_S_A

Con attergato n.2/15398 del 26.6.1946 del Comando Genio, in ottemperanza a quanto disposto, questa Direzione eseguiva un sopralluogo nel fabbricato ex Stampa sito in piazza Colonna allo scopo di compilare un progetto di lavori per la sistemazione dello stesso, in conformità alle segnalazioni contenute nel foglio n.8-B-L-U/Q 12 in data 20.6.1946 del Comando Alleato.-

In conseguenza, sulla scorta della lettera sopradetta ed agli accertamenti eseguiti, questa Direzione compilava un progetto dei lavori per l'ammontare complessivo di L.5.200.000,00.-

Successivamente ai contatti ed agli accordi intercorsi fra un Ufficiale Alleato ed un Ufficiale di questa Direzione e, a quanto richiesto con attergato n.2/16832 del 12.7.1946 del Comando Genio, a modifica del foglio n.8 B-L-U/Q 12 del 20.6.1946 del Comando Alleato, questa Direzione eseguiva altro sopralluogo e compilava il progetto che si rimette compendente opere murarie e infissi.- **- ELETTRICI - ED IDRICO SANITARIO - E RISULTA?**

Tutti i lavori necessari per la sistemazione del fabbricato sono stati divisi in tre gruppi formando tre distinti capitoli.-

Capit.A) Compendente: opere murarie, falegnameria - pittura -

- Demolizione e ricostruzione di solai in legno pericolanti -
- Demolizione e ricostruzione di tratti di intonaco nei vari piani -
- Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimento, in marmette battuti di cemento, linoleum nei vari piani -
- Costruzione di parti di invetriate mancanti -
- Fornitura posa in opera di serrature, maniglie, cremonesi, manopole ecc. mancanti ed inservibili, alle porte e finestre situate nei vari piani -
- Riparazione di persiane a rullo previa sostituzione di parti marcite, alle finestre dei balconi di vari piani -
- Ripristino di porte, invetriate e finestre del tipo mezzano o piccolo con sostituzione di parti mancanti -
- Fornitura e posa in opera di vetri in parte mancanti, in parte rotti, alle finestre e invetriate nei vari piani -
- Ricostruzione di tratti di cornici in stucco, in parte mancanti e cadute -
- Fornitura e posa in opera di gradini di marmo, demolizione e ricostruzione di basamenti di travertino lucidato -
- Ripristino di murature ai lati delle porte -
- Demolizione di tramezzi e sistemazione di locali per ricavare un corridoio di accesso nell'ufficio del Comandante Alleato -
- Ripristino dello scantinato comprendente anche lo scarico di ma-

1935

getto di lavori per la sistemazione dello stesso, in data 20.6.1946 del Comandante Alleato.

In conseguenza, sulla scorta della lettera sopradetta ed agli accertamenti eseguiti, questa Direzione compilava un progetto dei lavori per l'ammontare complessivo di L.5.200.000,00.-

Successivamente ai contatti ed agli accordi intercorsi fra un Ufficiale Alleato ed un Ufficiale di questa Direzione e, a quanto richiesto con attergato n.2/15832 del 12.7.1946 del Comando Genio, a modifica del foglio n.8 B-L-U/Q 12 del 20.6.1946 del Comando Alleato, questa Direzione eseguiva altro sopralluogo e compilava il progetto che si rimetteva al Comandante Alleato e infissi. - *DRICO SANITARIO - E RISCUO*

Tutti i lavori necessari per la sistemazione del fabbricato sono stati divisi in tre gruppi formando tre distinti capitolati.-

- Capit.A) Comprendente: opere murarie, falegnameria - pittura -
- Demolizione e ricostruzione di solai in legno pericolanti -
 - Demolizione e ricostruzione di tratti di intonaco nei vari piani -
 - Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione, in marmette battuti di cemento, linoleum nei vari piani -
 - Costruzione di parti di invetriate mancanti -
 - Fornitura posa in opera di serrature, maniglie, cremonesi, manopole ecc. mancanti ed inservibili, alle porte e finestre situate nei vari piani -
 - Riparazione di persiane a rullo previa sostituzione di parti marcite, alle finestre dei balconi di vari piani -
 - Ripristino di porte, invetriate e finestre del tipo mezzano o piccolo con sostituzione di parti mancanti -
 - Fornitura e posa in opera di vetri in parte mancanti, in parte rotti, alle finestre e invetriate nei vari piani -
 - Ricostruzione di tratti di cornici in stucco, in parte mancanti e cadute -
 - Fornitura e posa in opera di gradini di marmo, demolizione e ricostruzione di basamenti di travertino lucidato -
 - Ripristino di murature ai lati delle porte -
 - Demolizione di tramezzi e sistemazione di locali per ricavare un corridoio di accesso nell'ufficio del Comandante Alleato -
 - Ripristino dello scantinato comprendente anche lo scarico di materie di rifiuto esistenti -
 - Spurgo di fogne e chiavichette -
 - Costruzione di chiavichette coperte per smaltire acque bianche e luride -
 - Raschiatura di pareti per togliere i vecchi strati di tinteggiatura -

1935

- Dissolvimento di vecchie verniciature o coloriture ad olio su pareti murarie o infissi -
 - Tinteggiatura e fissaggio con colla di Coniglio -
 - Verniciatura e coloritura infissi, zoccoli etc. etc.-
- Capit.B) Comprendente impianti idrico-sanitari e riscaldamento -
- Fornitura e posa in opera di cassoni per acqua -
 - Sostituzione di tratti di tubazione di ferro e di piombo deteriorati -
 - Fornitura e posa in opera di apparecchi da latrina inservibili e mancanti per nuova latrina -
 - Sistemazione di canna fumaria -
 - Fornitura e posa in opera di cassoni per acqua -
 - Fornitura e posa in opera di scaldabagni elettrici per la sistemazione dei bagni -
 - Fornitura e posa in opera di rubinetteria in parte mancante e, per costruzione nuove latrine -
 - Bocchettone per latrine e grondaie -
 - Sostituzione di sifoni di piombo, mancanti e inservibili -
 - Fornitura o posa in opera di cassette scaricatorie perchè mancanti in parte e in parte inservibili -
 - Sostituzione di discendenti pluviali e canali di ferro zincato -
 - Sostituzione di tratti di colonne di latrine in tubo di ghisa perchè deteriorati e mancanti -
 - Fornitura e posa in opera di chiusini inodori -
 - Fornitura e posa in opera di vasche per lavare attrezzi di cucina -
 - Fornitura e posa in opera di scaldabagno per nuovi impianti idrici sanitari -
 - Fornitura e posa in opera di caldaia per acqua calda doccie e cucina -
 - Fornitura e posa in opera di boiler per bagni e doccie -

Capit.C) Comprendente l'impianto elettrico di illuminazione ecc. -

- Punti luce per ogni vano 1. I più 2 o tre prese -
- Fornitura e posa in opera di diffusori in parte mancanti e in parte rotte -
- Suonerie per campanelli da sostituire -
- Sistemazione e costruzione di nuovi quadri per campanelli -
- Sistemazione dell'impianto elettrico dall'esterno, deviatori a rotazione ecc. -
- Trasformatori monofase per campanelli -
- Interruttori da quadro da 100 amper -
- Amperometro da quadro elettromagnetico scala 0-100
- Costruzione di impianti per campanelli e suonerie -

AMMONTARE DELLE SPESE

- In base agli estimativi facenti parte dei capitolati allegati, le spese necessarie risultano come segue:

Capit.A) Opere murarie falegnameria pittore ecc. L. 3. 900.000,=

- Sistemazione di canna fumaria -
- Fornitura e posa in opera di cassoni per acqua -
- Fornitura e posa in opera di scaldabagni elettrici per la sistemazione dei bagni -
- Fornitura e posa in opera di rubinetteria in parte mancante e, per costruzione nuove latrine -
- Bocchettone per latrine e grondaie -
- Sostituzione di sifoni di piombo, mancanti e inservibili -
- Fornitura e posa in opera di cassette scaricatorie perchè mancanti in parte e in parte inservibili -
- Sostituzione di discendenti pluviali e canali di ferro zincato -
- Sostituzione di tratti di colonne di latrine in tubo di ghisa perchè deteriorati e mancanti -
- Fornitura e posa in opera di chiusini inodori -
- Fornitura e posa in opera di vasche per lavare attrezzi di cucina -
- Fornitura e posa in opera di scaldabagno per nuovi impianti idratici sanitari -
- Fornitura e posa in opera di caldaia per acqua calda doccie e cucina -
- Fornitura e posa in opera di boiler per bagni e doccie -
- Capit.C) Comprendente l'impianto elettrico di illuminazione ecc. -
- Punti luce per ogni vano m. I più 2 o tre prese -
- Fornitura e posa in opera di diffusori in parte mancanti e in parte rotte -
- Suonerie per campanelli da sostituire -
- Sistemazione e costruzione di nuovi quadri per campanelli -
- Sistemazione dell'impianto elettrico dall'esterno, deviatori a rotazione ecc. -
- Trasformatori monofase per campanelli -
- Interruttori da quadro da 100 amper -
- Amperometro da quadro elettromagnetico scala 0-100
- Costruzione di impianti per campanelli e suonerie -

AMMONTARE DELLE SPESE

- In base agli estimativi facenti parte dei capitoli allegati, le spese necessarie risultano come segue:
- Capit.A) Opere murarie falegnameria pittore ecc. L. 3. 900.000,=
- " B) Impianto idrico-sanitario e riscaldamento " 1. 800.000,=
- " C) Impianto elettrico di illuminazione " 1. 500.000,=

Importo complessivo L. 7. 200.000,=

I prezzi tenuti per base sono quelli della tariffa in

sufficientemente renumerati e corrispondenti a quelli praticati sulla piazza.

In caso di approvazione da parte delle Superiori Autorità e dato che gli alleati fanno viva premura affinché i lavori siano portati a termine con la massima celerità, si chiede autorizzazione ad eseguire i lavori ad economia (cotto) con la procedura dell'art. 50 del vigente regolamento affidati a ditte specializzate previa gara fra quelle di fiducia e che diano garanzia di corrispondere con la massima celerità.

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten. Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barela)

2 1934

Subject: - REPAIRS AND MAINTENANCE OF ALLIED
REQUISITIONED PROPERTY

8 Brit⁵ Liaison Unit,
C.M.F.
Tel. Rome - 843140.
56/Q

19th. July 1946.

To :- H.Q. Territorial Command.

Genio Militare.
Deputy Commander, M.M.I.A.
S.O.R.S. M.M.I.A.

- (1) Reference Genio Militare letter 2/17158 of the 16th. July 46 and attached list of work in progress or still to be completed on requisitioned property.
- (2) The Deputy Commander, M.M.I.A. has requested 8 B.L.U. to produce all details of civilian contracts relating to the projects listed below:
 - (a) Piazza Colonna 365.
 - (b) Villa Vaselli
 - (c) Via F. Corridoni (34 St. Hospital)
- (3) Work already started on these buildings will cease.
- (4) Requests for work to be carried out on the following buildings are cancelled:
 - (a) Piazza Venezia (H.Q. R.A.A.C.)
 - (b) Via Cliturno. No. 5.
 - (c) Foro D'Italia.
- (5) Reference para. 2 above, will you please arrange for all the available information to be passed to this office on or before the 22nd. July 1946 by a representative of the Genio Militare.

RD/eg.

Ref. para 5.
Col. Scott
collect 22/7.
Buonella asked

Graves people
an asking for
to expedite
par 5.

R. Downing, Major.
G II

1933
with
Col. FISKE
referred to
play
R.

Oggetto : Riparazioni e manutenzione di
proprietà leate requisite.-

8 British Liaison Unit
C.M.F.
Tel. Rome - 843140.
56/Q

19 luglio 1946

Per il : H.Q. Comando Territoriale.

Deputy Commander, M.M.I.A.

S.O.R.E. M.M.I.A.

Genio Militare

(1) Riferimento alla lettera del Genio Militare 2/17158 del 16 giugno 46, con accluso elenco di lavori fatti o ancora da completare su proprietà requisite.-

(2) Il "Deputy Commander", M.M.I.A. ha chiesto all'VIII^o B.L.U., di presentare tutti i dettagli dei contratti civili concernenti i progetti sottoelencati:

- (a) Piazza Colonna 365.
- (b) Villa Vaselli.
- (c) Via F. Corridoni (34 St. Hospital)

(3) Il lavoro già iniziato a questi edifici deve cessare.-

(4) Le richieste di lavori concernenti i seguenti edifici, devono venire annullate:

- (a) Piazza Venezia (H.Q. R.A.A.C.)
- (b) Via Clitumno n.5.
- (c) Foro D'Italia.-

1932

(5) Con riferimento al sopradetto par.2, vogliate prego

fare in modo che tutte le informazioni vantaggiose vengano inviate a questo ufficio il o prima del 22 luglio 46 a mezzo un rappresentante del Genio Militare.--


R. DOWNING, Major.

G II

1931

Subject:- Works Order Regd 1st R.A.A.C. LAND FORCES S.C.-COMMISSIONER A.C.
No. 105 8 E.L.U. ROME.

8/9/12

20 June 1946

③

To:- H.Q. Territorial Command.

(1) Reference attached Works Order, an inspection of No. 365 Piazza Colonna was made by Major Downing and Colonel Scott of the American Graves Registration Unit on 19th. June 1946.

(2) Building requires:

- (a) Check and repair of all lighting, plumbing and heating systems.
- (b) Some windows replacing.
- (c) Doors refitting.
- (d) Basement to be cleaned.
- (e) Ground Floor repaired.
- (f) Main Central Room on 1st. Floor to have panels colour-washed either white or cream.
- (g) Some replastering of portions of walls.

(3) American Unit hopes to occupy during the beginning of August.

(4) May an estimate of costs be submitted for inspection by this office, and approximate period required for completion stated.

(5) I see no reason why preliminary work should not start at once and request your concern in this matter.

1930

R. DOWNING, Major.G II

Copy: Genio Militare.

72

HEADQUARTERS ROME AREA, MTOUSA
APO #794, U.S. ARMY

AG 600.52

CBM/KN/gm
Date 16 May 1946

SUBJECT: Work Order Request

TO : Commanding Officer,
8 British Liaison Unit,
Rome Territorial Command,
32 Via Po, Rome, Italy



Ref. letter from Col. Kerr of MMIA to
Italian Minister for War, subject: "Repairs to Re-
quisitioned Buildings, Rome Area", dated 28 February
1945.

1. With reference to the above letter, the
following work order request is submitted for your
approval and processing:

(a) Complete repair and redecoration of
the unoccupied portion of the building which once
housed the Headquarters of the Italian Fascist
Press Club at Piazza Colonna #365. Contact Capt.
Morrison at telephone 66215 for further details.

Note: This building will have a unit at present
scheduled to remain in Italy for the next five
years.

Capt. Morrison

(a) Graves Registration Unit

(b) 106 Officers

to provide
detailed request

400/500 W.D. civilians

FOR THE COMMANDING OFFICER:

10,000. Dollars.

Previously occupied
by Y.H.E.A.

Work Order # GM 105

C.B. MURPHY
Major, AGD
Adjutant General

1929

SUBJECT : Repairs to Requisitioned Buildings,
Rome Area.

2/10/12 (5)
①
Lend Forces Sub Commission A.C.
(M.M.I.A.)
R O M E
Q/001 Accn
26 February 1946


TO : Minister for War.

1. Following a conference at Rome Area Allied Command this date, it is desired to simplify the procedure under which repair and maintenance work is performed by the Rome Territorial Command Engineers on buildings in use by the Allied troops. All previous instructions or letters in conflict with this letter are cancelled.

2. The procedure will be as follows:

- a. Request for work service will be forwarded by Rome Area Allied Command (G-4) direct to 8 BLU.
- b. 8 BLU will approve the request if the work desired is essential repair or maintenance of existing installations (as specified in your letter of 17 Feb 1946 N 202648 /II) and pass the request to the Rome Territorial Command for execution of the work.
- c. If 8 BLU does not approve the request, 8 BLU will forward the request to this headquarters in which case the entire matter will be reviewed in conjunction with your Chief Engineer in the light of desirability, necessity and expense involved.

3. You should instruct the Rome Territorial Command that engineer work should be undertaken for Allied units in Rome Area only in accordance with this procedure, which will insure strict supervision and economy.


C. P. KERR, Colonel,
for
Major General
MMMA.

cc
CG Rome Area Allied Command
8 BLU

CPK/ml1

1925

'8 DIREZIONE LAVORI E SERVIZI GENIO ROMA

n. 23220 di prot.
Risp. al f. del 12-7-46
n. 2/16832

Roma, li 13 Luglio 46

OGGETTO: Sistemazione del palazzo della stampa- Piazza Colonna-

AL COMANDO GENIO DEL TERRITORIO ROMA

Questa Direzione ha in corso di approntamento i tre capitolati già preannunziati con foglio n. 20879 del 10 luglio 1943 e riflettenti i lavori che occorrerà eseguire per sistemare quel fabbricato, secondo le ultime indicazioni date sul posto dall'Ufficiale Alleato, ed elencate nel foglio inviato con l'attergato sopradistinto.

L'ammontare dell'estimativo di spesa relativo alle opere murarie e' previsto in L. L. 3.900.000 quello per la rimessa in efficienza degli impianti elettrici e' di L. 1.500.000 e l'ammontare dell'estimativo per la sistemazione degli impianti idrici ed igienici-sanitari risulta di L. 1.800.000

T o t a l e

L. 7.200.000

Questa Direzione, dato che il Comando Alleato ha chiesto che i lavori siano allestiti per la fine della prima settimana di Agosto, propone che anche tali lavori, siano eseguiti ad economia ai sensi dell'art. 8 della legge sulla contabilità Generale dello Stato (Art. 50 Reg. per i lavori del Genio Militare).

In tal caso, al fine di guadagnare tempo, mentre si porta a termine l'allestimento dei capitolati, sarebbe opportuno che una volta decisa la modalità di appalto innanzi proposta, questa Direzione fosse autorizzata ad esperire tra ditte specializzate e di fiducia dell'Amm.ne tre gare distinte, e cioè una per ciascuno dei tre tipi lavori da eseguire.

I lavori sopra menzionati, siccome da eseguirsi per conto degli Alleati, dovranno gravare sul cap. 222, per cui questa Direzione ritiene che, per quanto disposto dal Ministero della Guerra, una volta concessa l'autorizzazione a stipulare i cottimi con le imprese aggiudicatarie, possa mettere in pagamento i relativi acconti senz'altra autorizzazione al riguardo.

Sullo stesso cap. 222 saranno fatti gravare gli altri cottimi la cui autorizzazione e' stata richiesta con il foglio sopra menzionato.

capitolati già preannunziati con foglio n. 20079 del 10 luglio 1943 e riflettenti i lavori che occorrerà eseguire per sistemare quel fabbricato, secondo le ultime indicazioni date sul posto dall'Ufficiale Alleato, ed elencate nel foglio inviato con l'atterraggio sopradistinto.

L'ammontare dell'estimativo di spesa relativo alle opere murarie e' previsto in L. L. 3.900.000
quello per la rimessa in efficienza degli impianti elettrici e' di L. 1.500.000
e l'ammontare dell'estimativo per la sistemazione degli impianti idrici ed igienici-sanitari risulta di L. 1.800.000

T o t a l e
L. 7.200.000

Questa Direzione, dato che il Comando Alleato ha chiesto che i lavori siano allestiti per la fine della prima settimana di Agosto, propone che anche tali lavori, siano eseguiti ad economia ai sensi dell' art. 8 della legge sulla contabilità Generale dello Stato (Art. 50 Reg. per i lavori del Genio Militare).

In tal caso, al fine di guadagnare tempo, mentre si porta a termine l'allestimento dei capitolati, sarebbe opportuno che una volta decisa la modalità di appalto innanzi proposta, questa Direzione fosse autorizzata ad esperire tra ditte specializzate e di fiducia dell'Amm.ne tre gare distinte, e cioè una per ciascuno dei tre tipi lavori da eseguire.

I lavori sopra menzionati, siccome da eseguirsi per conto degli Alleati, dovranno gravare sul cap. 222, per cui questa Direzione ritiene che, per quanto disposto dal Ministero della Guerra, una volta concessa l'autorizzazione a stipulare i cottimi con le imprese aggiudicatarie, possa mettere in pagamento i relativi acconti senz'altra autorizzazione al riguardo.

Sullo stesso cap. 222 saranno fatti gravare gli altri cottimi la cui autorizzazione e' stata richiesta con il foglio sopra menzionato.

Con l'occasione si fa presente che per poter fornire urgentemente al fabbricato l'acqua, che per mancanza di pressione non alimenta i serbatoi dei vari piani e' stato necessario ordinare l'impianto di sollevamento a mezzo di un'elettropompa, la cui fornitura e posa in opera e' stata affidata alla stessa ditta I.C.I.T che alcuni giorni or sono esegui' identico lavoro per l'Albergo Boston pure occupato dagli Alleati.

In definitiva la spesa preventivata per la sistemazione del fabbricato in oggetto risulterà di L.8.580.000 di cui 7.200.000 piu' 140.000 uguale 7.340.000 per i lavori indicati nel presente foglio e lire 1.240.000 per i lavori indicati nel foglio sopra menzionato.

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barela)

URGENTISSIMO A MANO

COMANDO GENIO MILITARE TERRITORIALE ROMA

N. 17739 di prot. roma 20 luglio 1946

OGGETTO: Lavori per gli alleati.

ALLA DIREZIONE LAVORI GENIO MILITARE

SEDE

Si allega la lettera in data 19 Luglio relativa ai lavori in corso per gli alleati con preghiera di:

- 1) Dare tutti i ragguagli richiesti al comma 2) del foglio stesso inviando un proprio incaricato prima del 22 corr. dal maggiore DOWNNING
- 2) Sospendere i lavori nei fabbricati del comma 2) come ordinato al comma 3).
- 3) Cancellare dagli specchi i lavori di cui al comma 4)

d'ordine

IL COL. CAPO UFFICIO
(E. Vanelli)

1926

Subject: REPAIRS AND MAINTENANCE OF ALLIED
REQUISITIONED PROPERTY

8 British Liaison Unit.
C.M.F.
Tel. Rome - 843140
56/0

19th July 1946

To :- H.Q. Territorial Command

Genio Militare
Deputy Commander, M.M.I.A.
S.O.R.E. M.M.I.A.

(1) Reference Genio Militare letter 2/17158 of the 16th July 46 and attached list of work in progress or still to be completed on requisitioned property.

(2) The Deputy Commander, M.M.I.A. has requested 8 B.L.U. to produce all details of civilian contracts relating to the projects listed below:

- (a) Piazza Colonna 365
- (b) Villa Vaselli
- (c) Via P. Corridoni (34 St. Hospital)

(3) Work already started on these buildings will cease.

(4) Requests for work to be carried out on the following buildings are cancelled:

- (a) Piazza Venezia (H.Q. R.A.A.C.)
- (b) Via Clitunno No. 5
- (c) Foro d'Italia

(5) Reference par. 2 above, will you please arrange for all the available information to be passed to this office on or before the 22nd July 1946 by a representative of the Genio Militare

/s/R. Downing,
/t/R. Downing Major
G II

1925

GENIO MILITARE

(1) 8^a DIREZIONE LAVORI E SERVIZI GENIO
ROMA

CAPITOLATO

A QUANTITA' ⁽²⁾ DETERMINATE

per lavori di ripristino di impianti idrici e sanitari esistenti nei vari
piani del fabbricato ex Stampa sito in piazza Colonna n. 365

in ROMA

per l'importo di lire 1.800.000,=

IL CAPITOLATO E' COMPOSTO:

- a) di un estimativo ~~di una~~ tariffa ⁽³⁾;
- b) delle condizioni tecniche;
- c) delle condizioni amministrative.

CAPITOLATO

A QUANTITA' ⁽²⁾ DETERMINATE

per lavori di ripristino di impianti idrici e sanitari esistenti nei vari

piani del fabbricato ex Stampa sito in piazza Colonna n. 365

in R O M A

per l'importo di lire 1.800.000,=

IL CAPITOLATO E' COMPOSTO:

- a) di un estimativo ~~ex~~ di una tariffa ⁽³⁾;
- b) delle condizioni tecniche;
- c) delle condizioni amministrative.

(1) Ente compilatore del progetto.

(2) Od indeterminate.

(3) Per capitoli a quantità indeterminate si cancellano le parole: « un estimativo e di ».

8- DIREZIONE LAVORI E SERVIZI GENIO - R O M A

ESTIMATIVO DI SPESA OCCORRENTE PER LAVORI DI RIPRISTINO DI IMPIANTI IDRICI E SANITARI ESISTENTI NEI VARI PIANI DEL FABBRICATO EX STAMPA
SITO IN PIAZZA COLONNA N° 365 - R O M A

1- 23-	Manovale lavorante d'arte qualunque	ore 70	60	4.200,=
2- 35-	Muratore	" 70	65	4.550,=
3- 52-	Stagnaro	" 100	67	6.700,=
4-253-	Gesso da costruzione muraria	ql. 2	1200	2.400,=
5-256-	Malta comune	mc. 3	1600	4.800,=
6-263-	Malta bestarda di calce e cemento	mc. 2	3.200	6.400,=
7-296-	Mattoni detti zoccoli (dimensioni cm. 5,5x14x28)	mille 0,50	4300	2.150,=
8-391-	Canali di lamiera di ferro zincata (galvanizzata) lisci semplici	Kg. 80	110	8.800,=
9-392-	Canali di lamiera di ferro zincata (galvanizzata) lisci con bordo	" 60	130	7.800,=
10-409-	Gomiti di lamiera di ferro di qualunque specie	" 50	85	4.250,=
11-433-	Tubi di acciaio senza saldature tipo mannesmann con giunto a vite a manico	" 200	90	18.000,=
12-436-	Tubi di acciaio saldati a vite e manico zincati (galvanizzati)	" 100	92	9.200,=
13-440-	Tubi bollitori	" 200	100	20.000,=
14-444-	Tubi di lamiera di ferro zincati (galvanizzati) inchiodati e saldati	" 90	115	10.350,=
15-447-	Travi di ferro omogeneo a doppio T	" 500	38	19.000,=
16-455-	Viti di ferro di qualunque specie per ferro ed altro materiale	" 120	330	39.600,=
17-458-	Cassette scaricatrici di ghisa per latrine	n° 20	951	19.020,=
18-459-	Chiusini inodori in ghisa smaltati (diam. 8 a 10 cm.)	" 18	215	3.870,=
19-463-	Lavabo di ghisa porcellanata	ciasc. 20	1050	21.000,=
20-464-	Mensole di ghisa smaltata per lavabi	" 40	115	4.600,=
21-465-	Orinatoi di ghisa porcellanata vertic.	" 10	3600	36.000,=
22-468-	Rosette di ghisa di aerazione	" 150	59	8.850,=

0190

4-253-	Gesso da costruzione muraria	ql.	2	1200	6.100,=
5-256-	Malta comune	mc.	3	1600	2.400,=
6-263-	Malta bastarda di calce e cemento	mc.	2	3.200	4.800,=
7-296-	Mattoni detti zoccoli (dimensioni cm. 5,5x14x28)	mille	0,50	4300	6.400,=
8-391-	Canali di lamiera di ferro zincata (galvanizzata) lisci semplici	Kg.	80	110	2.150,=
9-392-	Canali di lamiera di ferro zincata (galvanizzata) lisci con bordo	"	60	130	8.800,=
10-409-	Gomiti di lamiera di ferro di qualunque specie	"	50	85	7.800,=
11-433-	Tubi di acciaio senza saldature tipo mannesmann con giunto a vite a manico	"	200	90	4.250,=
12-436-	Tubi di acciaio saldati a vite e manico zincati (galvanizzati)	"	100	92	18.000,=
13-440-	Tubi bollitori	"	200	100	9.200,=
14-444-	Tubi di lamiera di ferro zincati (galvanizzati) inchiodati e saldati	"	90	115	20.000,=
15-447-	Travi di ferro omogeneo a doppio T	"	500	38	10.350,=
16-455-	Viti di ferro di qualunque specie per ferro ed altro materiale	"	120	330	19.000,=
17-458-	Cassette scaricatrici di ghisa per latrine	n°	20	951	39.600,=
18-459-	Chiusini inodori in ghisa smaltati (diam. 8 a 10 cm.)	"	18	215	19.020,=
19-463-	Lavabo di ghisa porcellanata	ciasc.	20	1050	3.870,=
20-464-	Mensole di ghisa smaltata per lavabi	"	40	115	21.000,=
21-465-	Orinatori di ghisa porcellanata vertic.	"	10	3600	4.600,=
22-468-	Rosette di ghisa di aerazione	"	150	59	36.000,=
23-469-	Sifoni di ghisa smaltati piccoli	"	120	425	8.850,=
24-470-	Sifoni di ghisa smaltati grandi	"	100	425	51.000,=
25-471-	Tubi di ghisa dritti a cordone e bicchiere per impianti idrici	Kg.	300	65	42.500,=
26-472-	Tubi di ghisa dritti per grondaie e latrine	"	280	60	19.500,=
				a riportare	16.800,=
					1923

Riporto

27-473-	Tubi di ghisa catramati	Kg.200	75	15.000,=
28-474-	Idem (pezzi speciali)	" 150	85	12.750,=
29-475-	Vasca da bagno di ghisa porcellanata	ciasc. 6	5000	30.000,=
30-476-	Vaschette di ghisa smaltata	" 8	1800	14.400,=
31-478-	Piombo in tubi ed in lastre di qualunque diametro e spessore	Kg.190	50	9.500,=
32-481-	Rosette in piombo per lastre di ardesia	ciasc. 60	160	9.600,=
33-492-	Stagno in verghe	Kg. 14	850	11.900,=
34-493-	Stagno in verghe per saldature	" 18	940	16.920,=
35-530-	Saldature da lattoniere	ml.100	100	10.000,=
36-607-	Tubi di cemento pressati da cm.10	" 30	80	2.400,=
37-608-	Tubi di cemento pressati da cm.15	" 20	100	2.000,=
38-624-	Vasca lavapanni di cemento armato e retinato con le facce viste e graniglie levigate	ciasc. 2	2820	5.640,=
39-629-	Sgusci, cordoncino, cantonali e fregi di maiolica	ml. 90	132	11.880,=
40-630-	Lavabi di porcellana	ciasc. 20	3125	62.500,=
41-632-	Lavabi di terraglia porcellanata	" 6	2500	15.000,=
42-636-	Orinatori di maiolica a becco	" 8	1150	9.200,=
43-637-	Piastrelle di maiolica di l' scelta	mq. 6	1000	6.000,=
44-640-	Vasi di porcellana bianca per cessi e tavoletta	ciasc. 30	1500	45.000,=
45-641-	Vasi di terraglia porcellanata per cessi con sifone inodore e tavoletta di noce	" 4	1050	4.200,=
46-659-	Argilla refrattaria nazionale	ql. 6	320	1.920,=
47-660-	Mattoni refrattari nazionali	cent. 2	1900	3.800,=
48-664-	Tubi di grès ceramico del diametro da cm.10 a 19	ml. 40	320.	12.800,=
49-671-	Mattonelle di argilla greificata lisce o ruvide di qualunque forma e dimensione di color rosso dello spessore da mm.10 a 18	mq. 5	540	2.700,=
50-678-	Canna fumaria di ardesia artificiale media	ml. 60	440	26.400,=

0.194

33-492-	Stagno in verghe	Kg. 14	850	11.900,=
34-493-	Stagno in verghe per saldature	" 18	940	16.920,=
35-530-	Saldature da lattoniere	ml. 100	100	10.000,=
36-607-	Tubi di cemento pressati da cm. 10	" 30	80	2.400,=
37-608-	Tubi di cemento pressati da cm. 15	" 20	100	2.000,=
38-624-	Vasca lavapanni di cemento armato e retinato con le facce viste e graniglie levigate	ciasc. 2	2820	5.640,=
39-629-	Sgusci, cordoncino, cantonali e fregi di maiolica	ml. 90	132	11.880,=
40-630-	Lavabi di porcellana	ciasc. 20	3125	62.500,=
41-632-	Lavabi di terraglia porcellanata	" 6	2500	15.000,=
42-636-	Orinatori di maiolica a becco	" 8	1150	9.200,=
43-637-	Piastrelle di maiolica di l' scelta	mq. 6	1000	6.000,=
44-640-	Vasi di porcellana bianca per cessi e tavoletta	ciasc. 30	1500	45.000,=
45-641-	Vasi di terraglia porcellanata per cessi con sifone inodore e tavoletta di noce	" 4	1050	4.200,=
46-659-	Argilla refrattaria nazionale	ql. 6	320	1.920,=
47-660-	Mattoni refrattari nazionali	cent. 2	1900	3.800,=
48-664-	Tubi di grès ceramico del diametro da cm. 10 a 19	ml. 40	320.	12.800,=
49-671-	Mattonelle di argilla greificata lisce o ruvide di qualunque forma e dimensione di color rosso dello spessore da mm. 10 a 18	mq. 5	540	2.700,=
50-678-	Canna fumaria di ardesia artificiale media	ml. 60	440	26.400,=
51-683-	Coperchi di ardesia artificiale per serbatoi e recipienti medi	ciasc. 12	340	4.080,=
52-684-	Idem per serb. e recip. piccoli	" 6	255	1.530,=

a riportare

Riporto

53- 685-	Cappi di camino di ardesia artific. ciasc.	4	500	2.000,=
54- 687-	Lastre di ardesia artificiale dette alla romana	" 5	300	1.500,=
55- 690-	Lastre di ardesia artificiale per sostegni reticolati	" 30	200	6.000,=
56- 691-	Serbatoi di ardesia artificiale da litri 100	" 4	1000	4.000,=
57- 692-	Idem da litri 200	" 10	1650	16.500,=
58- 693-	Idem da litri 300	" 20	2500	50.000,=
59-701 -	Tubi dritti di ardesia artificiale del diametro da cm.5 a 9	ml. 30	215	6.450,=
60- 718-	Minio di piombo puro	Kg. 10	100	1.000,=
61- 731-	Vernice antiruggine	" 5	500	2.500,=
62- 742-	Linoleum	mq. 20	600	12.000,=
63- 763-	Scaldabagno a gas	ciasc. 3	15000	45.000,=
64- 764-	Scaldabagno elettrico	" 5	18000	90.000,=
65- 771-	Benzina	lt. 10	60	600,=
66- 776-	Mastice da fontaniere	Kg. 4	300	1.200,=
67- 858-	Scanalatura di muri di sezione da mq. 0,026 a mq.0,02	ml.100	135	13.500,=
68- 861-	Foratura di muri sottili	" 130	27	3.510,=
69- 862-	Idem mezzani	" 70	27	1.890,=
70- 863-	Idem grossi	" 15	180	2.700,=
71-1025-	Posizioni in opera di tubazioni del diametro da cm.8 a 19	" 30	80	2.400,=
72-1022-	Posizione in opera di abbeveratoi, lavandini, vasche vaschette e simili	ciasc.30	250	7.500,=
73-1024-	Posizione in opera di chiusini di bis cemento armato	" 8	55	440,=
74-1025-	Posizione in opera di apparecchi e cassette di metallo ed accessori per alimentare l'acqua alle latrine	" 20	215	6.300,=
75-1026-	Posizione in opera di serbatoi di metallo con sifone o senza e scaricatore automatico per latrine	" 6	215	1.290,=
76-1027-	Posa in opera di cassone di metallo per acque	" 8	125	1.000,=

litri 100						
57- 692-	Idem da litri 200	"	4	1000	4.000,=	
58- 693-	Idem da litri 300	"	10	1650	16.500,=	
59-701 -	Tubi dritti di ardesia artificiale del diametro da cm.5 a 9	"	20	2500	50.000,=	
60- 718-	Minio di piombo puro	ml.	30	215	6.450,=	
61- 731-	Vernice antiruggine	Kg.	10	100	1.000,=	
62- 742-	Linoleum	"	5	500	2.500,=	
63- 763-	Scaldabagno a gas	mq.	20	600	12.000,=	
64- 764-	Scaldabagno elettrico	ciasc.	3	15000	45.000,=	
65- 771-	Benzina	"	5	18000	90.000,=	
66- 776-	Mastice da fontaniere	lt.	10	60	600,=	
67- 858-	Scanalatura di muri di sezione da mq. 0,026 a mq.0,02	Kg.	4	300	1.200,=	
68- 861-	Foratura di muri sottili	ml.	100	135	13.500,=	
69- 862-	Idem mezzani	"	130	27	3.510,=	
70- 863-	Idem grossi	"	70	27	1.890,=	
71-1025-	Posizioni in opera di tubazioni del diametro da cm.8 a 19	"	15	180	2.700,=	
72-1022-	Posizione in opera di abbeveratoi, la- vandini, vasche vaschette e simili	"	30	80	2.400,=	
73-1024-	Posizione in opera di chiusini di cemento armato	"	8	55	440,=	
74-1025-	Posizione in opera di apparecchi e cassette di metallo ed accessori per alimentare l'acqua alle latrine	"	20	215	6.300,=	
75-1026-	Posizione in opera di serbatoi di me- tallo con sifone o senza e scaricatore automatico per latrine	"	6	215	1.290,=	
76-1027-	Posa in opera di cassone di metallo per acqua	"	8	125	1.000,=	
77-1028-	Posizione in opera di vasi di maioli ca e di porcellana con accessori per latrine	"	20	255	5.100,=	
78-1029-	Posizione in opera di orinatori verti- cali di qualunque materiale	"	8	300	2.400,=	

a riportare 1922

Riporto

79-1030-	Posizione in opera di orinatori a becco di qualsiasi materiale	ciasc. 6	145	870,=
80-1031-	Posizione in opera di lavabi, lavandini ad acqua di qualsiasi specie	ciasc. 10	225	2.250,=
81-1033-	Posizione in opera di vasche da bagno di qualsiasi specie	" 10	360	3.600,=
82-1034-	Posizione in opera di chiusini inodori di ghisa smaltata del diam. da 8 a 10 cm.	" 16	90	1.440,=
83-1035-	Idem da cm. 11 a 15	" 40	100	4.000,=
84-1038-	Posizione in opera di sifone di ghisa grande	" 10	80	800,=
85-1039-	Posizione in opera di sifone di ghisa piccolo	" 18	1040	18.720,=
86-1040-	Posizione in opera di sifone di piombo inodore con viti di ottone di scarico	" 9	55	531,=
87-1041-	Posizione in opera di cappa da camino di ardesia artificiale	" 1	135	135,=
88-1043-	Posizione in opera di cucina economica di ghisa di ferro	Kg. 300	2	600,=
89-1045-	Posizione in opera di scaldabagno di qualsiasi tipo e dimensione	n° 10	320	3.200,=
90-1045-bis	Posizione in opera di mensole di ghisa smaltata per lavabi	ciasc. 40	120	4.800,=
91-1083-	Lavandini di marmo (sciacquatoi) di forma ordinaria rettangolare con dimensioni interne minime di cm. 60x40x20	" 1	3700	3.700,=
92-1586-	Ferramenta fucinata del 1° genere	Kg. 30	100	3.000,=
93-1587-	Idem del 2° genere	" 300	115	34.500,=
94-1588-	Idem del 3° genere	" 40	130	5.200,=
95-1593-	Posizione in opera di ferramenta mezza na dell'Amm.ne Militare peso da oltre Kg. 5 a 100	" 120	9	1080,=
96-1594-	Idem piccola (peso fino a Kg. 5)	" 50	12	6.000,=
97-1595-	Posizione in opera di tubi, gomiti e canali di lamiera di-ferro zincata di qualunque specie dell'Amm. Militare	" 200	16,50	3.300,=
98-1596-	Posizione in opera di condutture di ferro di qualunque diametro e con qualsiasi giunto dell'Amm. Militare	" 100	25	2.500,=

0190

84-1038-	Posizione in opera di sifone di ghisa grande	"	40	100	4.000,=
85-1039-	Posizione in opera di sifone di ghisa piccolo	"	10	80	800,=
86-1040-	Posizione in opera di sifone di piombo inodore con viti di ottone di scarico	"	18	1040	18.720,=
87-1041-	Posizione in opera di cappa da camino di ardesia artificiale	"	9	55	531,=
88-1043-	Posizione in opera di cucina economica di ghisa di ferro	"	1	135	135,=
89-1045-	Posizione in opera di scaldabagno di qualsiasi tipo e dimensione	Kg. 300	2		600,=
90-1045-	Posizione in opera di mensole di ghisa smaltata per lavabi	n° 10	320		3.200,=
91-1083-	Lavandini di marmo (sciacquatoi) di forma ordinaria rettangolare con dimensioni interne minime di cm. 60x40x20	ciasc. 40	120		4.800,=
92-1586-	Ferramenta fucinata del 1° genere	"	1	3700	3.700,=
93-1587-	Idem del 2° genere	Kg. 30	100		3.000,=
94-1588-	Idem del 3° genere	" 300	115		34.500,=
95-1593-	Posizione in opera di ferramenta mezza na dell'Amm.ne Militare peso da oltre Kg. 5 a 100	" 40	130		5.200,=
96-1594-	Idem piccola (peso fino a Kg. 5)	" 120	9		1.080,=
97-1595-	Posizione in opera di tubi, gomiti e canali di lamiera di-ferro zincata di qualunque specie dell'Amm. Militare	" 50	12		6.000,=
98-1596-	Posizione in opera di condutture di ferro di qualunque diametro e con qualsiasi giunto dell'Amm. Militare	" 200	16,50	3.300,=	
99-1599-	Condutture di tubi di ferro senza saldature tipo mannesmann di qualunque diametro	" 100	25		2.500,=
100-1605-	Opere varie con lamiera di ferro zincata	" 200	140		28.000,=
		" 80	105		8.400,=

a riportare

Riporto

101-1613-	Pezzi di ghisa speciale per tubi	Kg. 50	80	400,=
102-1616-	Posizione in opera di tubazioni di ghisa dell'Amm'n. Militare di qualsiasi diametro	" 300	9	2.700,=
103-1620-	Scatole a sifone per collettore di tubazioni di ghisa	ciasc. 20	3240	57.600,=
104-1621-	Tubi di ghisa dritti per grondaie e latrine	Kg. 40	76	3.040,=
105-1696-	Bronzo lavorato del 1° genere	" 10	500	5.000,=
106-1697-	Idem del 2° genere	" 16	605	9.680,=
107-1698-	Bronzo lavorato del 3° genere	" 18	685	12.330,=
108-1701-	Ottone lavorato del 1° genere	" 20	520	10.400,=
109-1702-	Idem del 2° genere	" 40	605	24.200,=
110-1703-	Idem del 3° genere	" 6	685	4.110,=
111-1706-	Rubinetto tipo carloni da 1/2 pollice ciasc	20	300	6.000,=
112-1708-	Rubinetto di erogazione	Kg. 12	850	10.200,=
113-1709-	Rubinetto di arresto di ottone nichelato	" 15	900	14.500,=
114-1710-	Rubinetto di erogazione nichelato	" 13	950	12.350,=
115-1711-	Boccioni di ottone cromato con braccio, cipolla e rosetta	" 10	1125	11.250,=
116-1712-	Rubinetto di ottone a pressione	" 32	980	31.360,=
117-1713-	Rubinetto di erogazione a snodo di ottone cromato o nichelato	" 15	1440	21.600,=
118-1714-	Gruppi miscelatori per bagno di ottone cromato o nichelato	" 10	1800	18.000,=
119-1715-	Scatola cilindrica di ispezione per impianti sanitari con coperchio a vite del diametro fino a cm.15	ciasc.12	720	8.640,=
120-1716-	Posizione in opera di oggetti di bronzo, ottone e rame dell'Amm.ne Militare	Kg.120	50	6.000,=
121-1719-	Bocchettone di piombo per grondaie e latrine	" 250	135	33.750,=
122-1720-	Cassette di distribuzione per impianti idrici	" 130	200	26.000,=
123-1721-	Lastre di piombo lavorato per opere varie	" 110	130	14.300,=

e latrine		Kg. 40	75	3.040,=
105-1696-	Bronzo lavorato del 1° genere	" 10	500	5.000,=
106-1697-	Idem del 2° genere	" 16	605	9.680,=
107-1698-	Bronzo lavorato del 3° genere	" 18	685	12.330,=
108-1701-	Ottone lavorato del 1° genere	" 20	520	10.400,=
109-1702-	Idem del 2° genere	" 40	605	24.200,=
110-1703-	Idem del 3° genere	" 6	685	4.110,=
111-1706-	Rubinetto tipo carloni da $\frac{1}{2}$ pollice cias20		300	6.000,=
112-1708-	Rubinetto di erogazione	Kg. 12	850	10.200,=
113-1709-	Rubinetto di arresto di ottone nichelato	" 15	900	14.500,=
114-1710-	Rubinetto di erogazione nichelato	" 13	950	12.350,=
115-1711-	Boccioni di ottone cromato con braccio, cipolla e rosetta	" 10	1125	11.250,=
116-1712-	Rubinetto di ottone a pressione	" 32	980	31.360,=
117-1713-	Rubinetto di erogazione a snodo di ottone cromato o nichelato	" 15	1440	21.600,=
118-1714-	Gruppi miscelatori per bagno di ottone cromato o nichelato	" 10	1800	18.000,=
119-1715-	Scatola cilindrica di ispezione per impianti sanitari con coperchio a vite del diametro fino a cm.15	ciasc.12	720	8.640,=
120-1716-	Posizione in opera di oggetti di bronzo, ottone e rame dell'Amm.ne Militare	Kg.120	50	6.000,=
121-1719-	Bocchettone di piombo per grondaie e latrine	" 250	135	33.750,=
122-1720-	Cassette di distribuzione per impianti idrici	" 130	200	26.000,=
123-1721-	Lastre di piombo lavorato per opere varie	" 110	130	14.300,=
124-1724-	Tubi di piombo rasenti	" 180	78	14.040,=
125-1725-	Tubi di piombo incassati	" 200)	90	18.000,=
a riportare				

Riporto					
126-	E - Caldaie in acciaio mq.2,10	ciasc.	1	69500	69.500,=
127-	E - Un boiler in lamiera acciaio zincato da litri 500	"	1	57200	57.200,=
128-	E - Un vaso di espansione da lt.30	"	1	2000	2.000,=
129-	E - Distribuzione di tubazioni di ferro	ml.	50	200	10.000,=
130-	E - Sifonico scaricatori automatico di ghisa porcellanata o terraglia porcellanata	ciasc.	1	15000	15.000,=
131- 463-	Elementi di ghisa per termosifone mq. 30		30	880	26.400,=
132-	E - Fornitura e posa in opera di elementi di caldaia in sostituzione di quelli rotti	ciasc.	6	10000	60.000,=
T o t a l e				L.	1.737.556,=
Imprevisti				"	62.444,=
Ammontare dell'estimativo				L.	1.800.000,=
=====					

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten.Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barela)

CONDIZIONI TECNICHE

Nel somministrare i materiali, le giornaliere, i noleggi e gli articoli di lavoro previsti dall'estimativo o dalla tariffa inseriti nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico generale, approvato con R.Decreto 17.3.1932.-

E poichè nell'estimativo e nella tariffa sono compresi articoli che non figurano nel capitolato annesso al contratto sopra citato resta stabilito inoltre quanto segue:

1) Caldaia in acciaio mq.2,10 (art.126 dell'estimativo)

Resta stabilito che la Direzione Lavori si riserva la facoltà di scegliere un tipo di caldaia, tra quelli che sottoporrà l'impresa, più corrispondente allo scopo.-

La caldaia dovrà essere completa di rubinetteria, attrezzi e termometro e data in opera perfettamente funzionante.-

2) Un boiler in lamiera acciaio zincato da lt.500 (art.127)

Sarà data in opera completo di serpentino interno, rubinetteria di scarico, valvola da 1½ e mensole.-

3) Un vaso di espansione (art.128 dell'estimativo)

Sarà munito di rubinetto a galleggiante, rubinetto di arresto, e sarà dato in opera completo di ogni accessorio.-

4) Disistruzione di tubazioni di ferro (art.129 dell'estimativo)

Nel prezzo dell'articolo sono compresi tutti gli oneri per lo smontaggio e rimontaggio dei tubi, la battitura del tubo per la uscita del materiale ivi fermatosi nonchè la prova per il perfetto passaggio di liquido attraverso le condutture.-

5) Sifonic o scaricatore automatico di ghisa porcellanata o terraglia porcellanata (art.130 dell'estimativo)

Sarà completo di coperchio, di galleggiante, leva, rubinetto.- Sarà del tipo reperibile nel commercio e preventivamente alla posa in opera è compresa nel prezzo dell'articolo, sarà sottoposto alla approvazione della Direzione Lavori.-

6) Elementi di ghisa per termosifoni (art.131 dell'estimativo)

Saranno del tipo di quelli esistenti nella caldaia esistente. Nel prezzo dell'articolo è compresa la posa in opera.-

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten.Col. P. Colimodio)

L'UFFICIALE DIRETTORE

li che non figurano nel capitolato annesso al contratto sopra citato resta stabilito inoltre quanto segue:

1) Caldaia in acciaio mq.2,10 (art.126 dell'estimativo)

Resta stabilito che la Direzione Lavori si riserva la facoltà di scegliere un tipo di caldaia, tra quelli che sottoporrà l'impresa, più corrispondente allo scopo.-

La caldaia dovrà essere completa di rubinetteria, attrezzi e termometro e data in opera perfettamente funzionante.-

2) Un boiler in lamiera acciaio zincato da lt.500 (art.127)

Sarà data in opera completo di serpentino interno, rubinetteria di scarico, valvola da 1½ e mensole.-

3) Un vaso di espansione (art.128 dell'estimativo)

Sarà munito di rubinetto a galleggiante, rubinetto di arresto, e sarà dato in opera completo di ogni accessorio.-

4) Disistruzione di tubazioni di ferro (art.129 dell'estimativo)

Nel prezzo dell'articolo sono compresi tutti gli oneri per lo smontaggio e rimontaggio dei tubi, la battitura del tubo per la uscita del materiale ivi fermatosi nonchè la prova per il perfetto passaggio di liquido attraverso le condutture.-

5) Sifonic o scaricatore automatico di ghisa porcellanata o terraglia porcellanata (art.130 dell'estimativo)

Sarà completo di coperchio, di galleggiante, leva, rubinetto.- Sarà del tipo reperibile nel commercio e preventivamente alla posa in opera è compresa nel prezzo dell'articolo, sarà sottoposto alla approvazione della Direzione Lavori.-

6) Elementi di ghisa per termosifoni (art.131 dell'estimativo)

Saranno del tipo di quelli esistenti nella caldaia esistente. Nel prezzo dell'articolo è compresa la posa in opera.=

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barela)

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten.Col. P. Colimodio)

12621

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

Nell'esecuzione dei lavori e delle somministrazioni previste dal presente capitolo saranno osservate le condizioni generali per l'appalto dei lavori dal genio militare approvato con R.Decreto 17.3.932.-

In particolare è stabilito quanto segue:

- 1) I lavori dovranno essere compiuti nei termini di giorni 50 dalla data di cominciameto compresi fra gli utili anche i giorni festivi.- I giorni in cui sono redatti i verbali di cominciameto, sospensioni, riprese e compimento dei lavori, non sono conteggiati fra quelli utili.-
- 2) In caso di ritardo nell'eseguimento dei lavori la penale è fissata in lire 18.000 per ogni sette giorni di ritardo da computarsi solo se i sette giorni sono compiuti.-
- 3) Gli acconti da corrispondersi all'appaltatore con le modalità prescritte dalle condizioni generali di appalto sopracitate non potranno essere inferiori a lire 600.000.-
- 4) Il limite massimo a cui si potranno ordinare i trasporti di cui all'art.23 delle condizioni generali sopracitate sarà di Km. misurabili sullo sviluppo di qualunque strada percorribile dai carri.
- 5) La cauzione da prestarsi ai sensi dell'art.6 delle citate condizioni generali resta fissata in lire 90.000.-
- 6) La ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc.).- Qualora il competente Ispettorato Corporativo segnali l'infrazione della ditta agli obblighi di cui sopra, i pagamenti sia in conto che a saldo di cui all'art.3, saranno ridotti alla misura dell'80% del dovuto, ed il residuale 20% rimarrà sospeso fintantochè non sia stata definita coi competenti organi ogni conseguenza derivante dall'inadempienza di cui sopra, nè la ditta potrà pretendere per ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo.-

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barela)

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten.Col. P. Colimodio)

riprese e compimento dei lavori, non sono conteggiati fra quelli utili.
li.-

2) In caso di ritardo nell'eseguimento dei lavori la penale è fissata in lire 18.000 per ogni sette giorni di ritardo da computarsi solo se i sette giorni sono compiuti.-

3) Gli acconti da corrispondersi all'appaltatore con le modalità prescritte dalle condizioni generali di appalto sopracitate non potranno essere inferiori a lire 600.000.-

4) Il limite massimo a cui si potranno ordinare i trasporti di cui all'art.23 delle condizioni generali sopracitate sarà di Km. misurabili sullo sviluppo di qualunque strada percorribile dai carri.

5) La cauzione da prestarsi ai sensi dell'art.6 delle citate condizioni generali resta fissata in lire 90.000.-

6) La ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc.).- Qualora il competente Ispettorato Corporativo segnali l'infrazione della ditta agli obblighi di cui sopra, i pagamenti sia in conto che a saldo di cui all'art.3, saranno ridotti alla misura dell'80% del dovuto, ed il residuale 20% rimarrà sospeso fintantochè non sia stata definita coi competenti organi ogni conseguenza derivante dall'inadempienza di cui sopra, nè la ditta potrà pretendere per ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo.-

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barela)

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten.Col. P. Colimodio)

11320

Mod. N. 18.
ISTRUZ. PER IL SERVIZIO DEI LAVORI
E DEL MATERIALE DEL GENIO MILITARE
(§ 189)

N. 1678 (581) del Catal.
(R. 1935)

(1) 8^a DIREZIONE LAVORI E SERVIZI GENIO ROMA

Sezione _____

Luogo: _____

PROGETTO

per lavori di ripristino di impianto elettrico di illuminazione, forza motrice

e campanello al fabbricato ex palazzo della stampa - sito in Roma - Piazz-

za Colonna

R O M A

IMPORTO L. I. 500.000,00

Tavola N. _____

(2)

Scala nel rapporto di 1 a _____

0 2 0 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND

No. 785020

PROGETTO

per lavori di ripristino di impianto elettrico di illuminazione, forza motrice
e campanello al fabbricato ex palazzo della stampa - sito in Roma - Piazz-
za Colonna

R O M A

IMPORTO L. 1.500.000,00

Tavola N. _____

(2)

Scala nel rapporto di 1 a _____

Il progetto si compone di _____ tavole di disegno

- (1) Direzione lavori, reggimento.
(2) Denominazione delle tavole, cioè pianta, plania del piano terreno ecc., prospetto, sezione, profili particolari di costruzione, ecc.

5° DIREZIONE LAVORI E SERVIZI CIVILI - R O M A

ESTIMATIVO DI SPESA OCCORRENTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DI IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E CAMPANELLO AL PABBRICATO EX PALAZZO DELLA STAMPA - SITO IN ROMA - PIAZZA COLONNA.-

1-	9-	Elettricista per revisione imp.esistente	ore	80	66	5.250,=
2-	23-	Manovale, lavorante d'arte qualunque in aiuto all'elettricista ed al muratore	"	90	60	5.400,=
3-	35-	Muratore per esecuz.fori e ripristino	"	90	65	5.850,=
4-1810-		Impianto interno di luce elettrica con linee secondarie in cordoncino a spirale flessibile di cotone per costruzioni	lamp.	30	750	22.500,=
5-1811-		Impianto interno di luce elettrica con linee principali e secondarie in piattine discenti	"	470	1900	893.000,=
6-1812-		Impianto interno di luce elettrica con linee principali e secondarie in cavo sotto piombo	"	20	2300	46.000,=
7-1814-		Amperometro da quadro elettro-magnetico scale 0-100	ciasc.	2	1000	2.000,=
8-1825-		Cavo sottopiombo tipo telefonico una coppia per campanelli	ml.	1000	38	38.000,=
		n° 2 coppie per campanelli	"	150	52	7.800,=
		" 6 " "	"	200	100	20.000,=
9-1835-		Copricorda terminali in lastre di ottone stampato tipo dritto con foro mm.4	ciasc.	24	50	1.200,=
10-1835-		Copricorda terminali tipo dritto per ogni mm. di diametro in più di mm.4	"	13	4,50	58,50
11-1845-		Diffusore sferico, completo di tige normale cromata da cm.40	"	23	1000	23.000,=
12-1847-		Diffusore sferico, completo di tige normale cromata da cm.3	"	80	800	64.000,=
13-1849-		come sopra da cm.25	"	30	500	15.000,=
14-1850-		Interruttore da quadro da 100 Ampere	"	300	300	90.000,=
15-1833-		Cordoncino a spirale in seta per campane 14 isolati per tensione 150 Volta	ml.	150	15	2.250,=
16-1836-		Commutatore a rotazione porcellana tipo a 5 Ampere 250 Volta	ciasc.	20	60	1.200,=
17-1838-		Commutatore a rotazione tipo da incassare 6 Ampere	"	32	72	2.304,=
18-1843-		Deviatore a rotazione tipo da incassare	"	40	70	2.800,=

5-1811-	Impianto interno di luce elettrica con linee principali e secondarie in piattini biaccate	lamp. 30	750	22.500,=
6-1812-	Impianto interno di luce elettrica con linee principali e secondarie in cavo sotto piombo	"	470 1900	393.000,=
7-1814-	Amperometro da quadro elettro-magnetico scala 0-100	ciasc. 2	1000	2.000,=
8-1825-	Cavo sottopiombo tipo telefonico una coppia per campanelli	ml. 1000	38	38.000,=
	n° 2 coppie per campanelli	"	150	7.800,=
	" 6 "	"	200	20.000,=
9-1835-	Copricorde terminali in lastre di ottone stampato tipo dritto con foro mm.4	ciasc. 24	50	1.200,=
10-1835-	Copricorde terminali tipo dritto per ogni mm. di diametro in più di mm.4	"	13 4,50	58,50
11-1845-	Diffusore sferico, completo di tige normale cromata da cm.40	"	23 1000	23.000,=
12-1847-	Diffusore sferico, completo di tige normale cromata da cm.3	"	80	64.000,=
13-1848-	come sopra da cm.25	"	30	15.000,=
14-1860-	Interruttore da quadro da 100 Ampere	"	300	90.000,=
15-1833-	Cordoncino a spirale in seta per campanelli isolati per tensione 150 Volta	ml. 150	15	2.250,=
16-1836-	Commutatore a rotazione porcellana tipo a 5 Ampere 250 Volta	ciasc. 20	60	1.200,=
17-1838-	Commutatore a rotazione tipo da incassare 6 Ampere	"	32	2.304,=
18-1843-	Deviatore a rotazione tipo da incassare	"	40	2.800,=
19-1852-	Pilo normale per campanelli 8/10 isolati 150 Volta	ml. 1500	3,50	5.250,=
20-1865-	Interruttore a rotazione porcellana da 4 Ampere 250 Volta	ciasc. 52	36	1.872,=

a riportare

1915

Riparto

21-1879-	Lampade elettriche (a scelta della Direz. dei lavori, il prezzo sarà stabilito in base al costo commerciale accertato dell'Amministrazione. Militare ed aumentato del 20%)	ciase. 85	280	23.800,=
	" " 100 h	" 10	220	2.200,=
	" " 60 "	" 154	160	26.240,=
	" " 40 "	" 32	100	3.200,=
22- E	- Fusibili Simens 25 Ampere	" 68	20	1.360,=
23- E	- Interruttori da quadro in porcellana con targhette	" 10	150	1.500,=
24-1939-	Serie per campanelli a carcassa metallica a cicale	" 20	150	3.000,=
25-1940-	Come sopra squillante	" 3	180	1.440,=
26-1949-	Trasformatore monofase per campanelli 30 Watt	" 5	400	2.400,=
27-1913-	Quadro indicatore per campanelli in bachelite tipo Repizzi	" 12	440	5.280,=
28- E	- Testi da incasso per campanelli	" 42	68	2.856,=
29- E	- Tastiera bachelite ad un pulsante	" 15	65	975,=
30- E	- Morsettiere per giunzione cavi a 4 morsetti	" 4	70	280,=
31-1901-	Portalampe a base dritta	" 18	43	774,=
32-1897-	Portalampe Edison	" 12	30	360,=
Totale		L.	1.331.029,50	
Imprevisti		"	168.970,50	
Ammontare dell'estimativo		L.	1.500.000,00	

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten. Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE

VA R I F A Z I O N E

1871 - Interruttore a rotazione unipolare di ghisa stagno tipo da 6 Amp. 250 Volts	ciasc. 1 pezzo	L. 260
1873 - Isolatori di porcellana a roccetto/ da mm. 30x30	" 1	" 11
1876 - Isolatori di porcellana a capanna 55x30	" 1	" 80
1883 - Morzetti di porcellana tondi per scatole di derivazione di diametro mm. 75	" 1	" 83
1885 - Nastro isolatore normale (bianco e nero)	kg. 1	" 500
" - Lampade Golia 300 Watt	n° 1	" 500
" - Smontaggio e riparazione bracci di città a luce diretta e indiretta ivi compresi tutti gli oneri per l'acquisto delle parti mancanti ed il rimontaggio il tutto funzio- nante	ciasc. 1	" 950

1876 - Isolatori di porcellana a coperna 55x80	"	1	"	"	80
1883 - Morzetti di porcellana tondi per scatole di derivazione di cianetrio mm. 75	"	1	"	"	83
1885 - Nastro isolatore normale (bianco e nero)	Kg.	1	"	"	500
" - Lampade Golia 300 Watt	n°	1	"	"	500
" - Smontaggio e riparazione bracci di cittone a luce diretta e indiretta ivi compresi tutti gli oneri per l'acquisto delle parti mancanti ed il rimontaggio il tutto funzio nante	ciasc.	1	"	"	950

1917

CONDIZIONI TECNICHE

Nel somministrare i materiali, le giornaliere, i noleggi e gli articoli di lavoro previsti dall'estimativo o dalla tariffa inseriti nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico generale, approvato con R. Decreto 17.3.1932.

Per poichè nell'estimativo e nella tariffa sono compresi articoli che non figurano nel capitolato emesso al contratto sopra citato resta inoltre stabilito quanto segue:

1) LAVORI COLLA 300 WATT (art.

Saranno del tipo reperibile nel comune commercio o preventivamente alla posa in opera saranno sottoposte all'approvazione della Direzione Lavori.

2) SMONTAGGIO E RIPARAZIONE BRACCI DI OTTONI E LUCI PIUMATI E INFISSITA DEI CONTATTI TUTTI GLI QUERI PER L'ACQUEDOTTO DELLE PIAZZE DI MONTE E IL RIMONTAGGIO IL TUTTO FUNZIONANTE.
(art.

Nell'esecuzione dell'opera saranno osservati tutti gli accorgimenti necessari affinché le parti smantate non subiscano deterioramenti. Nel prezzo dell'articolo sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro perfettamente finito e perfetta regola d'arte e pienamente funzionante.

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Gen. Col. F. Colaninno)

IL COLONNELLO DIRETTORE
(R. Barola)

1) LAVORARE COLLA 300 WATER (art.)

Saranno del tipo reperibile nel comune commercio e provenienti alle pesi in opera saranno sottoposte all'approvazione delle Direzione Lavori.

2) SMONTAGGIO E RIPARAZIONE BRACCI DI OTTONE E LUCE DIRETTA E LADINETTA IVE COMPLETI TUTTI GLI OPERI PER L'ACQUISTO DELLE PARTI SOSTITUTIVE IN UN RIMBORSO IL TUTTO FUNZIONANTE. (art.)

Nell'esecuzione dell'opera saranno osservati tutti gli accorgimenti necessari affinché le parti smontate non subiscano deterioramenti. Nel presso dell'articolo sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro perfettamente finito a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante.

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Gen. Col. P. Colicchio)

IL COLONNELLO DIREZIONE
(R. Birela)

1916

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

Nell'esecuzione dei lavori e delle somministrazioni previste dal presente capitolato saranno osservate le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare con R. Decreto 17 marzo 1932.

In particolare è stabilito quanto segue:

- 1) I lavori dovranno essere compiuti nei termini di giorni 40 dalla data di cominciamento compresi fra gli utili anche i giorni festivi. I giorni in cui sono redatti i verbali di cominciamento, sospensione, ripresa e compimento dei lavori non sono conteggiati fra quelli utili.
- 2) In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori la penale è fissata in L. 15.000, per ogni sette giorni di ritardo da computarsi solo se i sette giorni sono compiuti.
- 3) Gli acconti da corrispondersi all'appaltatore con le modalità previste dalle condizioni generali d'appalto sopra citate non potranno essere inferiori a L. 500.000,=
- 4) Il limite massimo a cui si potranno ordinare i trasporti di cui all'art. 23 delle condizioni generali sopra citate sarà di km. _____ misurabili sullo sviluppo di qualunque strada percorribile dai carri.
- 5) La cauzione da prestarsi ai sensi dell'art. 6 delle citate condizioni generali resta fissata in L. 75.000,=
- 6) La ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'amministrazione che essa dispone a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invece di vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiedenti ellon eredi ecc.) Qualora il competente Ispettorato Corporativo segnali l'infrastazione della ditta agli obblighi di cui sopra, i pagamenti sia in conto che a saldo, di cui all'art. 3, saranno ridotti alla misura dell'80% del dovuto, ed il residuale 20% rimarrà sospeso fintantoché non sia stata definita coi competenti organi ogni conseguenza derivante dall'inadempienza di cui sopra, nè la ditta potrà pretendere per ritardo pagamento del saldo, come alcuna e qualsiasi titolo.

L'UFFICIO LE COMPILAZIONI
(Gen. Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE

- 1) I lavori dovranno essere compiuti nei termini di giorni 40 della data di cominciamento compresi fra gli utili anche i giorni festivi. I giorni in cui sono redetti i verbali di cominciamento, sospensione, ripresa o compimento dei lavori non sono conteggiati fra quelli utili.
- 2) In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori la penale è fissata in L. 15.000, per ogni sette giorni di ritardo da computarsi solo se i sette giorni sono compiuti.
- 3) Gli account da corrispondersi al'appaltatore con le modalità previste dalle condizioni generali d'appalto sopra citate non potranno essere inferiori a L. 500.000,=
- 4) Il limite massimo a cui si potranno ordinare i trasporti di cui all'art. 23 delle condizioni generali sopra citate sarà di km. _____ misurabili sullo sviluppo di qualunque strada percorribile dai carri.
- 5) La cauzione da prestarsi ai sensi dell'art. 6 della citate condizioni generali resta fissata in L. 75.000,=
- 6) La ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'amministrazione che essa compie o tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invece di vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi, e prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni famiglia, indennità ai richiedenti alloggio ecc.) (qualora il competente Ispettorato Corporativo segnali l'inosservanza della ditta agli obblighi di cui sopra, i pagamenti sia in conto che a saldo, di cui all'art. 1), saranno ridotti alla misura dell'80% del dovuto, ed il residuo 20% risulterà sospeso in tutto e per tutto non sia stata definita coi competenti organi ogni conseguenza derivante dall'inosservanza di cui sopra, nè la ditta potrà pretendere per ritardo pagamento del saldo, come alcuno e qualsiasi titolo.

MUNICIPAL COMPTROLLER
(Ten. Col. F. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE
(R. Barela)

1915

Mod. N. 2.
(Art. 23, 24, 25)

N. 1684 (584-A) del Catal.
(R. 1935)

GENIO MILITARE

8° DIREZIONE LAVORI E SERVIZI GIUNIO ROMA

B. O. W. A.

CAPITOLATO

A QUANTITA' ⁽²⁾ DETERMINATE

ai riattamento del fabbricato a quattro piani in più scantinati adì
per lavori

bito una volta a circolo stampa fascio italiano sito in piazza

Colonna n. 365 Roma

in R O W A

per l'importo di lire 3.900.000,00

IL CAPITOLATO E' COMPOSTO:

- a) di un ~~estimativo~~ ⁽³⁾ ~~codice~~ ^{tariffario};
- b) delle condizioni tecniche ;
- c) delle condizioni amministrative.

CAPITOLATO

A QUANTITA' ⁽²⁾ DETERMINATE

per lavori di riattamento del fabbricato a quattro piani in più scantinati ad
bito una volta a circolo stampa fascio italiano sito in piazza

Colonna n. 365 Roma

in R O M A

per l'importo di lire 3.900.000,00

IL CAPITOLATO E' COMPOSTO:

- a) di un estimativo ~~edificatorio~~ ⁽¹⁾
- b) delle condizioni tecniche;
- c) delle condizioni amministrative.

1914

(1) Ente compilatore del progetto.

(2) Od Indeterminate.

(3) Per capitoli a quantità indeterminate si cancellano le parole: « un estimativo e di ».

8. DIREZIONE LAVORI E SERVIZI GENIO - R O M A

ESTIMATIVO DI SPESA OCCORRENTE PER LAVORI DI RIATTAMENTO DEL
FABBRICATO A QUATTRO PIANI PIU' SCANTINATI ADIBITO UNA VOLTA
A CIRCOLO STAMPA FASCIO ITALIANO SITO IN PIAZZA COLONNA 365
- ROMA -

1 -	3 -	Falegname (per riparazione porte)	ore	80	63	5.440,=
2 -	4 -	Aiuto carpentiere, aiuto falegname	"	30	67	5.360,=
3 -	5 -	Cementista riparazione pavimenti	"	60	67	4.020,=
4 -	23 -	Manovale per sgombero materiali	"	60	60	3.600,=
5 -	35 -	Muratore per rimuovere codette	"	60	65	3.900,=
6 -	37 -	Parchettista ripar.pavim.in legno	"	200	75	15.000,=
7 -	38 -	Pittore di 1 ^a categoria per ripa- razioni lavori ornamentali	"	200	70	14.000,=
8 -	340 -	Abete in travi riquadrati o filo vivo di qualunque sezione o lun- ghessa esistente in commercio (in sostituzione di quelli fradici ai pavimenti)	mq.	1	17.500	17.500,=
9 -	349 -	Compensato di noce nostrale spes- sore da mm.4 a 20 per ripresa pa- reti in compensato	mq.	10	600	6.000,=
10 -	565 -	Lastre di vetro e del semiperime- tro da cm.50 a 70 (per sostituire quelli rotti)	mq.	10	1.100	11.000,=
11 -	566 -	Lastre di vetro semplici e del se- miperimetro da cm.71 a 90 (per so- stituire quelli rotti e mancanti)	"	13	1.150	14.950,=
12 -	567 -	Lastre di vetro semplici e del se- miperimetro da cm.91 a 110 (in so- stituzione di rotti e mancanti)	"	15	1.200	18.000,=
13 -	568 -	Lastre di vetro semplici e del se- miperimetro da cm.111 a 135 (in sostituz. di rotti e mancanti)	"	18	1.250	22.500,=
14 -	569 -	Lastre di vetro semplici e del se- miperimetro da cm.136 a 170 (in sostituz. di rotti e mancanti)	"	20	1.300	46.000,=
15 -	572 -	Lastre di vetro a $\frac{1}{2}$ cristallo del lo spessore da mm.4 a 5 in lastre di superficie superiore a mq.0,50 (limite escluso) in sostituzione di quelli rotti e mancanti	"	2	10.000	20.000,=

3 - 5 - Cementista riparazione pavimenti	"	60	60	3.600,=
4 - 23 - Manovale per sgombero materiali	"	60	60	3.600,=
5 - 35 - Muratore per rimurare codette	"	60	65	3.900,=
6 - 37 - Parchettista ripar.pavim.in legno	"	200	75	15.000,=
7 - 38 - Pittore di 1 ^a categoria per riparazioni lavori ornamentali	"	200	70	14.000,=
8 - 340 - Abete in travi riquadrati o filo vivo di qualunque sezione o lunghezza esistente in commercio (in sostituzione di quelli fradici ai pavimenti)	mc.	1	17.500	17.500,=
9 - 349 - Compensato di noce nostrale spessore da mm.4 a 20 per ripresa pareti in compensato	mq.	10	600	6.000,=
10 - 565 - Lastre di vetro e del semiperimetro da cm.50 a 70 (per sostituire quelli rotti)	mq.	10	1.100	11.000,=
11 - 566 - Lastre di vetro semplici e del semiperimetro da cm.71 a 90 (per sostituire quelli rotti e mancanti)	"	13	1.150	14.950,=
12 - 567 - Lastre di vetro semplici e del semiperimetro da cm.91 a 110 (in sostituzione di rotti e mancanti)	"	15	1.200	18.000,=
13 - 568 - Lastre di vetro semplici e del semiperimetro da cm.111 a 135 (in sostituzione di rotti e mancanti)	"	18	1.250	22.500,=
14 - 569 - Lastre di vetro semplici e del semiperimetro da cm.136 a 170 (in sostituzione di rotti e mancanti)	"	20	1.300	46.000,=
15 - 572 - Lastre di vetro a $\frac{1}{2}$ cristallo dello spessore da mm.4 a 5 in lastre di superficie superiore a mq.0,50 (limite escluso) in sostituzione di quelli rotti e mancanti	"	2	10.000	20.000,=
16 - 575 - Lastre di vetro rigato da copertura in sostituzione di quelli rotti sopra il tetto dei gabinetti	"	5	2.000	10.000,=

a riportare

1913

Riporto

17 - 576 - Lastre di vetro stampato per sostituire quelli rotti	mq.	10	2300	28.000,=
18 - 812 - Demolizione di muri grossi per demolire murature ingombranti nei locali	mc.	3	300	900,=
19 - 813 - Demolizione di muri mezzani per demolire tratti di muratura alle docce e riapertura vani	mq.	2	100	200,=
20 - 814 - Demolizione di muri sottili per apertura finestre chiuse	"	6	60	360,=
21 - 815 - Demolizione di muri di costa per riapertura vani	"	4	32	128,=
22 - 822 - Demolizione di accoltellati e di battuti per ricostruire pavimenti deteriorati	"	80	40	3.200,=
23 - 823 - Demolizione di impianti per ricostruzione pavimenti consumati e deteriorati nei vari piani	"	420	30	12.600,=
24 - 827 - Demolizione di soffitti volte o tramezzi in camera a canna o rete metallica per ricostruire i soffitti pericolanti	"	300	25	7.500,=
25 - 830 - Demolizione di piccola armatura di legname per ricostruire tratti di solaio in legno pericolanti	ml.	400	4	1.600,=
26 - 831 - Demolizione di assi per togliere le tavole fradice ai solai	mq.	200	21	4.200,=
27 - 833 - Raschiatura di pareti per togliere i vecchi strati di tinteggiatura screpolati alle pareti dei vari piani	mq. 10.000	4		40.000,=
28 - 837 - Rimozione d'opera di pietra da taglio in lastre per togliere le lastre rotte e mancanti ai gradini e soglie	"	20	170	3.400,=
29 - 838 - Rimozione di pietra da taglio ornata per togliere i tratti di lastre rotte ai basamenti	"	2	1730	3.460,=
30 - 839 - Rimozione di chiusure di legname grandi per rimuovere le grappe e le codette e rimettere in quadro gli infissi di porte e finestre				

20 - 314 - Demolizione di muri sottili per apertura finestre chiuse	"	6	60	360,=
21 - 315 - Demolizione di muri di coata per riapertura vani	"	4	32	128,=
22 - 322 - Demolizione di accollati e di battuti per ricostruire pavimenti deteriorati	"	80	40	3.200,=
23 - 323 - Demolizione di impiantati per ricostruzione pavimenti consumati e deteriorati nei vari piani	"	420	30	12.600,=
24 - 327 - Demolizione di soffitti volte o tramezzi in camera a canna o rete metallica per ricostruire i soffitti pericolanti	"	300	25	7.500,=
25 - 330 - Demolizione di piccola armatura di legname per ricostruire tratti di solaio in legno pericolanti	ml.	400	4	1.600,=
26 - 331 - Demolizione di assiati per togliere le tavole fradice ai solai	mq.	200	21	4.200,=
27 - 333 - Raschiatura di pareti per togliere i vecchi strati di tinteggiatura screpolati alle pareti dei vari piani	mq. 10.000	4	40.000,=	
28 - 337 - Rimozione d'opera di pietra da taglio in lastre per togliere le lastre rotte e mancanti ai gradini e soglie	"	20	170	3.400,=
29 - 338 - Rimozione di pietra da taglio ornata per togliere i tratti di lastre rotte ai basamenti	"	2	1730	3.460,=
30 - 339 - Rimozione di chiusure di legname grandi per rimuovere le grappe e le codette e rimettere in quadro gli infissi di porte e finestre fuori squadra	N°	15	215	3.225,=

a riportare

Riporto

31 - 840 - Idem mezzane (scantinato) (piano primo) (p.terreno) (piano secondo) (piano terzo) (piano quarto)	n° " 6 " 9 " 10 " 13 " 11 " 15			
Totale	64	170	10.880,=	
32 - 841 - Idem piccole dal 1° al IV° piano	" 40	125	5.000,=	
33 - 864 - Spicconatura di intonaci dallo scantinato al quarto piano per togliere gli intonaci salnitratati e cadenti e rimettere in opera i maiolicati esportati	mq. 320	15	4.800,=	
34 - 865 - Spurgo di fogne o chievischette grandi; per spurgare fogne intasate da materiale vario	ml. 100	80	8.000,=	
35 - 866 - idem mezzane	" 60	55	3.300,=	
36 - 867 - idem piccole	" 80	40	3.200,=	
37 - 869 - Spurgo, sturatura, pulitura di sifoni, chiusini, bocchettoni, pozzi etc. di qualsiasi materiale tipo e dimensioni	ciasc. 70	90	6.300,=	
38 - 870 - Spurgo di vasi da cesso di qualsiasi tipo	" 40	110	4.400,=	
39 - 871 - Spurgo di colonne di latrine di qualsiasi diametro	ml. 200	65	13.000,=	
40 - 872 - Pulizia di canna fumaria	" 60	27	1.620,=	
41 - 927 - Gettata all'asciutto di calcestruzzo ordinario di cretoni di pozzolana; per ricostruzione di pavimenti deteriorati mq. 300x0,10 =	mc. 30	1350	40.500,=	
42 - 931 - Gettata all'asciutto di calcestruzzo cementizio con Kg. 200 di cemento del tipo 500 Kg. di resistenza; per costruzione pavimenti scantinati mq. 100x0,10 =	mc. 10	2900	29.000,=	
43 - 1010 - Chievischette coperte mezzane per smaltire acque bianche e luride	ml. 13	765	9.945,=	
44 - 1011 - Idem piccole	" 21	560	11.760,=	
45 - 1051 - Risarcimento di lesioni in battuto di asfalto per riparaz. terrazzo	" 100	40	4.000,=	

0222

33 - 864 - Spicconatura di intonaco scario scantinato al quarto piano per togliere gli intonaci salnitratati e cadenti e rimettere in opera i maiolicati asportati	mq. 320	15	4.800,=
34 - 865 - Spurgo di fogne o chiavichette grandi; per spurgare fogne intasate da materiale vario	ml. 100	80	8.000,=
35 - 866 - idem mezzane	" 60	55	3.300,=
36 - 867 - idem piccole	" 80	40	3.200,=
37 - 869 - Spurgo, sturatura, pulitura di sfondi, chiusini, bocchettoni, poz-zetti etc. di qualsiasi materiale tipo e dimensioni	ciasc. 70	90	6.300,=
38 - 870 - Spurgo di vasi da cesso di qualsiasi tipo	" 40	110	4.400,=
39 - 871 - Spurgo di colonne di latrine di qualsiasi diametro	ml. 200	65	13.000,=
40 - 872 - Pulizie di carna fumeria	" 60	27	1.620,=
41 - 927 - Gettata all'asciutto di calcestruzzo ordinario di cretoni di pozzolana; per ricostruzione di pavimenti deteriorati mq. 300x0,10 = mc.	30	1350	40.500,=
42 - 931 - Gettata all'asciutto di calcestruzzo cementizio con Kg. 200 di cemento del tipo 500 Kg. di resistenza; per costruzione pavimenti scantinato mq. 100x0,10 =	mc. 10	2900	29.000,=
43 - 1010 - Chiavichette coperte mezzane per snaltire acque bianche e luride	ml. 13	765	9.945,=
44 - 1011 - Idem piccole	" 21	560	11.760,=
45 - 1051 - Risanamento di lesioni in battuto di asfalto per riparaz. terrazzo	" 100	40	4.000,=
46 - 1052 - Spie di vetro di gesso o cemento per verifica lesioni ai muri perimetrali e di spina	ciasc. 30	50	1.500,=

a riportare

1912

Riporto

47-1067-	Pulitura di pietre e marmi di qualsiasi specie; per pulire i marmi che rivestono i muri	mq. 120	50	6.000,=
48-1069-	Chiusini di travertino con con telaio di 4 pezzi all'interno; per coprire chiusini allo scantinato	" 2	1700	3.400,=
49-1073-	Pavimento, rivestimento o coronamento di muri con lastre di travertino della grossezza di cm.3 a 5	" 4	1170	4.680,=
50-1080-	Masselli di travertino dello spessore superiore a 10 cm. per gradini, stipiti, architravi, cornici etc. lavorati nelle facce viste.- Per sostituire quelli mancanti od inservibili	mc. 1	21000	21.000,=
51-1081-	Gradini di marmo ricavati dalla lastra dello spessore da cm.3; per sostituire gradini rotti	mq. 10	1900	19.000,=
52-1084-	Pavimenti, rivestimento di mura, soglie lisce, lastre di marmo orinatoi, frontoni, sottoporti, zoccolo con qualche battente, con foro, incamerazioni, smussi, arrotondamento di cigli etc. in lastre dello spessore di cm.2 con tutte le facce viste ruotate e pomciate.- Per sostituire quelli rotti e mancanti	" 30	1400	42.000,=
53-1087-	Soglie di marmo di finestra ad un battente dello spessore di cm.3 per sostituire quelle rotte	mq. 6	1850	11.100,=
54-1089-	Soglie di marmo di finestra a due battenti dello spessore di cm.3 per sostituire quelle rotte	" 7	2000	14.000,=
55-1091-	Lucidatura a piombo in lastre di marmo piane o con cornice. Per pulire i marmi in stato sudicio	" 200	180	36.000,=
56-1092-	Ardesia di lavagna in lastre grosse mm.10 per coperture di cornici, tetti in sostituzione di quelle rotte	" 10	400	4.000,=
57-1100-	Intonaco di malta di calce dolce su superfici piane e curve. Per intonaco pareti di vari piani	" 200	105	21.000,=
58-1102-	Intonaco di malta su superfici piane e curve per rappezzi, quantità vedi	" 320	135	43.200,=

di muri con lastre di travertino della la grossezza di cm.3 a 5	"	4	1170	4.680,=
50-1080- Masselli di travertino dello spessore superiore a 10 cm. per gradini, stipi- ti, architravi, cornici etc. lavorati nelle facce viste.- Per sostituire quelli mancanti od inservibili	mc.	1	21000	21.000,=
51-1081- Gradini di marmo ricavati dalla la- stra dello spessore da cm.3; per sostitui- re gradini rotti	mq.	10	1900	19.000,=
52-1084- Pavimenti, rivestimento di mura, soglie liscie, lastre di marmo orinatoi, fron- toni, sottogradini, zoccolo con qualche battente, con foro, incamerazioni, smus- si, arrotondamento di cigli etc. in la- stre dello spessore di cm.2 con tutte le facce viste ruotate e pomciate.- Per sostituire quelli rotti e mancanti	"	30	1400	42.000,=
53-1087- Soglie di marmo di finestra ad un bat- tente dello spessore di cm.3 per so- stituire quelle rotte	mq.	6	1850	11.100,=
54-1089- Soglie di marmo di finestra a due bat- tenti dello spessore di cm.3 per so- stituire quelle rotte	"	7	2000	14.000,=
55-1091- Lucidatura a piombo in lastre di mar- mo piane o con cornice. Per pulire i marmi in stato sudicio	"	200	180	36.000,=
56-1092- Ardesia di lavagna in lastre grosse mm.10 per coperture di cornici, tetti in sostituzione di quelle rotte	"	10	400	4.000,=
57-1100- Intonaco di malta di calce dolce su superfici piane e curve. Per intonaco pareti de vari piani	"	200	105	21.000,=
58-1102- Intonaco di malta su superfici piane e curve per rappezzi, quantità vedi articolo 864	"	320	135	43.200,=
59-1110- Intonaco sagomato con malta idraulica per ricostruire le volte e per ripre- sa intonaci alle volte	"	200	440	88.000,=

a riportare

Riparto

60-1111-	Intonaco in risalto per lesena zoccoli, bugne, con malta idraulica	mq.150	295	44.250,=
61-1133-	Soffitti in pieno di rete metallica o stuoie di canna e malta bestarda per intonacare i soffitti	" 140	375	52.500,=
62-1161-	Cappa grossa cm.2 anche bocciardata e riquadrata. Per pavimenti piano scantinato e piano terreno	" 80	145	11.600,=
63-1172-	Impiantiti di mattonelle lisce o ruvide di argille greificate rettangolare, quadrate e poligonali di colore rosso miste a mattonelle di altro colore qualsiasi a richiesta della direzione dei lavori nelle proporzioni di uno ad uno circa. Per ricostruire parti di pavimenti inservibili nei vari piani	" 100	650	65.000,=
64-1176-	Impiantito di campiane arrostate da terrazzo; per riparazione terrazzo	" 40	285	11.400,=
65-1180-	Impiantito di marmette a mosaico alla veneziana ad un colore. Per ricostruire pavimenti inservibili	" 160	620	99.200,=
66-1181-	Idem a due colori	" 150	665	99.750,=
67-1182-	Idem a tre colori	" 80	775	62.000,=
68-1183-	Impiantito di mattonelle di cemento unicolore pressato nei locali dei vari piani	" 160	485	77.600,=
69-1186-	Impiantito di pietrini di cemento ad alta resistenza per pavimenti carreggiabili dello spessore cm.2,5 a 3,5	" 120	480	57.600,=
70-1197-	Impiantito di tavolette di rovere o faggio	" 80	800	64.000,=
71-1217-	Surrogazione di tavolette di faggio bis o rovere	ciasc. 200	50	10.000,=
72-1203-	Rivestimento di muri con mattonelle di maiolica di 1° scelta; per ricostruire maiolicati nei vari bagni e docce e latrine situati nei vari piani	mq.250	1350	337.500,=
73-1204-	Idem di 11° scelta	" 180	1200	216.000,=
74-1207-	Surrogazione di impiantiti di campiane arrostate da terrazze per sostegni			

scantinato e piano terreno

63-1172-	Impiantiti di mattonelle lisce o ruvide di argilla greificata rettangolare, quadrate e poligonali di colore rosso miste a mattonelle di altro colore qualsiasi a richiesta della direzione dei lavori nelle proporzioni di uno ad uno circa. Per ricostruire parti di pavimenti inservibili nei vari piani	"	100	650	65.000,=
64-1176-	Impiantito di campigiane arrostate da terrazzo; per riparazione terrazzo	"	40	285	11.400,=
65-1180-	Impiantito di marmette a mosaico alla veneziana ad un colore. Per ricostruire pavimenti inservibili	"	160	620	99.200,=
66-1181-	Idem a due colori	"	150	665	99.750,=
67-1182-	Idem a tre colori	"	80	775	62.000,=
68-1183-	Impiantito di mattonelle di cemento unicolore pressato nei locali dei vari piani	"	160	485	77.600,=
69-1186-	Impiantito di pietrini di cemento ad alta resistenza per pavimenti carreggiabili dello spessore cm. 2,5 a 3,5	"	120	480	57.600,=
70-1197-	Impiantito di tavolette di rovere o faggio	"	80	800	64.000,=
71-1217-	Surrogazione di tavolette di faggio bis o rovere	ciasc.	200	50	10.000,=
72-1203-	Rivestimento di muri con mattonelle di maiolica di 1° scelta; per ricostruire maiolicati nei vari bagni e docce e latrine situati nei vari piani	mq.	250	1350	337.500,=
73-1204-	Idem di II° scelta	"	180	1200	216.000,=
74-1207-	Surrogazione di impiantiti di campigiane arrostate da terrazze per sostituire quelle rotte saltuariamente nelle terrazze	ciasc.	200	14,50	2.900,=
75-1208-	Idem di argilla greificate di qualsiasi specie	"	360	12	4.320,=

a riportare **1911**

Riparto

76-1210-	Idem di marmette a mosaico alla veneziana ad un colore	clase. 200	35	7.000,=
77-1213-	Idem negli impiantiti di mattonelle di cemento unicolori	" 150	28	4.200,=
78-1215-	Surrogazione negli impiantiti di pietrini rettangolari o quadrati o poligonali	" 300	53	15.900,=
79-1219-	Lucidatura a piombo di pavimenti. Per pulire tutti i pavimenti in legno e marmette	mq. 1800	50	90.000,=
80-1221-	Raschiatura e pulitura di impiantiti di legno	" 1000	36	36.000,=
81-1224-	Pavimenti a getto alla veneziana semiplici. Per pavimenti ai cessi, bagno e docce situati nei vari piani	" 50	585	34.250,=
82-1308-	Costruzione di armature di fusti travicelli e travi di legno dolce a connessione sciolta - quantità vedi articolo 340	mc. 1	720	720,=
83-1335-	Imposte di porte e scuri di finestre armate di tavole di abete grosse cm. 3,5. Per ricostruire porte mancanti ed inservibili	mq. 10	2275	22.750,=
84-1361-	Imposte di porte e scuri di finestre con specchi lisci di tavole di castagno o abete dello spessore fino a cm. 3	" 15	2025	30.375,=
85-1388-	Invetriate o sportelli a vetri di finestre di tavole di castagno o abete grosse cm. 4	" 9	2340	21.060,=
86-1515-	Rimesse in sesto di imposte di porte e finestre ad una o più partite del tipo grande	clase. 80	450	36.000,=
87-1516-	Idem mezzane	" 50	325	16.250,=
88-1517-	Idem piccole	" 60	235	14.100,=
89-1518-	Rimesse in sesto di persiane complete	" 40	380	15.200,=
90-1587-	Perramenta fucinata del 2° genere	Kg. 80	100	8.000,=
91-1588-	Idem del terzo genere	" 100	115	11.500,=
92-1632-	Cerniere a biella od in grossezza con ghiaie ed anelli di ottone di lama alta da cm. 13 a 16	n° 120	60	7.200,=

79-1219-	Lucidatura a piombo di pavimenti. Per pulire tutti i pavimenti in legno e marmette	mq. 1800	50	90.000,=
80-1221-	Reschiatura e pulitura di impiantiti di legno	" 1000	36	35.000,=
81-1224-	Pavimenti a getto alla veneziana sem-plici. Per pavimenti ai cessi, bagno e docce situati nei vari piani	" 50	685	34.250,=
82-1308-	Costruzione di armature di fusti travicelli e travi di legno dolce a connessione sciolta - quantità vedi articolo 340	mc. 1	720	720,=
83-1335-	Imposte di porte e scuri di finestre armate di tavole di abete grosse cm. 3,5. Per ricostruire porte mancanti ed inservibili	mq. 10	2275	22.750,=
84-1361-	Imposte di porte e scuri di finestre con specchi lisci di tavole di castagno o abete dello spessore fino a cm. 3	" 15	2025	30.375,=
85-1388-	Invetriate o sportelli a vetri di finestre di tavole di castagno o abete grosse cm. 4	" 9	2340	21.060,=
86-1515-	Rimessa in sesto di imposte di porte e finestre ad una o più partite del tipo grande	clase. 80	450	36.000,=
87-1516-	Idem mezzane	" 50	325	16.250,=
88-1517-	Idem piccole	" 60	235	14.100,=
89-1518-	Rimessa in sesto di persiane complete	" 40	380	15.200,=
90-1537-	Ferramenta fucinata del 2° genere	Kg. 80	100	8.000,=
91-1538-	Idem del terzo genere	" 100	115	11.500,=
92-1632-	Cerniere a biacca od in grossezza con ghiande ed anelli di ottone di lama alta da cm. 13 a 16	n° 120	60	7.200,=
93-1637-	Catenacci per portone e portoncini di ingresso	Kg. 150	145	21.750,=
94-1640-	Mollette con pomello di ottone e nastro per controsporgenti	clase. 250	60	15.000,=

a riportare

Riporto

95-1389-	Invetrate o sportelli a vetri di finestre di tavole di castagno grosse cm.4,5 scorniciate	mq. 16	2390	38.240,=
96-1391-	Invetrate o sportelli a vetri di finestre di tavole di castagno grosse cm.5 scorniciate	" 13	2430	31.590,=
97-1392-	Invetrate o sportelli a vetri di finestre di tavole di castagno grosse cm.5,5 scorniciate	" 6	2480	19.840,=
98-1393-	Invetrate o sportelli a vetri di finestre di tavole di castagno grosse cm.6 scorniciate	" 9	2520	22.680,=
99-1394-	Mostre semplici di porte e finestre di abete grosse cm.2 larghe cm.4 a 6	ml.250	98	24.500,=
100-1433-	Telai detti a cassettoni per rivestimenti di imbotti di porte e finestre di abete larghi da cm.10 a 18 di spessore da cm.2 a 4	" 10	215	2.150,=
101-1434-	Telai c.s. di spessore da cm.5 a 6	" 30	270	8.100,=
102-1435-	Telai c.s. di castagno larghi cm.10 a 18 e spessore cm.2 a 4	" 40	210	8.400,=
103-1436-	Telai c.s. di spessore da cm.5 a 6	" 100	270	27.000,=
104-1416-	Persiane a stecche fisse di abete	mq. 20	2800	56.000,=
105-1417-	Idem di castagno	" 10	2630	26.300,=
106-1424-	Posizione in opera a qualunque altezza di chiusura di legno di superficie inferiore a mq.3	" 30	145	4.350,=
107-1425-	Posizione in opera a qualunque altezza di chiusura di legno di superficie da mq.3 fino a mq.4	" 40	130	5.200,=
108-1428-	Telai per infissi di abete della sezione retta da cm.50 a 60	ml. 20	200	4.000,=
109-1649-	Manopole di ottone per bussole montate su rosetta	ciasc. 40	122	4.880,=
110-1650-	Idem montate su piastre stampate	" 20	153	3.060,=
111-1652-	Manopole di anticorodal	" 30	100	3.000,=
112-1659-	Serratura a colpo e mandata e cassetta ordinaria	" 50	440	22.000,=
113-1666-	Serratura di sicurezza tipo yale	" 15	1630	24.450,=

cm.515 scorniciate	"	8	2480	19.840,=
98-1393- Invetriate o sportelli a vetri di finestre di tavole di castagno grosse cm.6 scorniciate	"	9	2520	22.680,=
99-1394- Mostre semplici di porte e finestre di abete grosse cm.2 larghe cm.4 a 6	ml.250	98		24.500,=
100-1433- Telai detti a cassettoni per rivestimenti di imbotti di porte e finestre di abete larghi da cm.10 a 18 di spessore da cm.2 a 4	"	10	215	2.150,=
101-1434- Telai c.s. di spessore da cm.5 a 6	"	30	270	8.100,=
102-1435- Telai c.s. di castagno larghi cm.10 a 18 e spessore cm.2 a 4	"	40	210	8.400,=
103-1436- Telai c.s. di spessore da cm.5 a 6	"	100	270	27.000,=
104-1416- Persiane a stecche fisse di abete	mq. 20	2800		56.000,=
105-1417- Idem di castagno	"	10	2630	26.300,=
106-1424- Posizione in opera a qualunque altezza di chiusura di legno di superficie inferiore a mq.3	"	30	145	4.350,=
107-1425- Posizione in opera a qualunque altezza di chiusura di legno di superficie da mq.3 fino a mq.4	"	40	130	5.200,=
108-1428- Telai per infissi di abete della sezione retta da cm.50 a 60	ml. 20	200		4.000,=
109-1649- Manopole di ottone per bussole montate su rosetta	ciasc. 40	122		4.880,=
110-1650- Idem montate su piaetre stampate	"	20	153	3.060,=
111-1652- Manopole di anticorodal	"	30	100	3.000,=
112-1659- Serratura a colpo e mandata e cassetta ordinaria	"	50	440	22.000,=
113-1666- Serratura di sicurezza tipo yale	"	15	1630	24.450,=
114-1738- Posizione in opera di lastre di vetro comune quantità vedi somma art.565-566-567-568-569-572-575-576-- mq.10+13+15+18+20+2+5+10 =	mq. 93	90		8.370,=
a riportare				1910

Riparto

115-1742-	Stuccatura di vetri	ml.	230	27	6.210,=
116-1743-	Imbiancatura preparatoria con latte di calce data col pennello su pareti e soffitto di ambienti alti sino a ml.5 quantità vedi art.833	mq.	10000	3	30.000,=
117-1745-	Tinteggiatura con latte di calce data col pennello a due strati su pareti e soffitti alti sino a ml.5 quantità vedi articolo 833	"	10000	9	90.000,=
118-1747-	Strato eseguito in più del 2° con latte di calce dato con qualsiasi mezzo in ambienti interni alti sino a ml.5	"	35000	4	20.000,=
119-1752-	Fissaggio di tinteggiatura con colore di coniglio dato con pompa	"	10000	3	30.000,=
120-1756-	Tinteggiatura a tempa su intonaci verticali ed orizzontali o su cartta con colori fini in ambienti alti sino a ml.5	"	1500	45	67.500,=
121-1789-	Dissolvimento di vecchie verniciature o coloriture ad olio	"	2000	40	80.000,=
122-1761-	Coloriture ad olio e bianco di zinco con colori ordinari ad uno strato sopra legname o ferramenta	"	800	110	88.000,=
123-1762-	Coloritura ad olio e bianco di zinco ad uno strato sopra intonaci	"	700	125	87.500,=
124-1764-	Coloritura ad olio come sopra a 2 strati compresa preparazione a colore forte sopra intonaci	"	500	163	81.500,=
125-1765-	Coloritura ad olio e bianco di zinco con colori ordinari, per ogni strato in più del secondo su legname, intonaci e ferramenta	"	200	50	10.000,=
126-1766-	Compensso addizionale per le coloriture a colori fini	"	900	8	7.200,=
127-1767-	Coloritura ad encausto con colori fini, compresa la preparazione, a superficie liscia	"	130	245	31.850,=
128-1768-	Idem - a superficie rilevata	"	150	290	43.500,=
129-1769-	Coloritura opaca alla cementite o simili vernici pietrificanti e su-				

118-1747-	Strato eseguito in più del 2° con latte di calce dato con qualsiasi mezzo in ambienti interni alti sino a ml.5	"	75000	4	20.000,=
119-1752-	Fissaggio di tinteggiatura con colla di coniglio dato con pompa	"	10000	3	30.000,=
120-1756-	Tinteggiatura a tempa su intonaci verticali ed orizzontali o su car- ta con colori fini in ambienti al- ti sino a ml.5	"	1500	45	67.500,=
121-1789-	Dissolvimento di vecchie vernicia- ture o coloriture ad olio	"	2000	40	80.000,=
122-1761-	Coloritura ad olio e bianco di zin- co con colori ordinari ad uno stra- to sopra legname e ferramenta	"	800	110	88.000,=
123-1762-	Coloritura ad olio e bianco di zin- co ad uno strato sopra intonaci	"	700	125	87.500,=
124-1764-	Coloritura ad olio come sopra a 2 strati compresa preparazione a col- la forte sopra intonaci	"	500	163	81.500,=
125-1765-	Coloritura ad olio e bianco di zin- co con colori ordinari, per ogni strato in più del secondo su legna- me, intonaci e ferramenta	"	200	50	10.000,=
126-1766-	Compenso addizionale per le colori- ture a colori fini	"	900	8	7.200,=
127-1767-	Coloritura ad encausto con colori fini, compresa la preparazione, a superficie liscia	"	130	245	31.850,=
128-1768-	Idem - a superficie rilevata	"	150	290	43.500,=
129-1769-	Coloritura opaca alla cementito o simili vernici pietrificanti a su- perficie liscia	"	100	195	19.500,=

a riportare

Riporto

130-1770- Coloritura opaca alla cementite
o simili vernici pietrificanti
a superficie rilevata

mq.120	245	29.400,=
	L.	3.469.873,=
Imprevisti	"	430.127,=
Ammontare dell'estimativo	L.	3.900.000,=

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten.Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Parela)

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten.Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Berela)

6061

TARIFE FA

- 263 - Malta bastarda	ES. 1	2650
- 344 - Abete in tavole ml.10 a 25	ES. 1	17500
- 691 - Serbatoi di ardesia artificiale da litri 100	N° 1	1500
- 692 - Serbatoi di ardesia artificiale da litri 200	" 1	2000
- 693 - Serbatoi di ardesia artificiale da litri	" 1	2500
- 697 - Torretta da canino speciale di ardesia artificiale con capello	" 1	1060

- 691 - Serbatoi di ardesia artificiali cicli da litri 100	n° 1	1900
- 692 - Serbatoi di ardesia artificiali cicli da litri 200	n° 1	2000
- 693 - Serbatoi di ardesia artificiali cicli da litri	n° 1	2500
- 697 - Forvretta da camino speciale di ardesia artificiale con ca. pollo	n° 1	1000

N 1908

CONDIZIONI ANNI 1932

Nell'esecuzione dei lavori e delle somministrazioni previste dal presente capitolato saranno osservate le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare approvato con R. Decreto 17 Marzo 1932.-

In particolare è stabilito quanto segue:

- 1) I lavori dovranno essere compiuti nei termini di giorni 80 dalle date di cominciamento compresi fra gli utili anche i giorni festivi. I giorni in cui sono redatti i verbali di cominciamento, sospensione, riprese e compimento dei lavori non sono conteggiati fra quelli utili.-
- 2) In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori la penale è fissata in lire 21.250,.- per ogni settimana (giorni di ritardo da computarsi solo se i sette giorni sono compiuti.-
- 3) Gli esconti da corrispondersi all'appaltatore con le modalità prescritte dalle condizioni generali d'appalto sopracitate non potranno essere inferiori a lire 500.000,.-
- 4) Il limite massimo a cui si potranno ordinare i trasporti di cui all'art. 23 delle condizioni generali sopracitate sarà di Km. 5 misurabili sullo sviluppo di qualunque strada percorribile dai carri.-
- 5) L'esecuzione da prestarsi ai sensi dell'art. 6 delle citate condizioni generali resta fissata in lire 195.000,.-
- 6) La ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari ed richiami alle arti, ecc.).- Qualora il competente Ispettorato Corporativo segnali l'infrazione della ditta agli obblighi di cui sopra, i pagamenti sia in conto che a saldo, di cui all'art. 3, saranno ridotti alla misura dell'80% del dovuto, ed il residuo 20% rimarrà sospeso fintantoche non sia stata definita coi competenti organi ogni conseguenza derivante dall'insoddisfazione di cui sopra, nè la ditta potrà pretendere per ritardato pagamento del saldo, come alcuna a qualsiasi titolo.-

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten. Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE

data di cominciamento compresi fra gli altri giorni sono i giorni seguenti. I giorni in cui sono redatti i verbali di cominciamento, sospensio- ni, riprese e compimento dei lavori non sono conteggiati fra quelli utili.

2) In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori la penale è fissata in lire 31.250,-- per ogni setta giorni di ritardo da computarsi solo se i sette giorni sono compiuti.

3) Gli acconti da corrispondersi all'appaltatore con le modalità prescritte dalle condizioni generali d'appalto sopracitate non potranno essere inferiori a lire 500.000,--.

4) Il limite massimo a cui si potranno ordinare i trasporti di cui all'art. 23 delle condizioni generali sopracitate sarà di Km. 5 minimo e massimo sullo sviluppo di qualunque strada percorribile dai carri.

5) L'esecuzione da prestarsi ai sensi dell'art. 6 della citata condizioni generali resta fissato in lire 195.000,--.

6) La ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari ai ricoverati alle armi, ecc.). Qualora il competente Ispettorato Corporativo segnali l'infrazione della ditta agli obblighi di cui sopra, i pagamenti sia in conto che a saldo, di cui all'art. 1, saranno ridotti alla misura dell'80% del dovuto, ed il residuo 20% rimarrà sospeso fintantochè non sia stata definita coi competenti organi ogni conseguenza derivante dall'inadempimento di cui sopra, nè la ditta potrà pretendere per ritardo pagamento del saldo, come alcuna a qualsiasi titolo.

UFFICIALE COMPILATORE
(Ten. Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barale)

1907

GENIO MILITARE

a) 8^a DIREZIONE LAVORI E SERVIZI GENIO MILITARE

CAPITOLATO

A QUANTITA' ⁽²⁾ DETERMINATE N. 243

per lavori della spesa occorrente per la sistemazione della Villa Vaselli

in Nettuno

in NETTUNO

per l'importo di lire 1.700.000,=

IL CAPITOLATO E' COMPOSTO:

a) di un estimativo ~~ordinario~~ ⁽³⁾ a tariffa ~~XX~~

b) delle condizioni tecniche;

c) delle condizioni amministrative.

CAPITOLATO

A QUANTITA' ⁽²⁾ DETERMINATE N 243

per lavori della spesa occorrente per la sistemazione della Villa Vaselli

in Nettuno

in NETTUNO

per l'importo di lire 1.700.000,-

IL CAPITOLATO E' COMPOSTO:

- a) di un estimativo ~~ex~~ ⁽³⁾ ~~ad~~ ~~una~~ ~~tariffa~~ ~~XX~~
- b) delle condizioni tecniche;
- c) delle condizioni amministrative.

6 LUG 1946

1906

(1) Ente compilatore del progetto.

(2) Od indeterminate.

(3) Per capitoli a quantità indeterminate si cancellano le parole: «un estimativo e di».

Angelo Fioroni



IMPIANTI TERMICI E SANITARI — VENTILAZIONE — ESSICCATOI — FABBRICA CUCINE —



ROMA, 23 LUGLIO 1946
VIA CLAUDIA N. 35 - TELEFONO 70.341
C. P. C. 70.496

SPETT.LE
UFFICIO LAVORI GENIO MILITARE DEL
COMANDO TERRITORIALE DI

R O M A

LAVORO CASERMA MARINA 34^a Station Hospital

Sistemazione della tubazione di condensa.

- 1) Abbandonare la vecchia tubazione esistente nel pavimento. corroso dal tempo e creare una nuova tubazione di condensa. in tubo ferro trafilato mannesman da 1 1/2" a 1" lunghezza circa metri 200
- 2) Aprire un cunicolo nel pavimento lungo il perimetro del fabbricato; allacciare tutte le colonne discendenti di condensa, fino al locale caldaia.
- 3) Il nuovo cunicolo, sarà protetto da lamiera di ferro praticabile con telaio di ferro a squadra, in modo di rendere ispezionabile le tubazioni.

PREVENTIVO di spesa, salvo valutazione
e misure a lavoro ultimato:

1 Tubazione in ferro trafilato mannesman per la tubazione di condensa, circa Kg/ 1150 a	L. 90	103.500,==
Raccordi di ghisa malleabile; T, manicotti, gomiti, nipples ecc/	"	25.000,==
Lavoro di n/ 2 operai meccanici specialisti per la durata di circa 35 giorni a.....	"2000	70.000,==
Trasporto attrezzi e materiale fino sul posto.....	"	8.000,==
Lavoro di n. 2 operai muratori per lo scavo del cunicolo, muratura di mattoni e sistemazione del pavimento- circa giorni 35 a.....	"1500	52.000,==
N. 2400 mattoni zoccoli per il cunicolo, calce, gesso, puzzolana, e trasporto materiale.....	"	32.000,==

1908

Angelo Gioroni

Foglio N. 2

Rifacimento per quanto possibile del pavimento;
sistemazione mattonelle ecc/?.....L. 16.000,==

Lamiera di protezione del cucinico per tutta
la sua lunghezza, circa metri 180
Spessore lamiera m/m 5
Ferro a squadra si spstegno
Totale peso circa Kg. 4000 a....." 110 440.000,==

Verniciatura delle tubazioni con minio....." 15.000,==

Isolazioni caldaie e tubi

Isolazione termica di N. 1 caldaia a Vapore
alta pressione.
Id. Id. di 1 Bollitore.
Lavoro eseguito con lastre di sughero dello spessore
di 35 m/m e plastica, composta di sughero e
amianto e accessori in rete di filo di ferro.

Isolazione di tutte le tubazioni scoperte nel
locale caldaie.

Rappazzi e sistemazione di qualche tratto.
Prezzo totale....." 160.000,==

TOTALE LIRE/ 922.000,==

=====

ESTIMATIVO DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DELLA VILLA
VASELLI IN NETTUNO.

.....

1- 409	Gomiti di lamiera di ferro ecc. raccordo pluviali dei terrazzi	Kg.	10	85	850
2- 445	Tubi di lamiera di ferro zinca ta (galvanizzata) graffiati e saldati per reintegro pluviali mancanti	"	30	110	3300
3- 446	Tubi di ferro zincato per casse sette di scarico Completamento cassette scarica trici	n.	8	85	680
4- 464	Mensole di ghisa smaltata per lavabi Per i lavabi da reintegrare	"	16	115	1840
5- 467	Pezzi speciali di ghisa mallea bile per tubazioni Completamento impianto idrico	Kg.	5	215	1075
6- 475	Vasca da bagno di ghisa porcel lanata Reintegro delle mancanti loca- le I9 e 28	n.	2	5000	10000
7- 565	Lastre di vetro semplice del se 570 miperimetro di ml.0,50 ad oltre 1,70 Reintegro da vetri mancanti e completamento dei nuovi infissi di cui ai seguenti n.65 e 66	mq.	0,59	0,585	
	2 x 0,65 x 0,45	"	2,97	0,296	
	14 x 0,40 x 0,53	mq.	3,56		
	2 x 0,30 x 2,50	"	0,30		
	4 x 1,05 x 2,05	"	8,61		
	4 x 0,95 x 1,05	"	3,99		
	8 x 0,45 x 0,55	"	1,98		
	4 x 0,60 x 3,14	"	2,26		
	2 x 0,70 x 3,14	"	1,54		
	8 x 0,58 x 2,00	"	9,28		
	6 x 1,30 x 3,90	"	30,42		

	racordo pluviali dei terrazzi	Kg.	IO	85	850
2- 445	Tubi di lamiera di ferro zinca ta (galvanizzata) graffiati e saldati per reintegro pluviali mancanti	"	30	110	3300
3- 446	Tubi di ferro zincato per case sette di scarico Completamento cassette scarica trici	n.	8	85	680
4- 464	Mensole di ghisa smaltata per lavabi Per i lavabi da reintegrare	"	16	115	1840
5- 467	Pezzi speciali di ghisa mallea bile per tubazioni Completamento impianto idrico	Kg.	5	215	1075
6- 475	Vasca da bagno di ghisa porcel lanata Reintegro delle mancanti loca- le I9 e 28	n.	2	5000	10000
7- 565	Lastre di vetro semplice del se 570 niperimetro di ml.0,50 ad oltre 1,70 Reintegro da vetri mancanti e completamento dei nuovi infissi di cui ai seguenti n.65 e 66				
	2 x 0,65 x 0,45	mq.	0,59	0,585	
	14x 0,40 x 0,53	"	2,97	0,296	
	2 x 0,30 x 2,50	mq.	3,56		
	4 x 1,05 x 2,05	"	0,30		
	4 x 0,95 x 1,05	"	8,61		
	8 x 0,45 x 0,55	"	3,99		
	4 x 0,60 x 3,14	"	1,98		
	2x 0,70 x 3,14	"	2,26		
	8 x 0,58 x 2,00	"	1,54		
	6 x 1,30 x 3,90	"	9,28		
	4 x 1,05 x 1,85	"	30,42		
	5 x 0,70 x 1,25	"	7,77		
	5 x 0,40 x 0,80	"	0,88		
	0,50 x 1,40	"	1,60		
	0,85 x 1,35	"	0,70		
	3 x 8,40 x 3,14	"	1,15		
		"	0,75		

1904

A riportare

Riparto

6x0,52 x 0,65	mq. 2,03			
22 x 0,40 x 1,95	" 17,16			
2 x 1,00 x 2,30	" 4,60			
2 x 0,40 x 1,50	" 1,20			
6 x 0,45 x 1,45	" 3,92			
6 x 0,40 x 1,50	" 3,60			
	mq. 107,30	mq. 107,30	1040	III 592
8- 605 Serbatoi di cemento armato e reti- nato da 1.500				
per ricostruzione cabina dell'acqua n.	10	3200		32000
9- 632 Lavabo di terraglia porcellanato reintegro dei mancanti nei locali 2-9-I4-I6-I8-I9-28-37	" 8	1580		I 2640
10- 634 Manubrio di porcellana per casset- te scaricatorie				
Completamento cassette si scarico	" 8	36		288
11- 636 Orinatoio di maiolica a becco Completamento locale 29	" 1	1150		II 50
12- 641 Vasi di terraglia porcellanata per cessi ecc.				
Reintegro dei mancanti nei locali 4-9-I4-I6-I9-28-37	" 8	1050		8400
13- 822 Demolizione di accoltellati e di battuti				
Tratto di pavimento nel parco per costruire la cisterna d'arrivo del l'acqua potabile				
3,50 x 200	mq. 700			
Zone del manto d'asfalto danneggiato				
3,00 x 2,50	" 7,50			
15,00 x 0,40	" 6,00			
4,00 x 4,00	16,40			
2 x 1,00 x 1,00	2,00			
	mq. 38,90	mq. 38,90	40	I 556
14- 823 Demolizione d'impiantisti Per scoprire le parti d'asfalto dan- neggiati				
3,40 x 3,00	mq. 10,20			
15,00 x 0,60	" 9,00			
4,40 x 4,40	" 19,36			
2x 1,20 x 1,20	" 2,88			
	mq. 41,44	" 41,44	35	I 450,40

nato da 1.500 per ricostruzione cabina dell'acqua n.					
8- 632	Lavabo di terraglia porcellanato reintegro dei mancanti nei locali 2-9-14-16-18-19-28-37	"	8	1580	12640
10- 634	Manubrio di porcellana per casset- te scaricatorie Completamento cassette di scarico	"	8	36	288
11- 636	Orinatoio di maiolica a becco Completamento locale 29	"	1	1150	1150
12- 641	Vasi di terraglia porcellanata per cessi ecc. Reintegro dei mancanti nei locali 4-9-14-16-19-28-37	"	8	1050	8400
13- 822	Demolizione di accoltellati e di battenti Tratto di pavimento nel parco per costruire la cisterna d'arrivo del- l'acqua potabile 3,50 x 200 mq. 700				
	Zone del manto d'asfalto danneggiato				
	3,00 x 2,50	"	7,50		
	15,00 x 0,40	"	6,00		
	4,00 x 4,00		16,40		
	2 x 1,00 x 1,00		2,00		
		mq.	38,90	40	1556
14- 823	Demolizione d'impiantisti Per scoprire le parti d'asfalto dan- neggiati				
	3,40 x 3,00	mq.	10,20		
	15,00 x 0,60	"	9,00		
	4,40 x 4,40	"	19,36		
	2x 1,20 x 1,20	"	2,88		
		mq.	41,44	35	1450,40
15- 827	Demolizione di soffitti volte ecc. camera canna Per togliere i soffitti e le parti pe- ricolanti				

A Riportare

Riporto

locale	20	3,15 x 3,05	mq.	9,61	
"	19	2,50 x 1,85	"	4,63	
"	22	5,00 x 4,90	"	24,50	
"	21	3,15 x 1,20	"	3,78	
"	23	5,00 x 3,45	"	17,25	
"	17	2,00 x 1,50	"	3,00	
"	36	10,80 x 0,20	"	2,16	
"	"	rappezzi vari	"	4,00	
"	39	2 x 2,50 x 2,00	"	10	
"	"	2,00 x 1,90	"	3,80	
"	40	2,00 x 2,00	"	4,00	
"	"	rappezzi vari	"	6,00	
				mq. 92,73	mq. 92,73
				25	2343,25

I6- 836 Rimozione solo manto di copertura
con fogli di ardesia artificiale
Rinnovazioni coperture locali 39-40
5,50 x 2,50

mq. 13,75 " 13,75 18 247,50

I7- 845 Rimozione tubi di ferro o piombo ecc.
Per ripristino impianto idrico

Kg. 150 4 600

I8- 864 Spicconature intonaci ed arriccia-
ture

Per togliere le parti d'intonaco

staccato e pericolante

soffitto scala 4,10 x 1,80 mq. 7,38

locale n. 9 (1,85 x 2,20) x 2,00 8,10

rappezzi vari " 1,50

9,10 x 1,55 " 14,11

loc. n. 7,80 x 1,55 " 12,09

" 15 3,50 x 2,20 " 10,15

rappezzi vari " 3,00

" 16 3,60 x 1,60 " 5,76

" 17 rappezzi vari " 1,50

" 18 " " 2,00

" 19 2,50 x 0,90 " 2,25

" 8,70 x 1,55 " 13,49

2,50 x 2,10 " 5,25

rappezzi vari " 2,00

" 20 " " 12,00

" 21 4,80 x 1,15 " 5,52

1,90 x 1,00 " 1,90

" 22 rappezzi vari " 2,00

" 23 " " 1,50

" 24 3,50 x 1,60 " 5,60

5,00 x 3,80 " 19,00

1902

A riportare

Riparto

lc.n.	27	I/3 x 5,40 x 3,80 mq.	6,87			
"	"	rappezzi vari	"	3,00		
"	28	II,60 x I,55	17,98			
"	"	rappezzi vari	"	2,00		
"	29	"	"	4,00		
"	"	6,60 x I,50	"	9,90		
"	30	rappezzi vari	"	8,00		
"	31	"	"	10,00		
"	32	"	"	8,00		
"	33	"	"	15,00		
"	34	"	"	12,00		
"	35	"	"	10,00		
"	36	"	"	15,00		
"	37	2,35 x 2,05	"	4,82		
"	"	9,60 x I,60	"	15,36		
"	"	9,60 x I,75	"	16,80		
"	38	rappezzi vari	"	4,00		
"	39	"	"	2,00		
"	40	"	"	10,00		
terrazzo per verticale di						
asfalto						
		28,00 x 0,40	"	11,20		
		5,00 x I,20	"	6,00		
		rappezzi vari	"	10,00		
			mq. 357,43	mq. 357,43	15	3561,45
19- 867	Spurgo di chiavichette piccole					
	Pulitura raccordo degli scarichi		ml. 20	40	800	
20- 869	Spurgo, sturazione ecc. pozzetti sifo- ni ecc.					
	Pulitura pozzetti d'ispezione e si- moni		n. 10	90	900	
21- 871	Spurgo colonne di latrine ecc. Riattivazione colonne di scarico		ml. 50	65	3250	
22- 874 bis	Scavo comune di terra e materiali fino alla profondità di ml. 2,00 Per dar luogo alle cisterne dell'ac- qua potabile 3,50 x 2,00 x 2,00 mc. 14,00 per scoprimto raccordi di fogne 20,00 x 0,50 x 0,50 " 5,00 mc. 19,00 mc. 19			110	2090	
23- 905	Trasporto con qualunque mezzo di terra e materiali alle pubbliche di scari- che distanti Km. 3 3,50 x 2,00 x 2,00 mc. 14,00 mc. 14			270	3780	

[illegible]

A report on

Riparto

25- 927	Gettata all'asciutto di calcestruzzo ordinario di cretoni di pozzolana				
	Ripristino pendenze terrazzi danneggiati				
	3,00 x 2,50 x med. 0,08	mc.	0,60		
	15,00 x 0,40 x " 0,08	"	0,48		
	4,00 x 4,00 x " 0,08	"	1,28		
	2 x 1,00 x 1,00 " 0,08	"	0,16		
	Rinfienco voltina sfondata loc. 23				
	4,00 x 2,00 x 0,10	"	0,80		
	Sondo di fondazione cisterna acqua potabile				
	3,50 x 2,00 x 0,20	"	1,40		
		mc.	4,72	mc.	4,72
				I350	6372
26- 948	Muratura ordinaria di pietrame te- nero e malta idraulica				
	Ricostruzione tratto di parapetto distrutto sul terrazzo 2,00x0,40x 0,90 mc. 0,72	"	0,72	I660	1195,20
27-968	Muratura grossa di mattoni ecc. e malta idraulica				
	Pilestri sostegno serbatoi dell' l'acqua	"	I	3150	3150
28- 974	Muratura mezzana di mattoni Pareti per la cisterna dell'acqua				
	16,50 x 2,00	mq.	33,00	920	30360
29- 980	Muratura sottile di mattoni ecc. Parete scala a chiocciola esterna				
	4,00 x 3,50	mq.	14,00	480	6720
30- 987	Muratura di costa di mattoni ecc. Costruzione di un tramezzo nel lo- cale 3				
	4,85 x 2,60	mq.	12,61		
	Riprese tratti di tramezzi scon- nessi	mq.	13,00		
		mq.	27,61	245	6764,45
31-1001	Ossatura di cornicione ecc. Ricostruzione tratto di cornicione distrutto insieme al parapetto del terrazzo				
	3,00 x 0,40 x 0,40	mc.	0,48	3300	1584
32-1022	Posizione in opera serbatoi ecc.				

2 x 1,00 x 1,00 x 0,00					
Rinfiacco voltina sfondata					
loc. 23					
4,00 x 2,00 x 0,10	"	0,80			
Sondo di fondazione cisterna acqua potabile					
3,50 x 2,00 x 0,20	"	1,40			
	mc.	4,72	mc.	4,72	1350 6372
26- 948 Muratura ordinaria di pietrame te nero e malta idraulica					
Ricostruzione tratto di parapetto distrutto sul terrazzo 2,00x0,40x 0,90 mc. 0,72	"	0,72	I660		1195,20
27--968 Muratura grossa di mattoni ecc. e malta idraulica					
Pilastri sostegno serbatoi dell' l'acqua	"	I	3150		3150
28- 974 Muratura mezzana di mattoni Tavetti per la cisterna dell'acqua					
16,50 x 2,00	"	33,00	920		30360
mq. 33,00					
29- 980 Muratura sottile di mattoni ecc. Parete scale a chiocciola esterna					
4,00 x 3,50	mq.	14,00	480		6720
30- 987 Muratura di costa di mattoni ecc. Costruzione di un tramezzo nel lo cale 3					
4,85 x 2,60	mq.	12,61			
Riprese tratti di tramezzi scon nessi					
	mq.	13,00			
	mq.	27,61	"	27,61	245 6764,45
31-1001 Ossatura di cornicione ecc. Ricostruzione tratto di cornicione distrutto insieme al parapetto del terrazzo					
3,00 x 0,40 x 0,40	mc.	0,48	3300		1584
32-1022 Posizione in opera serbatoi ecc. Per quanto al precedente n.8	n.	10	250		2500
33-1028 Posizione in opera di vasi di mal lica ecc.					
Per quanto al precedente n.12	"		255		2040
A riportare					

Riporto

34- IO30	Posizione in opera di orinatoi a becco Per quanto al precedente n.II	n. I	I45	I45
35- IO3I	Posizione in opera lavabi ecc. Per quanto al precedente n.9	" 8	225	I800—
36- IO33	Posizione in opera vasca da bagno ecc. Per quanto al precedente n.6	" 2	360	720
37- IO49	Risarcimento di lesioni nei muri e volte			

Ripristino pareti e tramezzi

locale	9	ml. IO,00		
"	20	" 8,00		
"	30	" 20,00		
"	32	" I2,00		
"	33	" I8,00		
"	34	" I2,00		
"	35	" 5,00		
"	36	" 20,00		
"	37	" 4,00		
		ml. IO9,00	50	5450

38- IO69 Chiusini di travertino con telai ecc.

Per chiusura vasca arrivo acqua potabile

2 x 0,90 x 0,90	mq. I,62	mq. I,62	I700	2754
-----------------	----------	----------	------	------

39- IO77 Scalini di travertino ecc. grossi

cm.5

Gradini ripiano terrazzo

2x I,30 x 0,35	mq. 0,9I	mq. 0,9I	I440	I3IO,40
----------------	----------	----------	------	---------

40- IO78 Sottogradi di travertino grossezza

cm.5

Per i gradini detti

2 x I,30 x 0,15	mq. 0,39	" 0,39	810	315,90
-----------------	----------	--------	-----	--------

41- IO80 Masselli di travertino spessore superiore ai cm.10

Per gradini ecc.

Gradini a massello per la scala a

chiocciola esterna I2x0,70x0,45x025

mc.0,95

	mc. 0,95	21000	I9950	
--	----------	-------	-------	--

42- IO89 Soglie di marmo di finestre a due battenti spessore cm.3

Soglie finestre locale

I7 - I,10 x 0,15

32 - I,10 x 0,50

	mq. 0,17			
	" 0,55			
	mq. 0,72	mq. 0,72	2000	I440

Ripristino pareti e tramezzi

Locale	9	ml. 10,00			
"	20	" 8,00			
"	30	" 20,00			
"	32	" 12,00			
"	33	" 16,00			
"	34	" 12,00			
"	35	" 5,00			
"	36	" 20,00			
"	37	" 4,00			
		<u>ml. 109,00</u>			
38- I069	Chiusini di travertino con telei ecc. Per chiusura vasca arrivo acqua potabile		ml. 109,00	50	5450
39- I077	Scalini di travertino ecc. grossi cm. 5 Gradini ripiano terrazzo 2x 1,30 x 0,35	mq. 1,62	mq. 1,62	1700	2754
40- I078	Sottogradini di travertino grossezza cm. 5 Per i gradini detti 2 x 1,30 x 0,15	mq. 0,91	mq. 0,91	1440	1310,40
41- I080	Masselli di travertino spessore superiore ai cm. 10 Per gradini ecc. Gradini a massello per la scala a chiocciola esterna 12x0,70x0,45x0,25 mc. 0,95	mq. 0,39	" 0,39	810	315,90
42- I089	Soglie di marmo di finestre a due battenti spessore cm. 3 Soglie finestre locale 17 - 1,10 x 0,15 32 - 1,10 x 0,50		mc. 0,95	21000	19950
43- I094	Ardesia di lavagna grossa 20% coperta cornici ecc. Per ricoperture cornicio pi che lascia no	mq. 0,17 " 0,55 mq. 0,72	mq. 0,72	2000	1440
	ml. 40 x 0,40		mq. 16	16	530
					8480,

A riportare

Ripetto

44- II01	Intonaco con malta idraulica su su- perfici ecc. superiori ad un mq. Rintonascatura pareti danneggiate lc.3 nuovo terrazzo 2x4,85x2,60	mq.25,22	II0 20658
"	scala	"	
" 7	4,10x1,80	" 7,38	
" 9	6,50 x 3,40	" 22,10	
	4,05x2,00	" 8,10	
		mq.62,80	
"15	3,50x2,90	" 10,15	
"16	3,50x1,60	" 5,60	
"18	2,50x0,90	" 2,25	
"19	2,50x2,10	" 5,25	
"21	1,90x1,00	" 1,90	
"24	3,50x1,60	" 5,60	
"25	2,00x1,20	" 2,40	
"27	5,40x3,80	" 20,52	
"37	2,35x2,05	" 4,82	
" "	9,15x1,75	" 16,01	
	sul muro da ricostruzione in terrazzo	" 4,50	
	2x2,50x0,90	"	
	Per ripristino verticali di a- sfalto		
	28,00x0,40	" 11,20	
	5,00x1,20	" 6,00	
	Parete scala a chiocciola e- sterna		
	2x4,00 x 3,60	28,80	
45- II02	Intonaco con malta idraulica ecc. per rappezzi. Ripristino parti di pareti e soffitti locale 9	mq.187,80	II0 20658

"	mq. 10	3
" 15	"	1,50
" 17	"	2
" 18	"	2
" 19	"	12
" 20	"	2
" 22	"	1,50
" 23	"	10
" 25	"	5,00
" 26	"	3,00
" 27	"	2
" 28	"	4
" 29	"	3
" 30	"	8
" 32	"	15
" 33	"	
" 34	"	

"15	3,50x2,90	mq. 62,60	" IO, I5	
"16	3,50x1,60	" 5,60	" 5,60	
"18	2,50x0,90	" 2,25	" 2,25	
"19	2,50x2,10	" 5,25	" 5,25	
"21	1,90x1,00	" 1,90	" 1,90	
"24	3,50x1,60	" 5,60	" 5,60	
"25	2,00x1,20	" 2,40	" 2,40	
"27	5,40x3,80	" 20,52	" 20,52	
"37	2,35x2,05	" 4,82	" 4,82	
" "	9,15x1,75	" 16,01	" 16,01	
sul muro da ricostruzione in				
terrazzo	2x2,50x0,90	" 4,50		
Per ripristino verticali di a-				
sfalto	28,00x0,40	" 11,20		
	5,00x1,20	" 6,00		
Parete scala a chiocciola e-				
sterna	2x4,00 x 3,60	28,80		
		mq. 187,80	mq. 187,80	II0 20658

45- II02 Intonaco con malta idraulica ecc.

per rappezzi.

Ripristino parti di pareti e soffitti

locale 9	mq. IO	
" 15	" 3	
" 17	" 1,50	
" 18	" 2	
" 19	" 2	
" 20	" 12	
" 22	" 2	
" 23	" 1,50	
" 25	" IO	
" 26	" 5,00	
" 27	" 3,00	
" 28	" 2	
" 29	" 4	
" 30	" 3	
" 32	" 8	
" 33	" 15	
" 34	" 8	
" 35	" IO	
" 36	" 15	
" 38	" 4	
" 39	" 2	
" 40	" IO	
	mq. 138,00	mq. 138
		I35 18630

1901

A riportare

Riparto

46- II07	Intonaco di cemento con idrofugo Intonacatura cisterna acqua potabile II,00 x 2,00 mq.22,00 3,50 x 2,00 " 7,00 mq.29,00	mq. 29	260	7540
47- III2	Intonaco d'asfalto naturale Verticale di raccordo ai nuovi trat- ti di Battuto di asfalto 28,00x0,40 mq.11,20	"	II,20 315	3528
48- III3	Intonaco per prospetti ecc.cornicio ne ecc. Rifinitura tratto di cornicione di- strutto 2,50 x sviluppo I,30 mq. 3,25	"	3,25 220	715
49- II23	Ricocciatura con frantumi ecc. saturatura sbirciature	"	20 100	2000
50- II29	Voltine in foglio di mattoni ecc. Ricostruzione tratto solaio sfon- dato loc.23 4,00 x 2,00 mq.8,00	"	8 550	4400
51- II33	Soffitti in piano di rete metallica o stuole di canna e malta bastarda Ricostruzione soffitti nei vari loc. lc. 8 e 9 415 x 3,00 mq.12,45 " 20 3,15 x 3,05 " 9,61 " 19 2,50 x 1,85 " 4,63 " 17 2,00 x 1,50 " 3,00 " 21 3,15 x 1,20 " 3,78 " 22 5,00 x 4,90 " 24,50 " 23 5,00 x 3,45 " 17,25 " 36 10,80 x 0,20 " 2,16 " " piccoli rappezzi vari " 4,00 " 39 2 x 2,50 x 2,00 " 10,00 " " 2,00 x 1,90 " 3,80 " 40 2,00 x 2,00 " 4,00 mq. 99,18	"	99,18 375	37192,50
52- II35	Compenso addizionale per soffitti co- struiti a tutti per riprese ecc. IO,80 x 0,20 mq. 2,16 piccoli rappezzi vari " 4,00 mq. 6,16	"	6,16 35	215,60
53- II64	Battuto di asfalto ecc. spessore			

48- III3	Intonaco per prospetti ecc.cornicio ne ecc. Rifinitura tratto di cornicione di- strutto 2,50 x sviluppo I,30	mq. 3,25	"	3,25	220	715
49- II23	Ricoccatura con frantumi ecc. saturatura sbereciature	"	"	20	100	2000
50- II29	Voltine in foglio di mattoni ecc. Ricostruzione tratto solaio sfon- dato loc.23 4,00 x 2,00	mq.8,00	"	8	550	4400
51- II33	Soffitti in piano di rete metallica o stuoie di canna e malta bastarda Ricostruzione soffitti nei vari loc. lc. 8 e 9 4I5 x 3,00	mq.12,45	"	"	"	"
"	" 20 3,15 x 3,05	" 9,61	"	"	"	"
"	" 19 2,50 x 1,85	" 4,63	"	"	"	"
"	" 17 2,00 x 1,50	" 3,00	"	"	"	"
"	" 21 3,15 x 1,20	" 3,78	"	"	"	"
"	" 22 5,00 x 4,90	" 24,50	"	"	"	"
"	" 23 5,00 x 3,45	" 17,25	"	"	"	"
"	" 36 10,80 x 0,20	" 2,16	"	"	"	"
"	" piccoli rappezzi vari	" 4,00	"	"	"	"
"	" 39 2 x 2,50 x 2,00	" 10,00	"	"	"	"
"	" 2,00 x 1,90	" 3,80	"	"	"	"
"	" 40 2,00 x 2,00	" 4,00	"	"	"	"
		mq. 99,18	"	99,18	375	37192,50
52- II35	Compenso addizionale per soffitti co- struiti a tratti per riprese ecc. 10,80 x 0,20	mq. 2,16	"	"	"	"
	piccoli rappezzi vari	" 4,00	"	"	"	"
		mq. 6,16	"	6,16	35	215,60
53- II64	Battuto di asfalto ecc. spessore m.m. 15	"	"	38,90	410	15949
54- II70	Solini di asfalto naturale Raccordo del battuto al verticale	ml. 30	"	50	"	1500
55- II80	Impiantito di marmitta a mosaico alla veneziana ad un solo colore come al precedente n.14	mq. 41,44	"	620	"	25692,80

A riportare

Riparto

56- I210	Surrogazione negli impiantisti di mar mitte alle veneziana ad un solo colo re		n. 20	32	640
	Ripristino pavimenti				
57- I204	Rivestimento di muri con mattonelle di 2° scelta				
	refacimento zoccoli bagni e latrine				
loc.	9	9,19x1,55	mq.	14,11	
"	14	7,80x1,55	"	12,09	
"	19	8,70x1,55	"	13,49	
"	21	4,80x1,15	"	5,52	
"	28	11,60x1,55	"	17,98	
"	29	6,60x1,50	"	9,90	
"	37	9,60x1,60	"	15,36	
"	38	2,10x1,55	"	3,26	
"	"	0,30x0,45	"	0,14	
"	"	0,90x0,15	"	0,14	
			mq.	91,99	605
					55653,95
58- I216	Surrogazione di mattonelle di maioli ce				
	ripristino maiolicati dei zoccoli		n.100	45	4500
59- I247	Copertura di tetto con lastre ondu- late di ardesia artificiale				
	Come al precedente n.16		mq.13,75	510	7012,50
60- I355	Imposte di porte o scuri di finestre con specchi lisci di tavole di abete spessore cm.3				
	controsportelli				
le. 3	- 0,40x1,45x4		mq.	2,32	
"	15 - 4x0,30x1,00		"	1,20	
"	25 - 2x0,40x1,65		"	1,32	
			mq.	4,84	
			"	4,84	2150
					10599,60
61- I359	Imposte di porte o scuri di finestre di tavole di abete grosse cm.5				
porte interne	2x0,90x2,20		mq.	3,96	
"	5x0,85x2,20		"	9,35	
"	2x1,05x2,65		"	6,63	
"	3x0,60x1,00		"	3,60	
"	2x1,00x2,05		"	4,10	
"	3x0,80x2,15		"	5,16	
"	2x1,10x2,15		"	4,73	
"	2x0,75x2,15		"	3,23	
"	2x0,95x2,15		"	4,09	
"	3x1,05x2,20		"	6,93	

loc. 9	9,10x1,55	mq. 14,11		
" 14	7,60x1,55	" 12,09		
" 19	8,70x1,55	" 13,49		
" 21	4,00x1,15	" 5,52		
" 28	11,60x1,55	" 17,98		
" 29	6,60x1,50	" 9,90		
" 37	9,60x1,60	" 15,36		
" 38	2,10x1,55	" 3,26		
" "	0,30x0,45	" 0,14		
" "	0,90x0,15	" 0,14		
		mq. 91,99	605	55653,95

58- I216 Surrogazione di mattonelle di maioli
ca

ripristino maiolicati dei zoccoli n.100 45 4500

59- I247 Copertura di tetto con lastre ondulate di ardesia artificiale
Come al precedente n.16 mq.13,75 510 7012,50

60- I355 Imposte di porte o scuri di finestre con specchi lisci di tavole di abete spessore cm.3
controsportelli

loc. 3 - 0,40x1,45x4	mq. 2,32			
" 15 - 4x0,30x1,60	" 1,20			
" 25 - 2x0,40x1,65	" 1,32			
	mq. 4,84	" 4,84	2190	10599,50

61- I359 Imposte di porte o scuri di finestre di tavole di abete grosse cm.5

porte interne 2x0,90x2,20	mq. 3,96			
" 5x0,55x2,20	" 9,35			
" 2x1,25x2,65	" 6,63			
" 3x0,60x2,00	" 3,60			
" 2x1,00x2,05	" 4,10			
" 3x0,80x2,15	" 5,16			
" 2x1,10x2,15	" 4,73			
" 2x0,75x2,15	" 3,23			
" 2x0,95x2,15	" 4,09			
" 3x1,05x2,20	" 6,93			
	mq. 51,78	" 51,78	2520	130485,60

62- I367 Imposte o scuri di finestre con specchi lisci di castagno grossi cm.5
parti basse delle finestre a balcone

A riportare

1900

Riporto

3xI,05x0,90	mq. 2,84			
2xI,20x0,90	" 3,24			
I,35x0,90	" 1,22			
	<u>mq. 7,30</u>			
63- I37I	Compenso addizionale per bugnate ordinarie ecc.	mq. 7,30	2350	17155
	Quantità come al precedente n.60			
	mq. 4,84x2 mq.9,68			
idem n.6I	" 5I,78x2 "103,56			
"	" 62 " 7,30x2 " 14,60			
	<u>mq.127,84</u>			
64- I373	Imposte di porte e portoncini per ingressi con iusto ecc.	" 127,84	30	3835,20
	Ingresso locale I5-5-3			
3xI,30x2,65	mq.10,34			
I,20x2,10	" 2,52			
	<u>mq.12,86</u>			
65- I385	Invetrate o sportelli a vetri di finestre di porte d'abete grosse cm.5	" 12,86	3825	49189,50
	Porte vetrate interne I,35x2,00			
	<u>mq.2,70</u>			
66- I39I	Invetrate o sportelli di finestre di tavole di castagno grosse cm.5	" 2,70	3250	8775
	Per tutte le finestre	mq.		
2x0,80x0,60	" 0,96			
2xI,10xI,60	" 3,52			
2x0,40x0,60	" 0,48			
2xI,20x2,20	" 5,28			
2xI,10xI,20	" 2,64			
I,20x2,65	" 3,18			
I,35x2,00	" 2,70			
2xI,20x2,00	" 4,80			
O,95xI,40	" 1,33			
O,10x0,80	" 0,32			
O,60xI,50	" 0,90			
I,00xI,50	" 1,50			
6xI,20x2,10	" 15,12			
2xI,20xI,75	" 4,20			
I,20x2,10	" 2,52			
5xI,00xI,75	" 8,75			
2x0,60x3,14	" 1,13			

idem n. 61 " 5I,78x2 "IO3,56
 " " 62 " 7,30x2 " I4,60
 mq. I27,84 " I27,84 30 3835,20

64- I373 Imposte di porte e portoncini
 per ingressi con fusto ecc.

Ingresso locale I5-5-3

3xI,30x2,65

I,20x2,10

mq. IO,34
 " 2,52
 mq. I2,86

3825 49189,50

65- I385 Invetriate o sportelli a vetri
 di finestre di porte d'abete
 grosse cm.5

Porte vetrate interne I,35x2,00
 mq. 2,70

2,70 3250 8775

66- I39I Invetriate o sportelli di fine-
 stre di tavole di castagno gros-
 se cm.5

Per tutte le finestre mq.

2x0,20x0,60 " 0,96
 2xI,10xI,60 " 3,52
 2x0,40x0,60 " 0,48
 2xI,20x2,20 " 5,28
 2xI,10xI,20 " 2,64
 I,20x2,65 " 3,12
 I,35x2,00 " 2,70
 2xI,20x2,00 " 4,80
 0,95xI,40 " I,33
 0,10x0,80 " 0,32
 0,60xI,50 " 0,90
 I,00xI,50 " I,50
 6xI,20x2,10 " I5,12
 2xI,20xI,75 " 4,20
 I,20x2,10 " 2,52
 5xI,00xI,75 " 8,75
 2x0,60x3,14 " I,13
 mq. 59,33 " 59,33

3150 186889,50

67- I417 Persiane a stecche fisse di casta-

gno

Per completamento infissi esterni

7xI,20x2,70

mq. I7,64

mq. I7,64

A riportare

Riporto

4x1,20x2,65	mq. 17,64			
1,35x2,90	" 12,72			
0,95x1,40	" 3,92			
1,20x3,00	" 1,33			
3x1,05x2,50	" 3,60			
2x1,00x1,75	" 6,98			
	" 3,50			
	mq. 49,69	mq. 49,69	2630	130684,70
68- 1437 Tasselli di legno abete ecc.				
Per riparazione parti d'infissi esistenti	n. 100	72	7200	
69- 1517 Rimessa in sesto d'imposte ecc. piccole per gli infissi esistenti	" 10	235	2350	
70- 1564 Tavolette da latrine di faggio con coperchio				
Come al precedente n. 12	" 8	685	5480	
71- 1571 Armatura di ferri ecc. 1° genere				
Appoggi per serbatoi riserva acqua	Kg. 300	35	10500	
72- 1588 Ferramenta fucinate del 3° gen. Staffe e collari e mensole varie	30	130	3900	
73- 1594 Posizione in opera di ferramenta piccola dell'A.A.				
Per quanto al precedente n. 1 Kg 10				
" " " " 2 " 30				
" " " " 5 " 5				
	Kg 45	45	12	540
74- 1597 Posizione in opera condutture di ferro dell'A.A. ecc.				
Per quanto al precedente n. 17	" 150	25	3750	
75- 1599 Condutture di tubi di ferro senza saldature tipo Mannesmann ecc.				
Ripristino impianto idrico	" 500	140	70000	
76- 1600 Compenso addizionale per zincatura ecc.				
In aggiunta all'art. precedente	" 500	9	4500	
77- 1611 Casette scaricatorie di ghisa Completamento latrine	n. 8	1170	9360	
78- 1615 Posizione in opera oggetti di ghisa piccoli dell'A.A.				

68- I437 Tasselli di legno abete ecc. Per riparazione parti d'infissi esistenti	n. 100	72	7200
69- I517 Rimessa in sesto d'imposte ecc. piccole per gli infissi esistenti	" 10	235	2350
70- I564 Tavollette da latrine di faggio con coperchio Come al precedente n.12	" 8	685	5480
71- I571 Armatura di ferri ecc.1° genere Appoggi per serbatoi riserva acqua	Kg.300	35	10500
72- I588 Ferramenta fucinate del 3° gen. Staffe e collari e mensole varie	30	130	3900
73- I594 Posizione in opera di ferramenta piccola dell'A.A. Per quanto al precedente n.1 kg10 " " " " 2 " 30 " " " " 5 " 5 kg45 " 45	45	12	540
74- I597 Posizione in opera condutture di ferro Cell'A.M. ecc. Per quanto al precedente n.17	" 150	25	3750
75- I599 Condutture di tubi di ferro senza saldature tipo Mannesmann ecc. Ripristino impianto idrico	" 500	140	70000
76- I600 Compenso addizionale per zincatura ecc. In aggiunta all'art.precedente	" 500	9	4500
77- I611 Casette scaricatrici di ghisa Completamento latrine	n. 8	1170	9360
78- I615 Posizione in opera oggetti di ghisa piccoli dell'A.M. Per quanto al precedente n.4	Kg.20	20	400
79- I623 Braccioletti per infissi lunghi fino a cm.12 Per fermo dei vari infissi	n. 68	15	1020
A riportare			1899

Riporto

80- I628	Cremonesi con manopola d'anticora dal	n.	34	360	I2240
	Per le nuove finestre				
81- I629	Cerniere a bietta ecc. lama alta cm.12	n.	20	50	I000
	Per i controportelli				
82- I630	Cerniere a bietta ecc.lama alta da cm.13 a 16	"	345	54	I8630
	Per le nuove porte e finestre				
83- I638	Maschietti con apertura fino a cm.10	"	114	105	II970
	Per tutte le persiane				
84- I640	Mollette con pannello d'ottone ecc. per controportelli	"	20	60	I200
	Per quanto al precedente n.60	"	30	100	3000
85- I652	manopole di lega autarchica ecc. Per le nuove porte	"	14	130	I820
86- I653	Paletti da bussola in grossezza lunghi cm.30	"	14	170	2380
	Per le porte a due partite				
87- I655	Paletti da bussola in grossezza lunghi cm.40 come sopra	"	30	415	I2450
88- I658	Serratura a colpo e mandata in grossezza allungata in senso verticale Per le porte anzidette	"	3	900	2700
89- I662	Serratura detta tipo inglese ecc. Per i nuovi portoncini ecc.	Lg.	6	122	732
90- I656	Paletti su cartelli e piastra continua ecc.	n.	20	200	4000
	Per i nuovi portoncini				
91- I678	Spagnolette con asta semplice Ø m.m.10 per le nuove persiane	Kg.	5	685	3425
92- I698	Bronzo lavorato 3° genere Saracinesche per l'impianto idrico	"	5	800	4000
93- I707	Rubinetti dritti di arresto Per le cassette scaricatori e completamento impianti	"	8	1125	9000
94- I712	Rubinetti di erogazione ottone smaltato completamente lavabi				

cm.13 a 16				
Per le nuove porte e finestre	"	345	54	18630
83- I638 Maschietti con apertura fino a cm.10				
Per tutte le persiane	"	114	105	11970
84- I640 Mollette con pannello d'ottone ecc. per controsportelli				
Per quanto al precedente n.60	"	20	60	1200
85- I652 Manopole di lega autarchica ecc. Per le nuove porte	"	30	100	3000
86- I653 Paletti da bussola in grossezza lunghi cm.30				
Per le porte a due partite	"	14	130	1820
87- I655 Paletti da bussola in grossezza lunghi cm.40				
come sopra	"	14	170	2380
88- I658 Serratura a colpo e mandata in grossa allungata in senso verticale				
Per le porte anzidette	"	30	415	12450
89- I662 Serratura detta tipo inglese ecc. Per i nuovi portoncini ecc.	"	3	900	2700
90- I656 Paletti su cartelli e piastra con tinua ecc.				
Per i nuovi portoncini	Kg.	6	122	732
91- I678 Spagnolette con asta semplice Ø m.m.10 per le nuove persiane	n.	20	200	4000
92- I698 Bronzo lavorato 3° genere Saracinesche per l'impianto idrico	Kg.	5	685	3425
93- I707 Rubinetti dritti di arresto				
Per le cassette scaricatrici e completo impianto	"	5	800	4000
94- I712 Rubinetti di erogazione ottone smaltato completamente lavabi	"	8	1125	9000
95- I714 Gruppi miscelatori da bagno Completamento bagni	n.	6	1800	10800
96- I715 Scatole cilindriche d'ispezione ecc; Completamento bagni	n.	2	720	1440
97- I723 Sifone di piombo con vite ecc. Completamento lavabi	"	8	240	1920

A riportare

Alpinto

loc.n.	I	2,00x1,20	mq.	2,40
"	"	6,40x2,60	"	16,64
"	2	3,45x2,40	"	8,28
"	"	11,70x2,60	"	30,42
"	3	7,80x4,85	"	37,83
"	"	25,30x2,60	"	65,78
"	4	3,30x0,65	"	2,15
"	"	7,90x2,60	"	20,54
"	5	4,10x2,90	"	11,89
"	"	2,00x1,30	"	2,60
"	6	4,00x1,60	"	6,40
"	"	13,10x2,50	"	33,00
"	7	6,50x3,40	"	22,10
"	"	19,80x2,50	"	49,50
"	8 e 9	4,15x3,00	"	12,45
"	"	14,40x4,30	"	61,92
"	"	8,20x1,70	"	13,94
"	10	4,15x3,13	"	13,07
"	"	14,60x4,30	"	62,78
"	11	8,55x4,95	"	42,32
"	"	27,00x4,30	"	116,10
"	12	6,85x2,85	"	19,52
"	"	19,40x4,30	"	83,42
"	13	8,00x4,80	"	38,40
"	"	25,60x4,30	"	110,08
"	"	24,80x3,50	"	33,60
"	14	2,00x1,90	"	3,80
"	"	7,80x4,30	"	33,54
"	15	3,50x3,70	"	12,95
"	"	14,40x2,40	"	34,56
"	16	3,50x1,30	"	4,55
"	"	9,60x1,80	"	17,28
"	17	3,15x1,50	"	4,73
"	"	9,30x3,80	"	35,34

21460

200

mq. 107,30

come al precedente n.7

IOI- I743 Imbiancatura preparatoria con latte
di calce ecc.
Pipulitura di tetti e locali

loc.n.	I	2,00x1,20	mq.	2,40
"	"	6,40x2,60	"	16,64
"	2	3,45x2,40	"	8,28
"	3	11,70x2,60	"	30,42
"	"	7,80x4,85	"	37,83
"	"	25,30x2,60	"	65,78
"	4	3,30x0,65	"	2,15
"	"	7,90x2,60	"	20,54
"	5	4,10x2,90	"	11,89
"	"	2,00x1,30	"	2,60
"	6	4,00x1,60	"	6,40
"	"	13,10x2,50	"	33,00
"	7	6,50x3,40	"	22,10
"	"	19,80x2,50	"	49,50
"	8 e 9	4,15x3,00	"	12,45
"	"	14,40x4,30	"	61,92
"	"	8,20x1,70	"	13,94
"	10	4,15x3,13	"	13,07
"	"	14,60x4,30	"	62,78
"	11	8,55x4,95	"	42,32
"	"	27,00x4,30	"	116,10
"	12	6,85x2,85	"	19,52
"	"	19,40x4,30	"	83,42
"	13	8,00x4,80	"	38,40
"	"	25,60x4,30	"	110,08
"	"	28,4,80x3,50	"	33,60
"	14	2,00x1,90	"	3,80
"	"	7,80x4,30	"	33,54
"	15	3,50x3,70	"	12,95
"	"	14,40x2,40	"	34,56
"	16	3,50x1,30	"	4,55
"	"	9,60x1,80	"	17,28
"	17	3,15x1,50	"	4,73
"	"	9,30x3,80	"	35,34
"	18	2,50x0,90	"	2,25
"	"	6,80x2,25	"	15,30
"	19	2,50x1,85	"	4,63
"	"	8,60x2,25	"	19,35
"	20	3,15x3,05	"	9,61
"	"	12,40x3,80	"	47,12

A riportare

1895

Riporto

loc.n. 21	3,15x1,00	mq. 3,15
"	1,95x1,00	" 1,95
"	4,40x3,80	" 16,72
"	5,90x2,00	" 11,80
" 22	5,00x4,90	" 24,50
"	19,80x3,80	" 75,24
" 23	5,00x3,45	" 17,25
"	16,90x3,80	" 64,22
" 24	5,00x2,15	" 10,75
"	14,30x3,80	" 54,34
"	4,00x3,80	" 15,20
" 25	5,50x1,20	" 6,60
"	13,40x3,80	" 50,92
" 26	3,50x3,30	" 11,55
"	13,60x3,80	" 51,68
" 27	5,40x4,35	" 23,49
"	19,50x3,80	" 74,10
" 28	3,80x2,00	" 7,60
"	11,60x2,25	" 26,10
" 29	1,95x1,35	" 26,63
"	6,60x2,25	" 14,85
" 30	5,05x5,00	" 25,25
"	20,20x3,80	" 76,76
" 31	2,25x2,00	" 4,50
"	8,50x3,80	" 32,30
" 32	5,40x1,20	" 6,48
"	13,20x3,30	" 43,56
" 33	2,95x2,30	" 6,79
"	10,50x3,30	" 34,65
" 34	3,90x2,95	" 11,51
"	13,70x3,30	" 45,21
" 35	5,15x2,95	" 15,19
"	16,20x3,30	" 53,46
" 36	5,25x5,15	" 27,04
"	23,70x3,30	" 68,31
" 37	2,35x2,05	" 4,82
"	8,80x1,17	" 15,40
" 38	2,05x1,30	" 2,67
"	6,70x1,75	" 11,73
" 39	2,00x1,90	" 3,80
"	7,80x2,50	" 19,50
" 40	2,00x2,00	" 4,00
"	8,00x2,50	" 20,00
	rappezzi vari	
	esterni	
	" 50,00	

mq. 2333,71 mq. 2333,71 3 7001,13

24	5,00x2,15	"	10,75			
"	I4,30x3,80	"	54,34			
"	4,00x3,80	"	15,20			
25	5,50x1,20	"	6,50			
"	I3,40x3,80	"	50,92			
26	3,50x3,30	"	11,55			
"	I3,60x3,80	"	51,68			
27	5,40x4,35	"	23,49			
"	I9,50x3,80	"	74,10			
28	3,80x2,00	"	7,60			
"	11,60x2,25	"	26,10			
29	I,95x1,35	"	26,63			
"	6,60x2,25	"	14,85			
30	5,05x5,00	"	25,25			
"	20,20x3,80	"	76,76			
31	2,25x2,00	"	4,50			
"	8,50x3,80	"	32,30			
32	5,40x1,20	"	6,48			
"	I3,20x3,30	"	43,56			
33	2,95x2,30	"	6,79			
"	I0,50x3,30	"	34,65			
34	3,90x2,95	"	11,51			
"	I3,70x3,30	"	45,21			
35	5,15x2,95	"	15,19			
"	I6,20x3,30	"	53,46			
36	5,25x5,15	"	27,04			
"	20,70x3,30	"	68,31			
37	2,35x2,05	"	4,82			
"	8,80x1,17	"	15,40			
38	2,05x1,30	"	2,67			
"	6,70x1,75	"	11,73			
39	2,00x1,90	"	3,80			
"	7,80x2,50	"	19,50			
40	2,00x2,00	"	4,00			
"	8,00x2,50	"	20,00			
	razzezzzi vari					
	esterni					
		"	50,00			
		mq. 2333,71	mq. 2333,71	3		7001,13

I02- I745 tinteggiatura con latte di calce a due strati dati col pennello ecc.

Come all'art. precedente

21003,39

I03- I747 Strato eseguito in più del secondo ecc.

Come agli art. precedenti

9334,84

A riportare

Riparto

I04- I763 Coloritura ad olio e bianco di zinco con colori ordinari e due strati su legnami o ferramenta
Per ridoloritura infissi e parti d'infisso esistenti

finestre	I,05x0,65	mq.0,68
"	I,20x2,65	" 3,18
"	2x0,60x1,10	" 1,20
"	I,20x2,10	" 2,52
"	2x0,50x0,80	" 0,96
"	2x1x1 I,35x3,00	" 12,15
vetrate	2x1,30x2,50	" 6,50
"	6x1,30x3,70	" 28,86
telai cassettoni e mostre nei rai locali complessivi ml.		
"	68,10x0,35	" 23,84
"	12,80x0,40	" 5,12
"	17,90x0,45	" 8,06
"	25,05x0,12	" 3,00
"	22,00x0,15	" 3,30
"	I,47x0,28	" 0,41
	mq.99,78	mq. 99,78

I05- I764 Coloritura ad olio ecc. su intonaco

Ripulitura zoccoli dei vari loc.
Complessivi ml.310,00x0,20 mq.62

I63 I0106

I05- I792 Raschiatura di vernici o di pareti su pareti murarie
Per togliere vecchie carte da parati imbrattate e lacerate
Complessivi ml.320,00x3,80 mq.

I216 9 I0944

I07- I811 Impianto interno di luce elettrica con linee principali e secondarie in plettina biaccata lampade lampade

I100 55000

I08- I879 Lampade elettriche da 25 Watt
Completamento impianto luce
Idem da 50 Watt
Come precedente

I16 2560

I09- I922 Riflettore di vetro opalino ondulato Ø cm.25
Completamento detto impianto

200 6800

I10- E Gruppo elettropompa HP3,5 porta 150 litri 150 al minuto

I50 7500

Riparto

per sollevamento acqua dal pozzo esistente nel parco

n. 1 a corpo 80.000,=

111 E Gruppo elettropompa HP 1 portata litri 50 al minuto prevalenza ml.40 per riodi 50 Volt 220

dato in opera completo di interruttore automatico salvamotore ed ongi altro annesso compreso le valvole ed il tubo di adescamento

per sollevamento acqua potabile n. 1 " " 35.000,=

Importo L.1.552.350,46

Somma in massa per imprevisti " 137.649,54

Ammontare complessivo dell'estimativo " 1.700.000,00

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten.Col.P.Colimodio)

Colimodio

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barela)

Barela



CONDIZIONI TECNICHE

Nel somministrare i materiali, le giornaliere, i noleggi e gli articoli di lavoro previsti dall'estimativo o dalla tariffa inseriti nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico generale, approvato con R. Decreto 17 marzo 1932 ed alle condizioni tecniche del capitolato annesso al contratto n. 16828 di rep. stipulato con l'impresa Piccioni Valentino in data 21-12-1942 per lavori di O.M. della piazza di Roma esercizio 1942-43. registrata a Roma il 18-2-43 al n. 28584 Vol. 498 A.F. col pagamento di L. gratis (C, 15) per tassa registrazione.

E poichè nell'estimativo e nella tariffa sono compresi articoli che non figurano nel capitolato annesso al contratto sopra citato resta stabilito inoltre, quanto segue:

I) - Gruppo elettropompa HP 3,5 portata litri 150 al minuto prevalenza ml. 60/80 - periodi 50 Volt 220

(Articolo IIO-E dell'estimativo)

Gruppo elettropompa HP I portata litri 50 al minuto prevalenza ml. 40 periodi 50 Volt 220 (articolo III dell'estimativo)

I gruppi elettropompa di cui agli articoli IIO-e III saranno delle migliori fabbriche esistenti in commercio e prima della posa in opera verranno indicate per l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Nel prezzo dell'articolo è compreso ogni onere per la posa in opera delle elettropompe con la costruzione delle basi in cemento; della tubazione occorrente per il pescaggio nei pozzi con le relative valvole di fondo (succhiola) e l'allacciamento alla tubazione adducente ai cassoni, l'impianto elettrico ed il quadro di comando in mano con un teleruttore protettore; Voltmetro ed Amperometro.

Le elettropompe dovranno essere date in opera a perfetta regola d'arte e funzionanti.

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten. Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barela)

generale, approvato con R.D. 17 marzo 1932 ed alle condizioni tecniche del capitolato annesso al contratto n. 16828 di rep. stipulato con l'impresa Piccioni Valentini in data 21-12-1942 per lavori di O.M. della piazza di Roma esercizio 1942-43. registrato a Roma il 18-2-43 al n. 28584 Vol. 498 A.F. col pagamento di L. gratis (0,15) per tassa registrazione.

E poichè nell'estimativo e nella tariffa sono compresi articoli che non figurano nel capitolato annesso al contratto sopra citato, resta stabilito inoltre, quanto segue:

I) - Gruppo elettropompa HP 3,5 portata litri 150 al minuto prevalenza ml. 60/80 - periodi 50 Volt 220

(Articolo IIO-E dell'estimativo)

Gruppo elettropompa HP I portata litri 50 al minuto prevalenza ml. 40 periodi 50 Volt 220 (articolo III dell'estimativo)

I gruppi elettropompa di cui agli articoli IIO-e III saranno delle migliori fabbriche esistenti in commercio e prima della posa in opera verranno indicate per l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Nel prezzo dell'articolo è compreso ogni onere per la posa in opera delle elettropompe con la costruzione delle basi in cemento; della tubazione occorrente per il passaggio nei pozzi con le relative valvole di fondo (succhiola) e l'allacciamento alla tubazione adducente ai casoni, l'impianto elettrico ed il quadro di comando in mano con un teleruttore protettore; Voltmetro ed Amperometro.

Le elettropompe dovranno essere date in opera a perfetta regola d'arte e funzionanti.

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten. Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Barela)

1896

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

Nell'esecuzione dei lavori e delle somministrazioni previste dal presente capitolato saranno osservate le condizioni generali per l'appalto dei lavori dal Genio Militare approvato con R. Decreto 17 marzo 1932.

In particolare è stabilito quanto segue:

1) I lavori dovranno essere compiuti nei termini di giorni 30 dalla data di cominciamiento compresi fra gli utili anche i giorni festivi. I giorni in cui sono redatti i verbali di cominciamiento, sospese sioni, riprese e compimento dei lavori non sono conteggiati fra quelli utili.

2) In caso di ritardo nell'eseguimento dei lavori la penale è fissata in lire 39.600 (trentanove milaseicento) per ogni sette giorni di ritardo da computarsi solo se i sette giorni sono compiuti.

3) Gli acconti da corrispondersi all'appaltatore con le modalità prescritte dalle condizioni generali d'appalto coprate citate non potranno essere inferiori a lire 300.000 (trecentomila).

4) Il limite massimo a cui si potrà no ordinare i trasporti di cui all'art. 23 delle condizioni generali sopra citate sarà di Km. 15 misurabili sullo sviluppo di qualunque strada percorribile dai carri.

5) La cauzione da prestarsi ai sensi dell'art. 6 delle citate condizioni generali resta fissata in L. 65.000 (sessantacinque mila).

6) La ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivante da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi infortuni, malattie) ed ai trasporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni famigliari, indennità ai richiamati alle armi ecc.). Qualora il competente Ispettorato Corporativo segnali l'infrazione della ditta agli obblighi di cui sopra, i pagamenti sia in conto che a saldo, di cui all'art. 23 saranno ridotti alla misura dell'80% del dovuto, ed il residuo 20% rimarrà sospeso fin tanto che non sia stata definita coi competenti organi ogni conseguenza derivante dall'inadempienza di cui sopra, nè la ditta potrà pretendere per ritardo pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo.

In particolare è stabilito quanto segue:

1) I lavori dovranno essere compiuti nei termini di giorni 30 della data di cominciamento compresi fra gli utili anche i giorni festivi. I giorni in cui sono redatti i verbali di cominciamento, sospensioni, riprese e compimento dei lavori non sono conteggiati fra quelli utili.

2) In caso di ritardo nell'eseguimento dei lavori la penale è fissata in lire 39.600 (trentanove milaseicento) per ogni sette giorni di ritardo da computarsi solo se i sette giorni sono compiuti.

3) Gli acconti da corrispondersi all'appaltatore con le modalità prescritte dalle condizioni generali d'appalto coprate citate non potranno essere inferiore a lire 300.000 (trecentomila).

4) Il limite massimo a cui si potrà no ordinare i trasporti di cui all'art. 23 delle condizioni generali sopra citate sarà di Mm. 15 misurabili sullo sviluppo di qualunque strada percorribile dai carri.

5) La cauzione da prestarsi ai sensi dell'art. 6 delle citate condizioni generali resta fissata in L. 65.000 (sessantacinque mila).

6) La ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivante da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi infortuni, malattie) ed ai trasporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc.). Qualora il competente ispettorato Corporativo segnali infrazione della ditta agli obblighi di cui sopra, i pagamenti sia in conto che a saldo, di cui all'art. 23 saranno ridotti alla misura dell'80% del dovuto, ed il residuo 20% rimarrà sospeso fin tanto che non sia stata definita coi competenti organi ogni conseguenza derivante dall'inadempimento di cui sopra, nè la ditta potrà pretendere per ritardo pagamento del saldo, senza alcuna a qualsiasi titolo.

L'UFFICIALE COMPILATORE
(Ten. Col. P. Colimodio)

IL COLONNELLO DIRETTORE
(Riccardo Parela)

1892

0 2 7 8
