

ACC 078.2/2/50

10000/150/243
(NO. 1)

10000/150/243
(No. 1)

ACC/1 SOUTHERN
SEPT. - NOV. 1944



MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO STUDI E RICERCHE

078.2/50

1142



Southern acc/1

100/101/102

1142



o.p. 10 Oct. 114000 / 150/243
3 Nov.

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM SEPT. 44
TO NOV. 44
CANTACIE.

G. SACCONI - ROMA

Date	Ref	From	Subject
30.12.44	373	Kamukie	Bridges Biverted Folinsio State Road 16.-
18.12.44	396	Kuiphut	Road 9. Baisio - Catellagusta (Rev. 2.500)
21.12.44	397	"	Loeries Pteine, Maintenance. —
11.9.44	398	Kamukie	Road J. Cecilia - Campo di Ariani me Rev. 3.00.

FCR 1, AC2, 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Military Highways
Region Southern

Province SALERNO

S.S.18 "Tirrena Inferiore"

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Sta., Pumping, etc., and location Lavori di restauro delle pile
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località del Ponte S. Francesco presso Cava
dei Tirreni

(b) By contract or direct labour Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 95.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion già eseguiti
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Impresa GIANFRANCESCO SILVIO
Note speciali

2 Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 95.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Raffaele Mancini

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation CAPO COMPARTIMENTO dell' A.A.S.S. CASERTA
Designazione Ufficiale

288

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Region SouthernPerizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Province SALERNO

S.3.18 "Tirreno Inferiore"

1. (a) Building, Bridge, Road, Power-Station, Pumping-Station etc. and location lavori di restauro delle pile
Febricatio, ponte, strade, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località del Fonte S. Franceso o presso
dei Tirreni

- (b) By contract or direct labour Contratto

Per contratto o lavoro in economia

- (c) Amount of approximate estimate L. 95.000,00

Ammontare delle perizie

- (d) Urgency of project:

Urgenza del progetto

- (e) Probable time for completion già eseguiti

Data probabile per l'esecuzione

- (f) Special remarks Impresa GIANANTONIO SILVIO

Note speciali

2 Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 95.000,00

Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature

firma

Raffaele Mancini

288

Italian Engineer

Ingegnere Italiano

Official designation

Designazione Ufficiale

CAPO COMPARTIMENTO dell' A.A.S.S. CASERTA

Date, and place

Date e luogo

Caserta, li 25 Giugno 1944 N.2603

- (b) I agree with the preceding, certificate and recommend approval.

Luigi D'Amico, Chief Engineer Date 22.9.1944

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

~~(Other funds)~~

Alf. Fr. Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.

Lt. Colonel R. E.

Deputy

Director

Acting

P. W. & U. Sub Commission

Signed Commission

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 17 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region	Province
		III	Napoli

Lavori di ricostruzione del Ponte Storto alla progressiva 165+675 della Strada Statale n° 6 "Via Casilina"

(a) By contract ~~on direct labour~~ contratto

(b) Amount of approximate estimate L. 3.250.000 (tre milione duecentocinquanta mila)

(c) Urgency of project: urgente ed indifferibile

(d) Probable time for completion nei quattro

(e) Special remarks I lavori sono stati richiesti dal Cap. PARRY MARSHALL RE
REF LETTER 1/2/0 AUGUST 1944

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.250.000.-

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Signature Ing. R. Mancini

Official designation Ing. Capo Genio Civile Viabilità Statale

Date, and place Caserta 10 OTT 1944 5608

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

287

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Region III

Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Sewer, Pumping Station and other localities Lavori di ricostruzione del Ponte Storto alla progressiva 165+675 della Strada Statale n° 6 "Via Casilinga"
- (b) By contract contract
Per contratto contratto
- (c) Amount of approximate estimate L. 3.250.000 (tre milione duecentocinquanta mila)
Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks I lavori sono stati richiesti dal Cap. BARRY MARSHALL RE
Note speciali REF. LETTER 1/2/0 AUGUST 1944 HQ82 - ONE

2. Certificates:
Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.250.000.
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature Ing. R. Mancini
Firma

Official designation Ing. Capo Genio Civile Viabilità Statale
Designazione Ufficiale

Date, and place Caserta 10 OTT 1944
Data e luogo

287
5608

I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.
Date 22.11.1944

Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

3. Approved.


Lt. Colonel R. E. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
Deputy

Director

VB/

Reg. Eng. Reg. 111 & U. Sub Commission
(ommission)

(43)

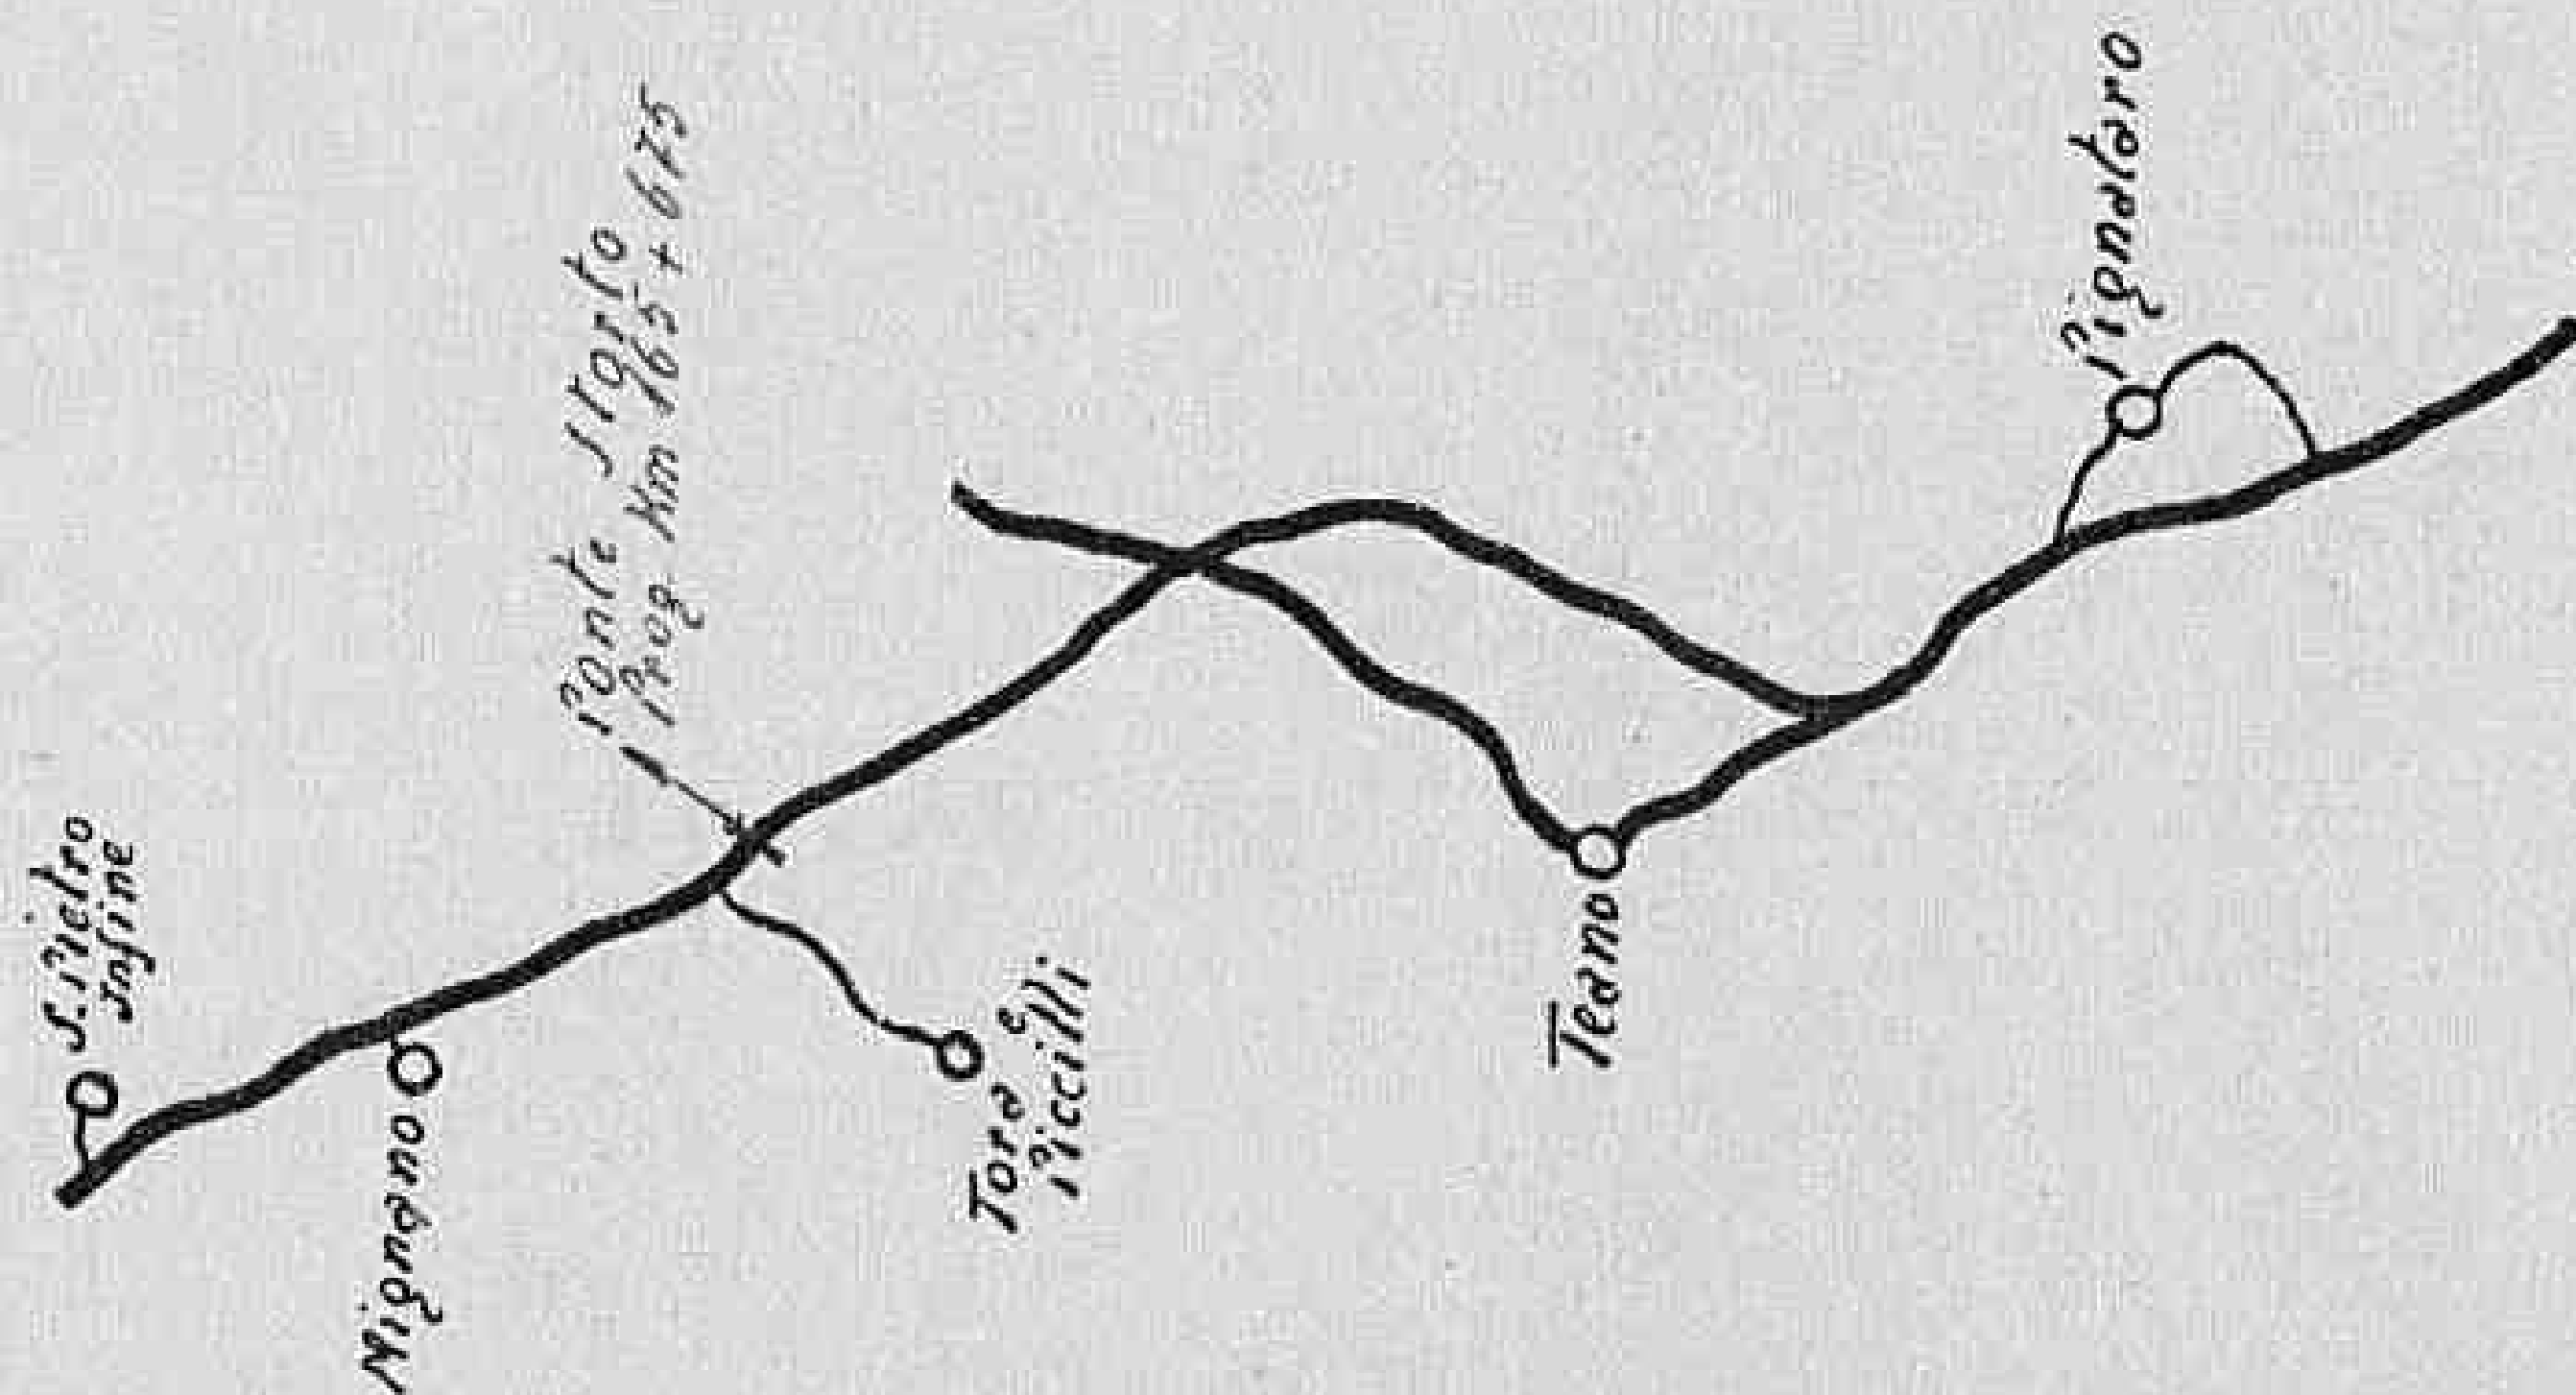

FORM 400, 1
(Estimated Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

SORADA MILITARE

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. *Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.*

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region

Province Salerno

1. (a) Building, Bridge, Road, Power-Str., Pumping-Str. etc. and location S.S. 18 - Allargamento tra Fabbricato parte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località km. 38+500 e km. 42

(b) By contract or direct labour contratto

(c) Amount of approximate estimate 5.700.000,00 =

(d) Urgency of project: urgente

(e) Probable time for completion 10.01.45

(f) Special remarks

2 Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.700.000,00 =

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. *Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire 5.700.000,00 =*

Signature Ing. R. Mancini

irma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation CAPO CONTARTIMENTO DELL'A.A.S.S.

288

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region

Province Salerno

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Pumping, etc., and location S.S. 18 - Allargamento tra
 Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località km. 38+600 a km. 42

(b) By contract or direct labour contratto
 Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 5.700.000,00 =
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
 Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 1061 days
 Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
 Note speciali

2 Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.700.000,00 =
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me: esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. R. Mancini
 firma

Italian Engineer
 Ingegnere Italiano

Official designation
 Designazione ufficiale

Date, and place Caserta, 13 I agosto 1944 N. 73 U.A.
 Data e luogo

288

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Lucio Morrey - ex socio Date 28.8.1944


Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
 (Other funds) for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. Deputy }
 Acting } Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

W. & U. Sub-Commission

(Allied Commission)

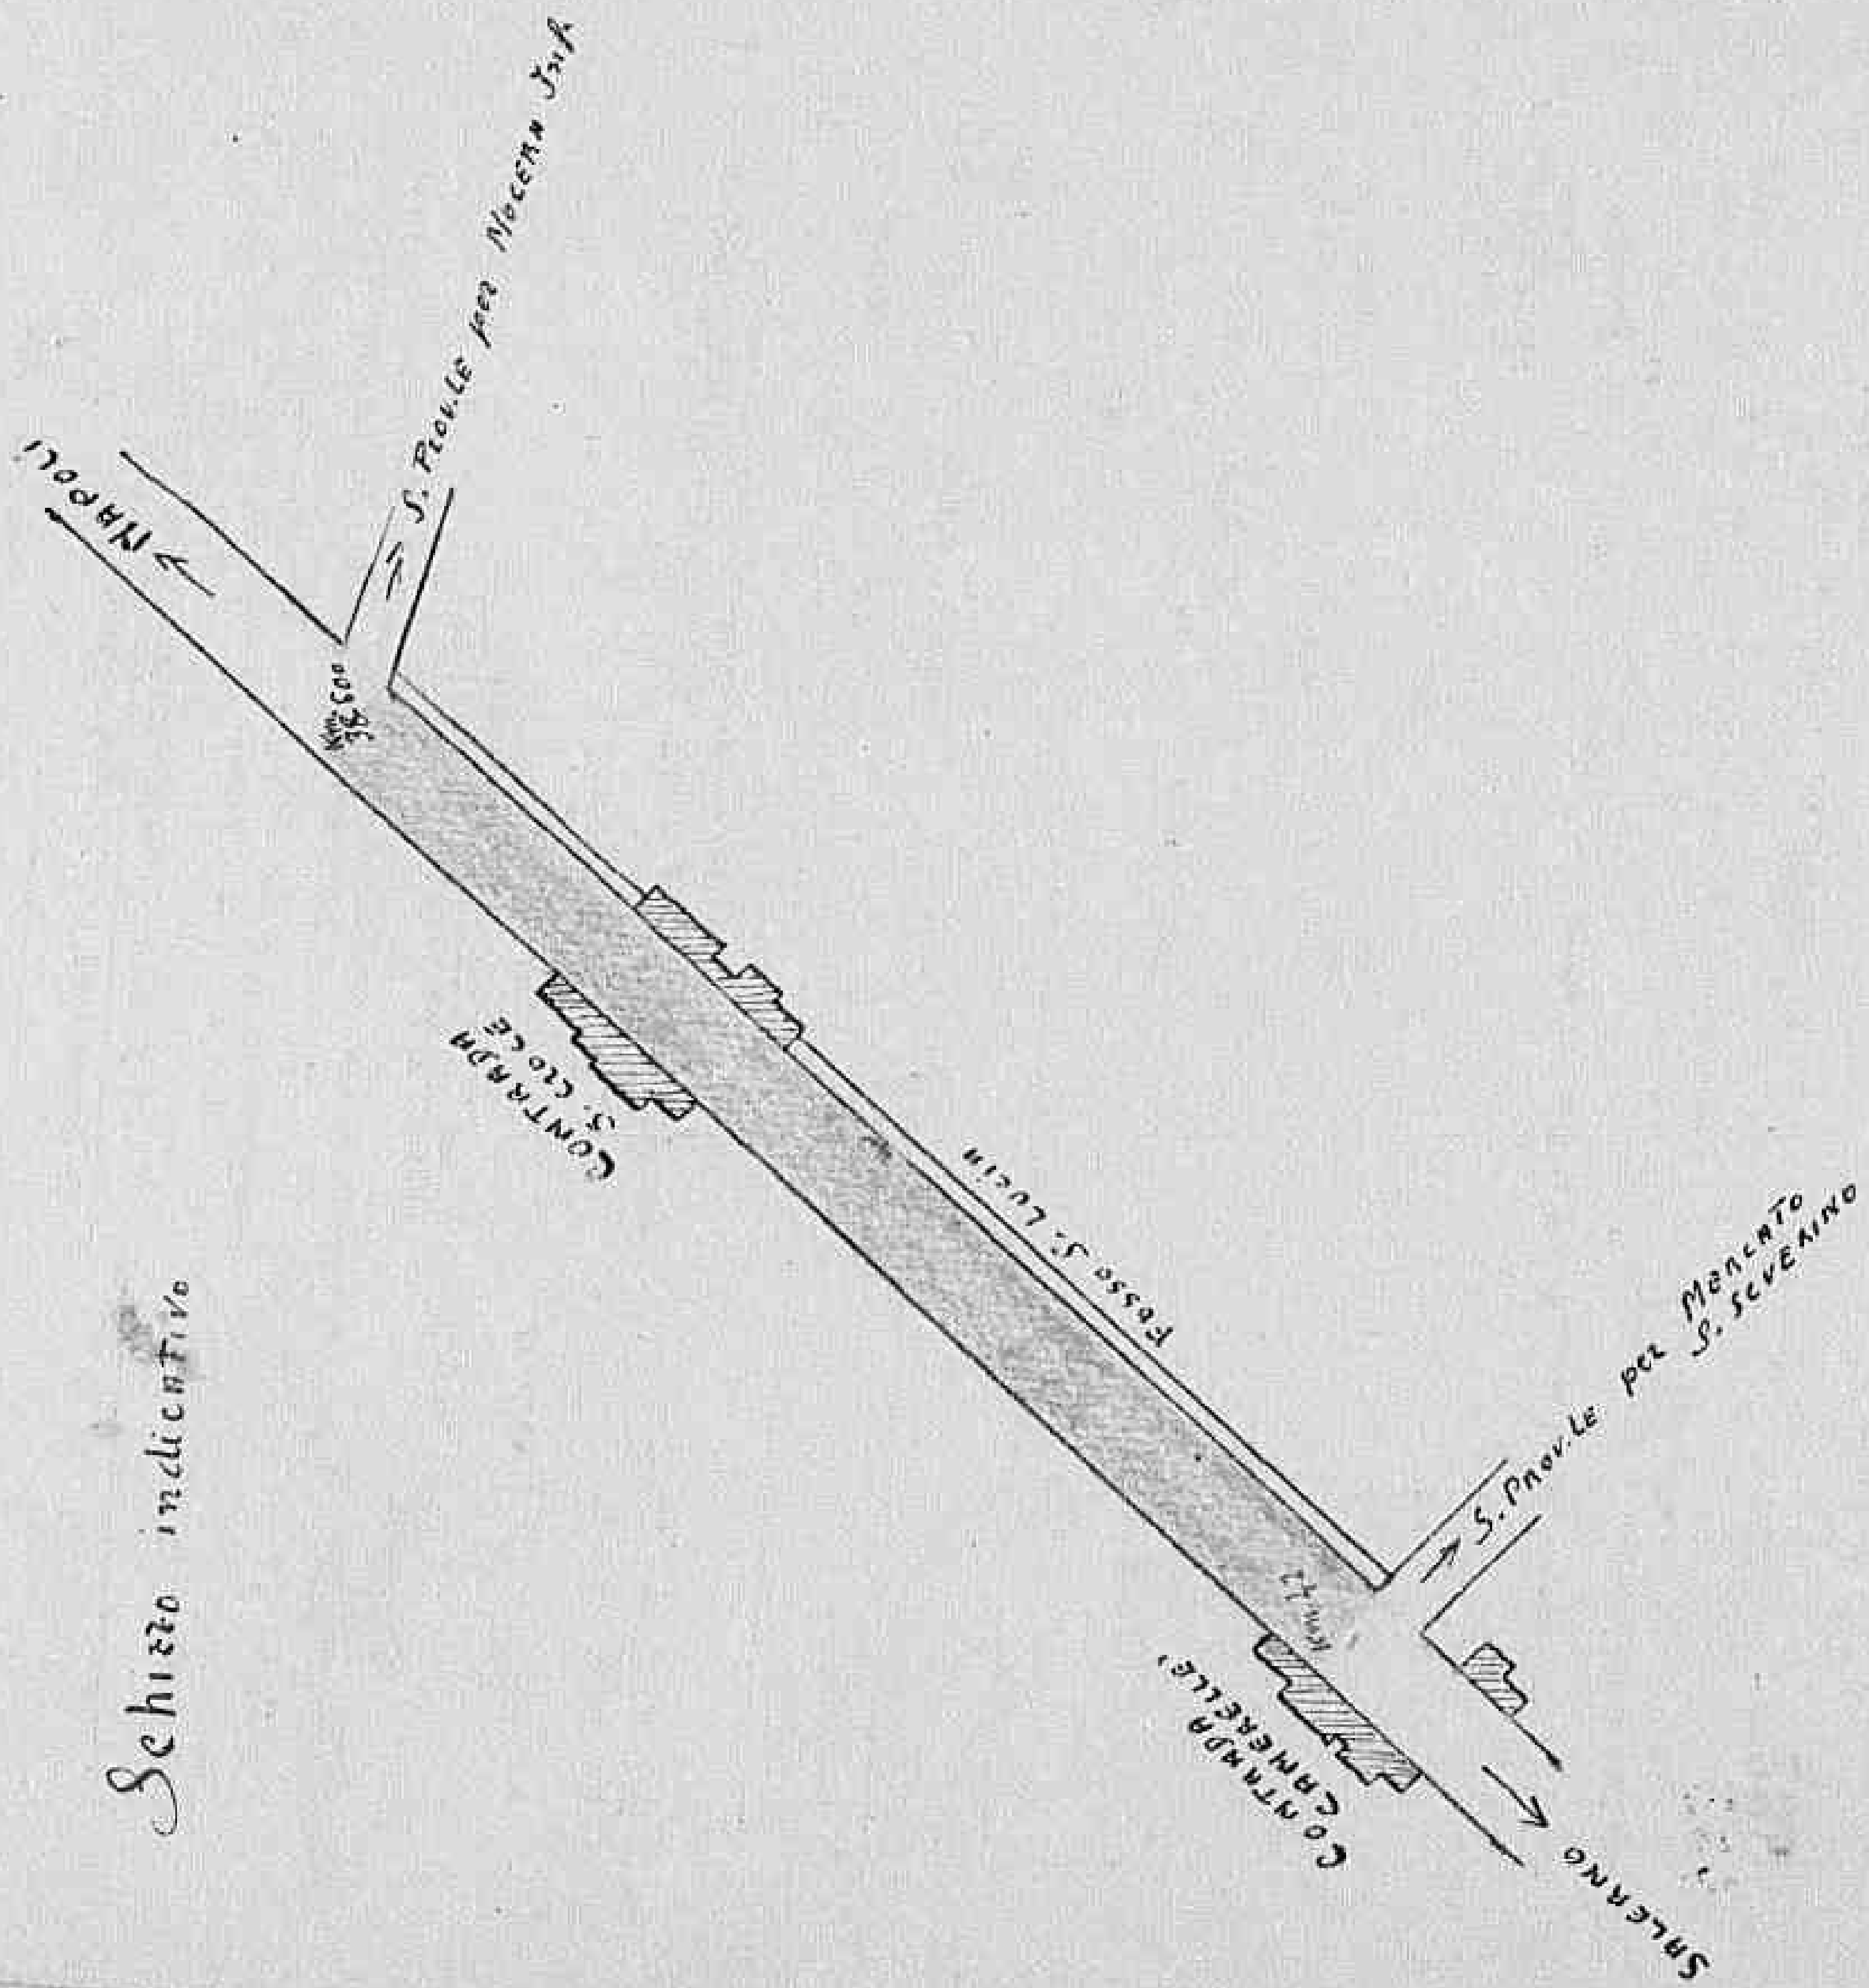

Schizzo indicativo

Form AAC(1)
(Estimate)
Rev. - 1 June 44**ALLIED CONTROL COMMISSION**
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried out

263

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H.Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. - a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc., and location **Maintenance of road n. 15 between Bari and Otranto for months october-november and december 1944**

(b) By contract or direct labour **direct labour**(c) Amount of approximate estimate **L. 1.210.000,=**

(d) Urgency of project

(e) Probable time for completion **3 months**

(f) Special remarks

2. - CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire **1.210.000=** has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer	Signature <i>Alvares</i>
	Official designation <i>Ing. Alvares</i>
	Date, and place <i>17 October 1944</i>
	285

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

1. - a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping str etc., and location **Maintenance of road n. 15 between Barl and Otranto for months october-november and december 1944**
(b) By contract or direct labour **direct labour**
(c) Amount of approximate estimate **£. 1.210.000,-**
(d) Urgency of project
(e) Probable time for completion **3 months**
(f) Special remarks

2. - CERTIFICATES:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire **1.210.000,-** has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer	Signature <i>demore</i>	Date 17 october 1944
	Official designation <i>ingegnere capo della 1^a R. R.</i>	285

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Regional Engineer, or his representative.

3. - APPROVED. (Highway Fund)

(Other funds)

W. & U.

W. & U. Sub-Commission A.C.C.

4. - APPROVED. Lt. Colonel *E.*

Deputy }
Acting } Director

W. & U. Sub-Commission
(Attied Commission)

Director, P. W. & U. Sub-Commission A. C. C.

Perizia

Costo

Region Southern

(APPROVALS)

Province Napoli

Statale n° 87 - Conv. Approvazione

1. (a) ~~Building-Bridge~~ Road, ~~Rover-Sun-Pumping~~ ~~Stable~~ ~~and~~ ~~Locker~~ ~~ne~~ ~~durante~~ ~~il~~ ~~periodo~~ ~~dal~~ ~~1.~~
~~del~~ ~~tronco~~ ~~compresso~~ ~~fra~~ ~~Napoli~~ ~~e~~ ~~Caserta~~
 (b) ~~By contract~~ or direct labour in economy
~~Per contratto~~ lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.650.000 (due millionised centesimi 400.000,00)

Quesada

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion.
Data probable per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note special

2 Certificates:

(e) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.650.000,00
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature _____
Firma _____

It. Mancini

284

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

Ing. Capo Genio Civile Viabilità Statale

Date, and place
Data e luogo

2/10/1944

11. 12. 13. 14. 15.

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regionel Engineer or his representative Date: Jan 22 1922

...of his representative.

Approved. Highway Fund!

~~Other funds:~~


Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. ~~Approved.~~

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

VB/ 22 Q. C. C.

120

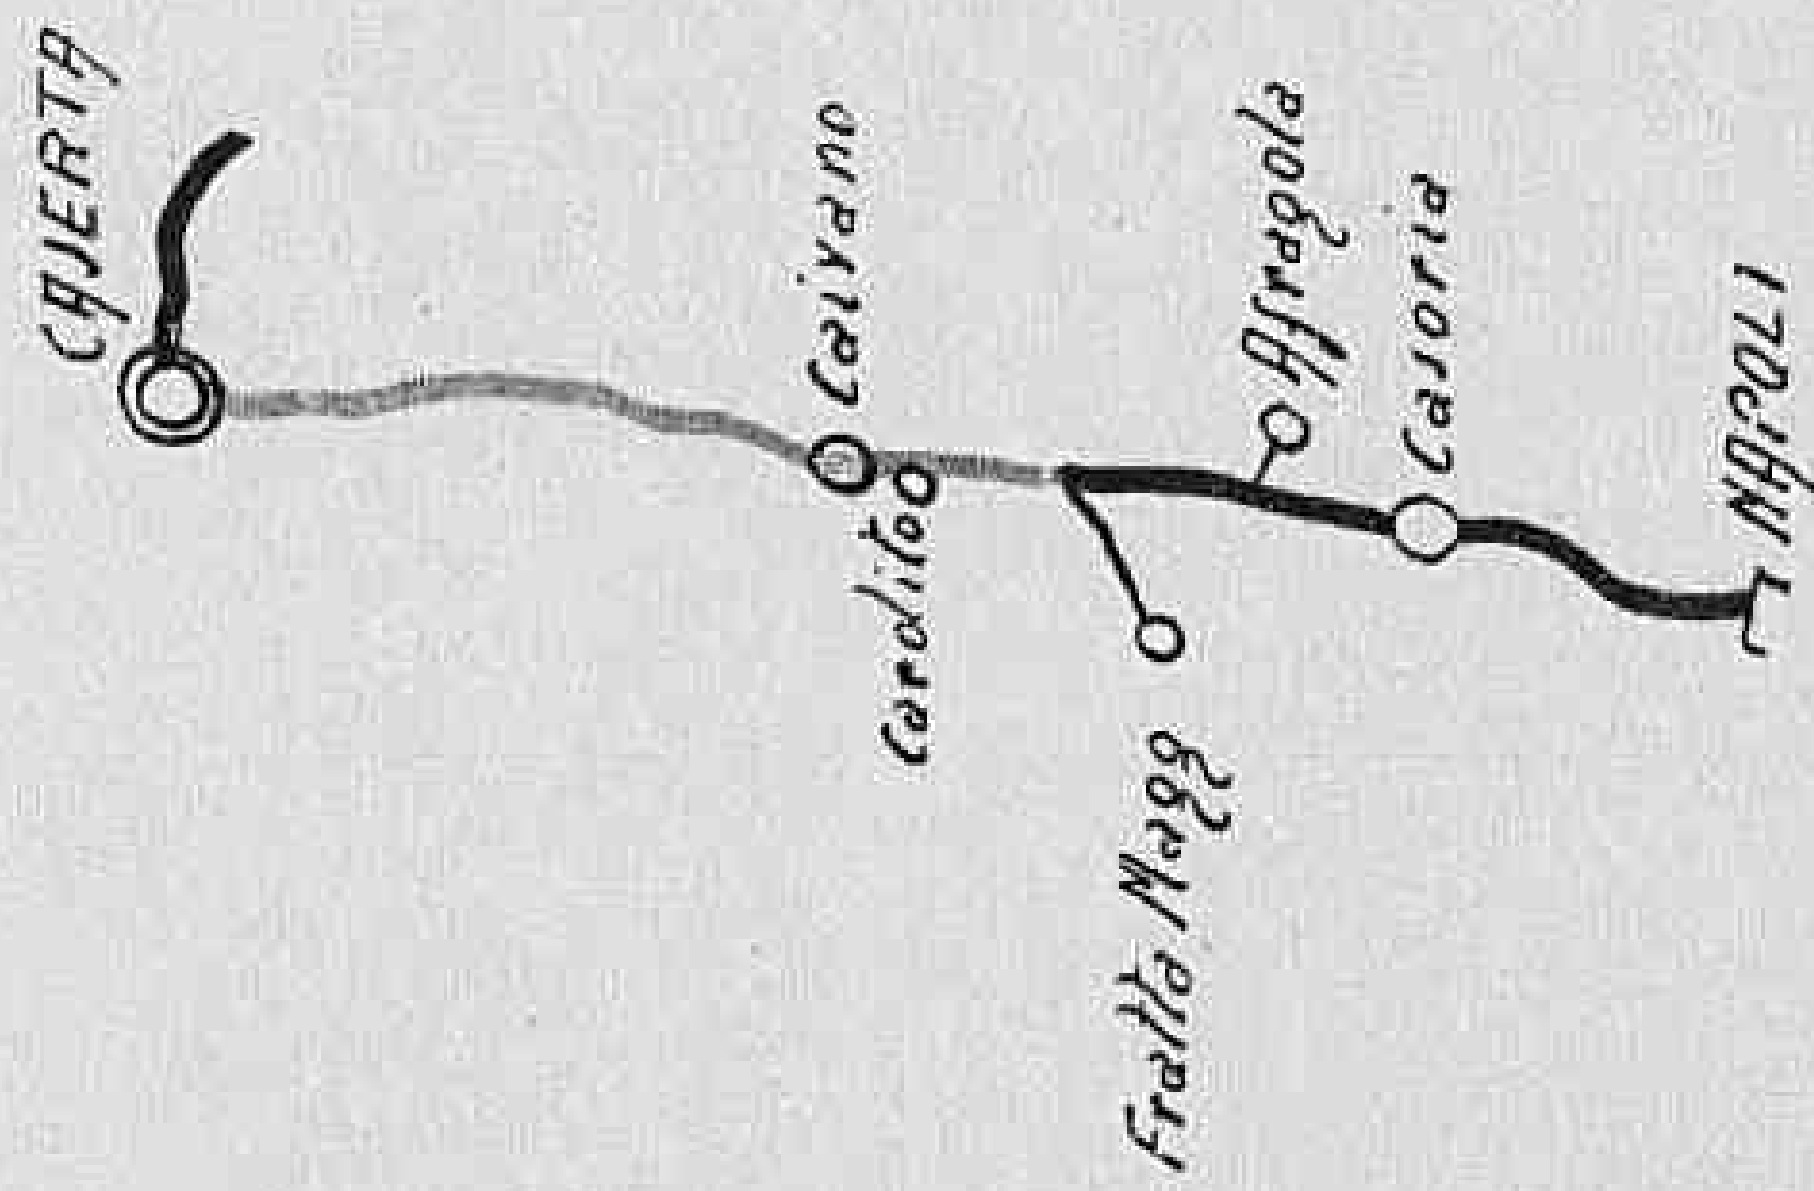

282

FORM ACE-1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILLIQUARE

Street lighting

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà resti-
turned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
tuita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region III

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Avellino

- Strada Statale N. 90- Lavori di riprese generali delle pavimentazioni degre
1. (a) Building Bridge, Road, Power, etc. and location data. Reliqua. Trattamento super-
fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
il tronco compreso fra il Ponte sul Galore ed Ariano Irpino -
(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in espansione

(c) Amount of approximate estimate L. 5.560.000 - L. 4.400.000 - L. 3.050.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La perizia di L. 5.560.000 riflette l'esecuzione dei lavori
Note speciali con l'esclusione del solo bitume; quella di L. 4.400.000 esclude an-
che il costo della graniglia in cava e quella infino di L. 3.050.000 esclude
pure il trasporto della graniglia su strada

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 5.560.000 oppure L. 4.400.000
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire
oppure L. 3.050.000;

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Raffaele Mancini

283

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

CAPO COMPARTIMENTO DELIA.A.S.S.

1004

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
 Region III^A
 Province Avellino

(APPROVALS)
Approvazioni

Strada Statale N. 90 - Lavori di ripara generale delle pavimentazioni degradate.
 1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sta. Pumping Sta. etc. and location. Data mediante trattamento super
 l'abbigliamento, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località. Piccola con bitume a caldo lungo
 il tronco compreso fra il Ponte sul Calore ed Ariano Irpino -

(b) By contract or direct labour
 Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 2.560.000 - L. 4.400.000 - L. 3.050.000
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente ed indifferibile
 Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
 Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La perizia di L. 2.560.000 riflette l'esecuzione dei lavori
 Note speciali con l'esclusione del solo bitume; quella di L. 4.400.000 esclude an-
 che il costo della granglia in cava e quella infino di L. 3.050.000 escludo
 pure il trasporto della granglia su strada.

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.560.000 oppure L. 4.400.000
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire oppure L. 3.050.000;

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature 283
 Firma R. MARCINI

Italian Engineer CAPO COMPARTIMENTO DELL'A.A.S.S.
 Ingegnere Italiano Designatore Ufficiale

Date, and place 13 SET. 1944 4894
 Data e luogo Caserta

I agree with the preceding certificate and recommend approval.


OK gfbj
 Regional Engineer, or his representative.
 Date 28.10.1944

2. Approved. (Highway Fund)
 Other funds: M.C. 26/10/1944
 Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.
 Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
 L. COL. R.E.

MINISTER OF PUBLIC WORKS

17-6

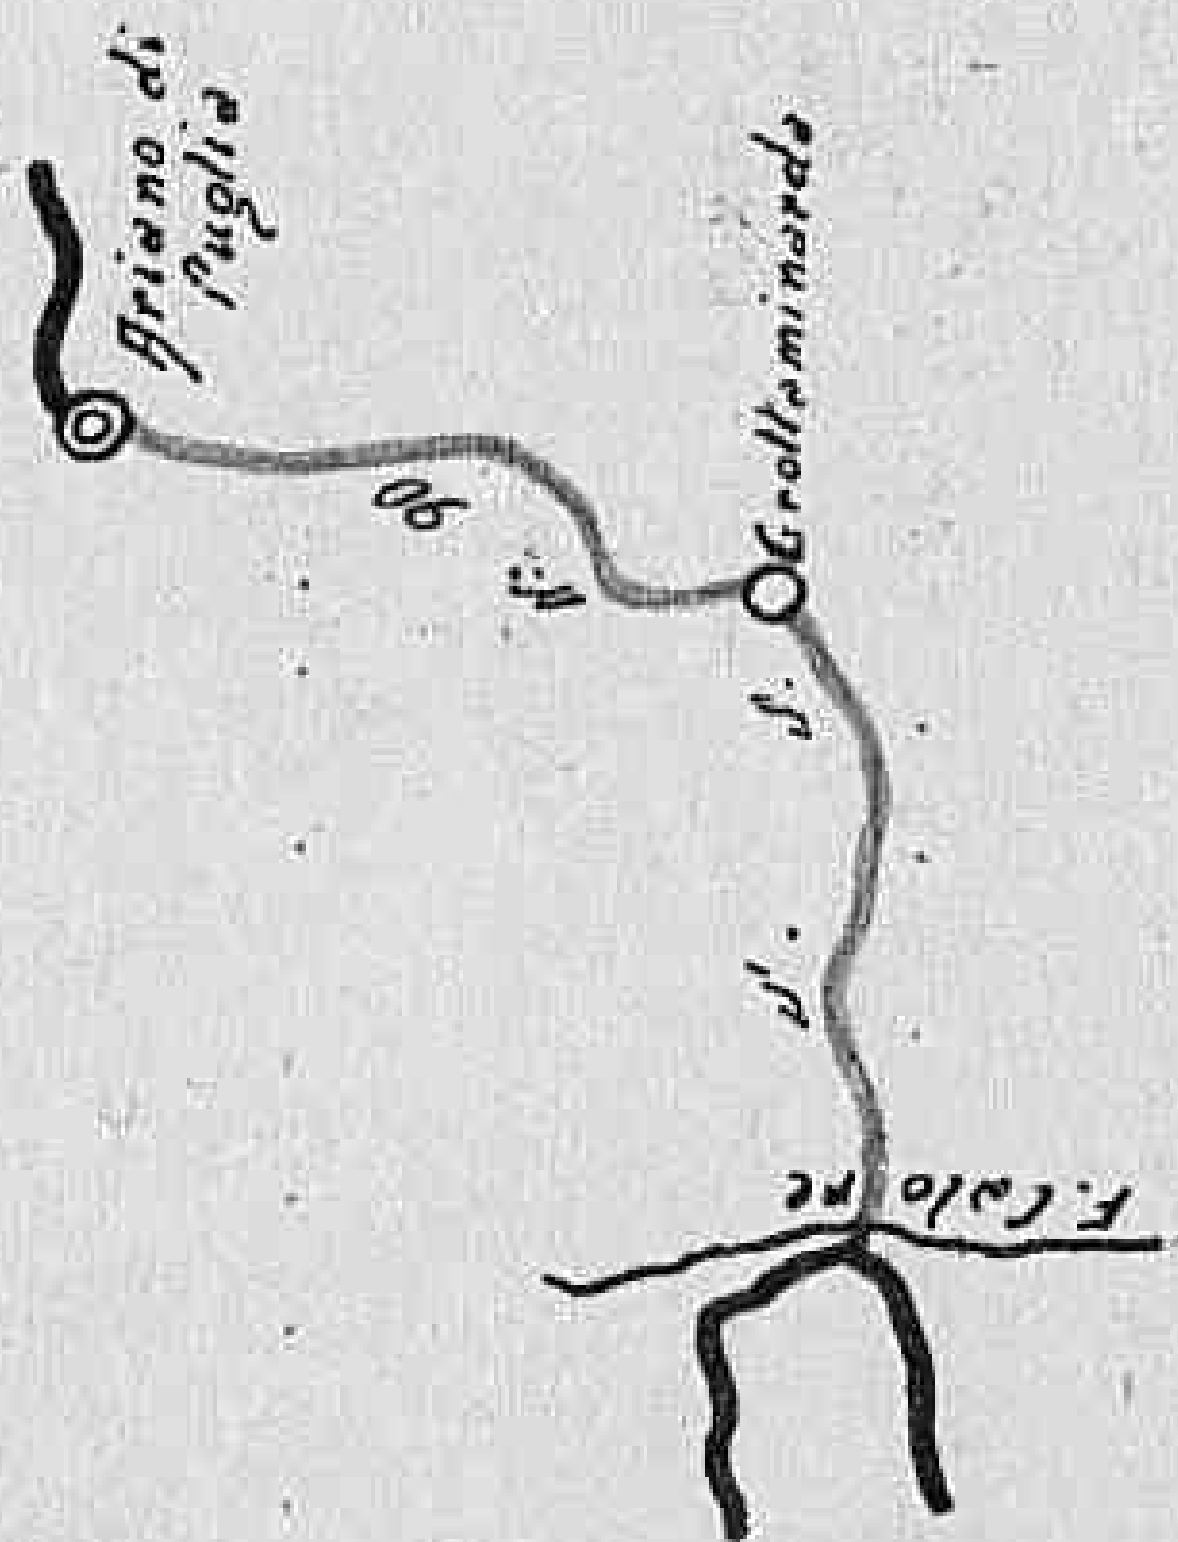

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

Seal Coating

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form is to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form is to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region III

Province Napoli

Strada Statale N. 6 - Lavori di ripresa generale delle pavimentazioni degli
(a) Building, Road, Power-Sin, Pumping-Sin etc. and location date mediant treatment to su
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, idraulica etc. e località Periziale con bitume a caldo 100
80 il tronco tra il bivio per S. Pietro Infine e lo Spartimento Abruzzi
(b) By contract or direct labour Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 8.570.000 oppure L. 6.390.000 oppure L. 3.660.000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La previsione di L. 8.570.000 riflette l'esecuzione del lavoro
ri con l'esclusione del solo bitume, quella di L. 6.390.000
esclude anche il costo della graniglia in cava e quella infine di lire
3.660.000 esclude pure il trasporto della graniglia su strada

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.570.000 oppure L. 6.390.000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire oppure L. 3.660.000

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official Designation Capo Compartimento dell'A.A.S.B.

282

Date, and place Caserta 11 SET 1944 1944

4831

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Napoli

Strada Statale N. 6. Lavori di riprese generale delle pavimentazioni degli
 1. (a) Building-Bridge, Road, Power-Sin, Pumping-Sin-ele-and location. date mediana trattamento su
 Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc., e località. Periziale con pianta e profilo. In
 ed il tronco tra il bivio per S. Pietro Infine e lo Sperimento Abruzzi -
 (b) By contract or direct labour
 Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 1.6.570.000 oppure 1.6.390.000 oppure 1.7.660.000
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente ed indifferibile
 Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: mesi due
 Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La previsione di L. 8.570.000 riflette l'esecuzione dei lavori
 Note speciali in con l'esecuzione del solo Bivio, quella di L. 8.990.000 -
 esclude anche il costo della graniglia in cava e quella infine di Loro
 3.660.000 eccedente pure il trasporto della graniglia su strada.

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 8.570.000 oppure 1.6.390.000
 Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire oppure L. 3.660.000

has been prepared by me. It covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me: essa risponde a tutti i del richiedi del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Ref. Reale Mario Ind. App. 282

Italian Engineer

Ingegnere Italiano

Official Designation

Designazione Ufficiale

Date, and place

Data e luogo

Casserta 11 SET. 1944

4831

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)

Other funds

Regional Engineer, or his representative.


Chief, Public Works Div. P. W. & U Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

H. R. A. C. C.

16a

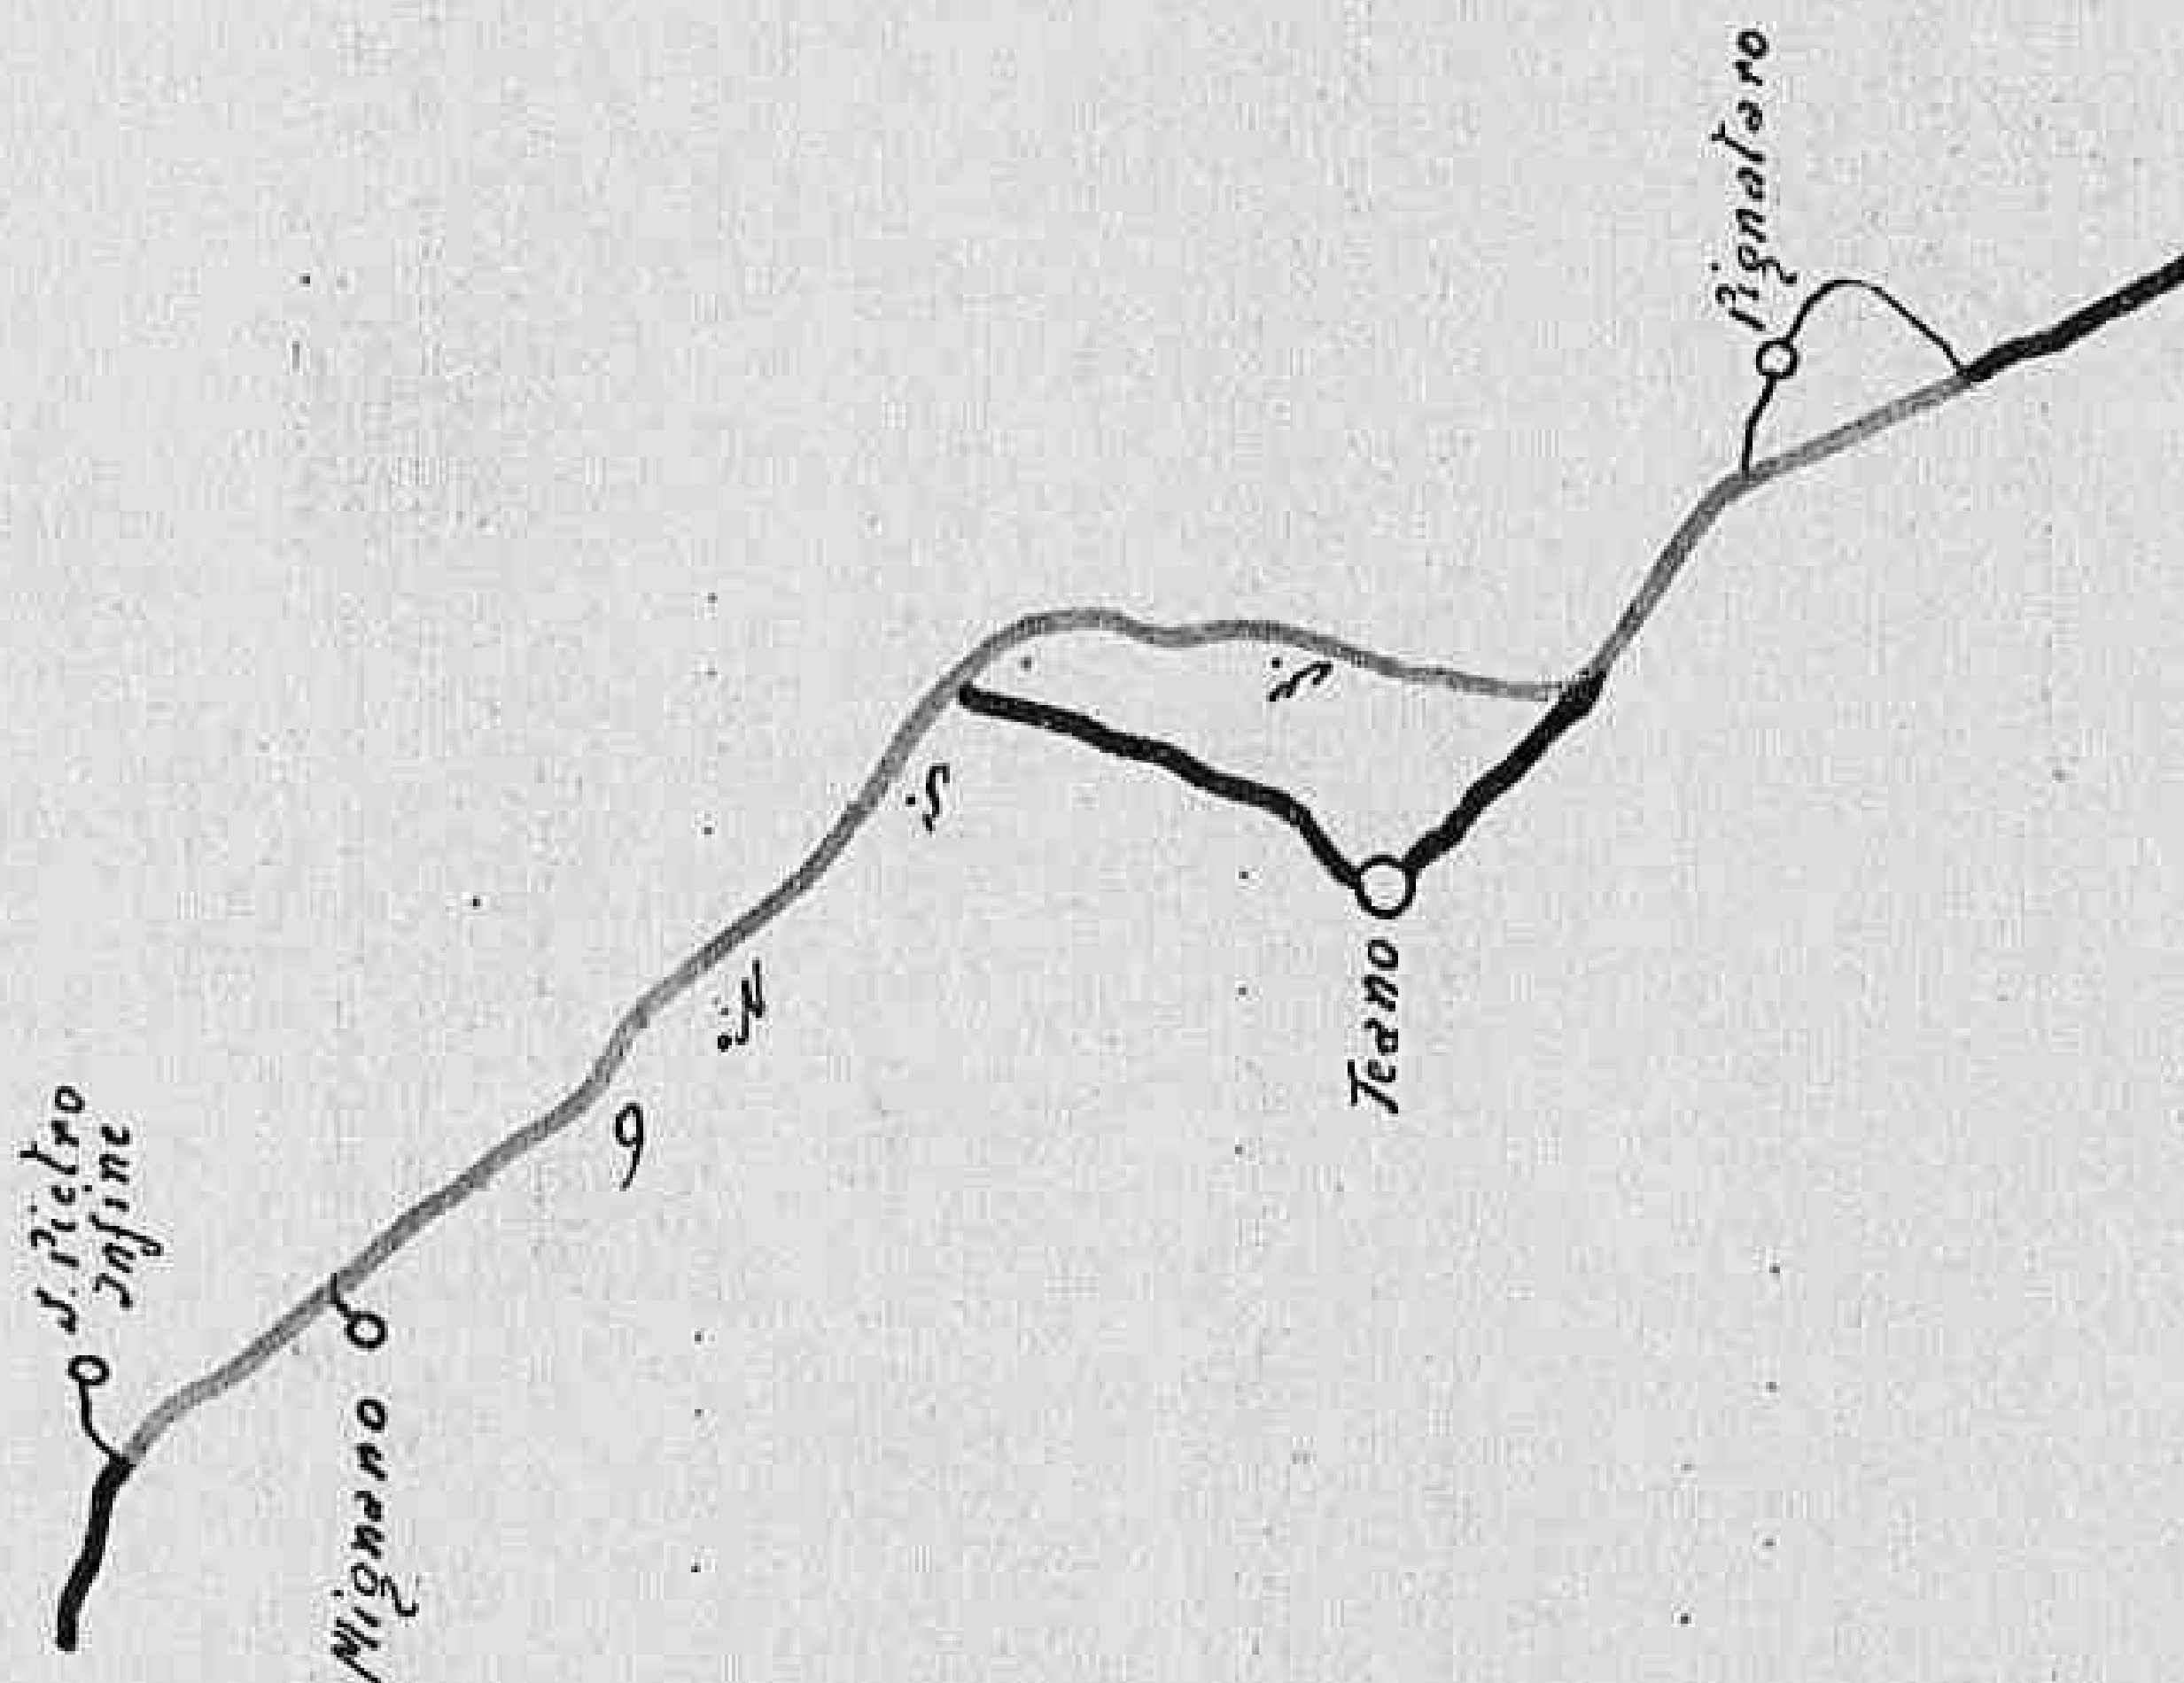

182

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo
---------	-------

(APPROVALS)

Approvazioni

Region	Province
--------	----------

Region	Province
--------	----------

1. (a) ~~Building Bridge~~ Road, ~~Power Sta.~~ ~~Pumping Sta.~~ ~~etc.~~ ~~and~~ ~~location~~ ~~spondenza dei ponti ubicati~~ ~~della Strada Statale~~ ~~no 6 "Gasilina"~~ ~~per contratto~~ ~~per contratto~~

Lavori di sistemazione dei passaggi provvisori in corri

(b) By contract or direct labour

165+980 e 170+960

(c) Amount of approximate estimate L. 820.000.00 (Liro ottocentoventimila)

Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente ed indifferibile

Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi quattro

Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I lavori sono stati richiesti dal Cap. PARRY MARSHALL RE

Note speciali HC32 - CRE RET-LETTER - AUG. 1944 1/2/10

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 820.000.

Certifico che l'acclusa ~~perizia~~ ~~ammontante a lire~~ ~~ammontante a lire~~

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Ing. R. Mancini

281

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

Ingegnere Capo del Genio Civile per la Viabilità Statale

Date, and place
Data e luogo

Caserta

23 OTT. 1944

n° 5433

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Penzance Region Campania
 (APPROVALS) Province Napoli
 Approvazioni
 1. (a) Lavori di sistemazione dei passaggi provvisori in corri
Building Bridge Road, Power Sta. Pumping Sta. and local sponda dei ponti ubicati
centrali alla strada statale 165+980 e 170+980
della Strada Statale n° 6 "Casiling"
 (b) By contract or direct labour per contratto
 Per contratto per contratto
 (c) Amount of approximate estimate L. 820.000.00 (lire ottocentoventimila)
 Ammontare della perizia
 (d) Urgency of project: urgente ed indifferibile
 Urgenza del progetto
 (e) Probable time for completion: mesi quattro
 Data probabile per l'esecuzione
 (f) Special remarks I lavori sono stati richiesti dal Gen. PARRY MARSHALL RE
 Note speciali HQ82 = CRE REF-LETTER - AUG. 1944 1/2/0

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 820.000.=
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
 has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer Signature Ing. R. Minocini 281
 Ingegnere Italiano Official designation Ingegnere Capo del Genio Civile per la Viabilità
 Designazione Ufficiale Statale
 Date, and place Caserta 29 Oct. 1944 n° 5432
 Data e luogo


I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.
 2. Approved. (Highway Fund) Other funds
 Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. Get
 Lt. Colonel R. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

VB/
 H. R. A. & G.
 Deputy Director
 & U. Sub Commission
 (Chief Commission)

(40)

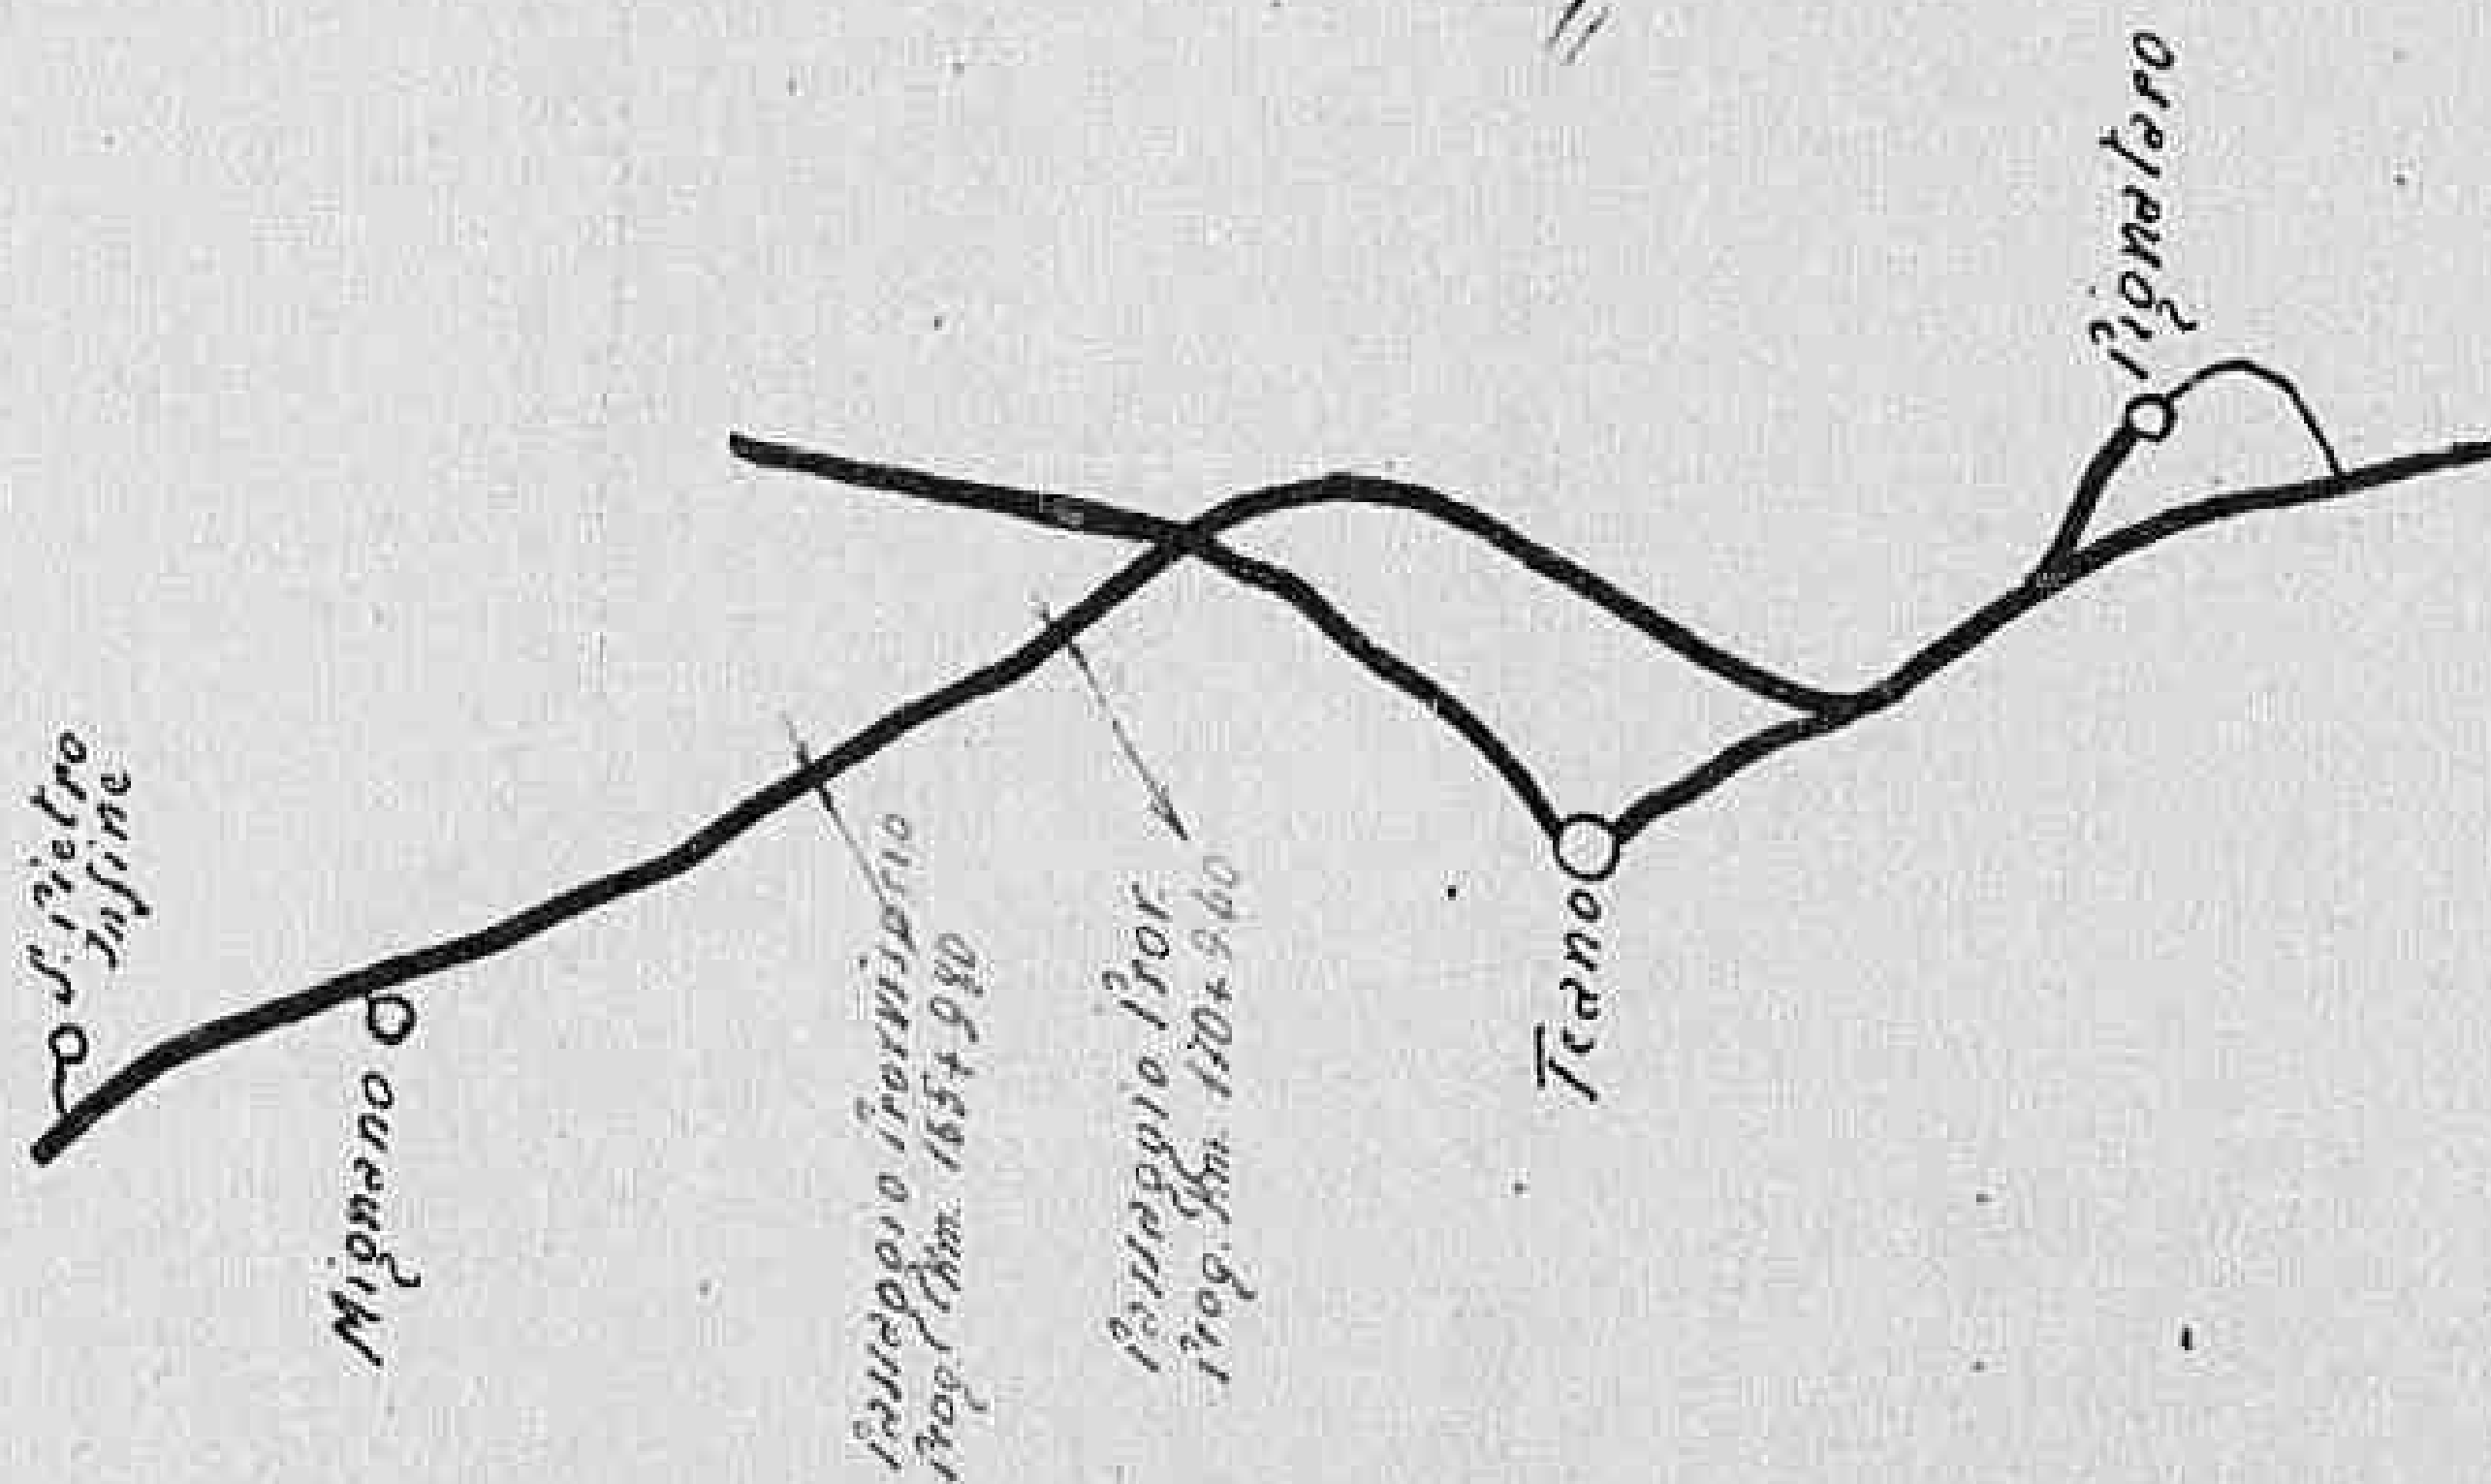

FORM A.C.C. 1
(Estimate Rev. 7 June 49)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Urgente

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

Region

STRADA MILITARE

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commission. H. Q., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sub-Commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Napoli

1. (a) ~~Building Bridges Road, Pavesi-Sinigaglia, 1940-1941~~ ~~Progetto di strada, centro Sinigaglia-Pavesi~~ ~~Lavori straordinari di riparazione del tronco della strada statale n. 7 compreso fra Caserta ed il bivio per Arienzo~~

- (b) ~~Backpack or direct labour~~ ~~Prodotto lavoro in economia~~ ~~in economia~~

- (c) Amount of approximate estimate L. 2.620.000.- (duemilioni seicentoventimila)
Ammontare della perizia

- (d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

- (e) Probable time for completion: mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

- (f) Special remarks: I lavori previsti si rendono necessari per completare la sistemazione e la riparazione del piano viabile, sottoposto ad un traffico intenso e pesante.
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.620.000.-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
- has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Ing. R. Mancini

Italian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione Ufficiale

Capo Compartimento della Viabilità

Date, and place
Data e luogo

CASERTA

21 OCT. 1944

N. 785019

(b) I agree with the preceding certificate and contents

(APPROVALS)

Wapoli

Approvazioni

Lavori straordinari di riparazione del tronco della strada
Building Bridge Road, Pawan Singh Pumping Station and Trunk
Fahim Khan Road, Pawan Singh Pumping Station, State No. 7 compreso fra Ca-
Fahim Khan Road e Fahim Khan Road, Pawan Singh Pumping Station, State No. 7 compreso fra Ca-

(b) Recontract or direct labour in economia
~~Recontrattazione~~ ~~lavoro in economia~~

(c) Amount of approximate estimate L. 2.620.000. = (duemilioni seicentoventimila)
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion..... mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

Special remarks

I lavori previsti si rendono necessari per completare la sistemazione e la riparazione del piano viabile, sottoposto ad un traffico intenso e pesante.

Note speciali

2. Certificates:

Certification

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2,620,000. =
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable amount,
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature _____
Firma _____

Ing. R. Mancini

Firm's

Italian Engineer

Ingegnere Maliano

Official designation.....Capo Compartimento della Viabilità

Designazione Ufficiale

Date, and place.

CASERTA

1044

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date: Oct 28 1992

Regional Engineer, or his representative.

Approved. (Highway Fund)

(Other funds):

geb.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.


3. Approved.

Lt. Colonel R. B. Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C. Deputy)

Deputy } Director

H. R. P. B.
W. & U. Sub Commission
(Allied Commission)

(Allied Commission)

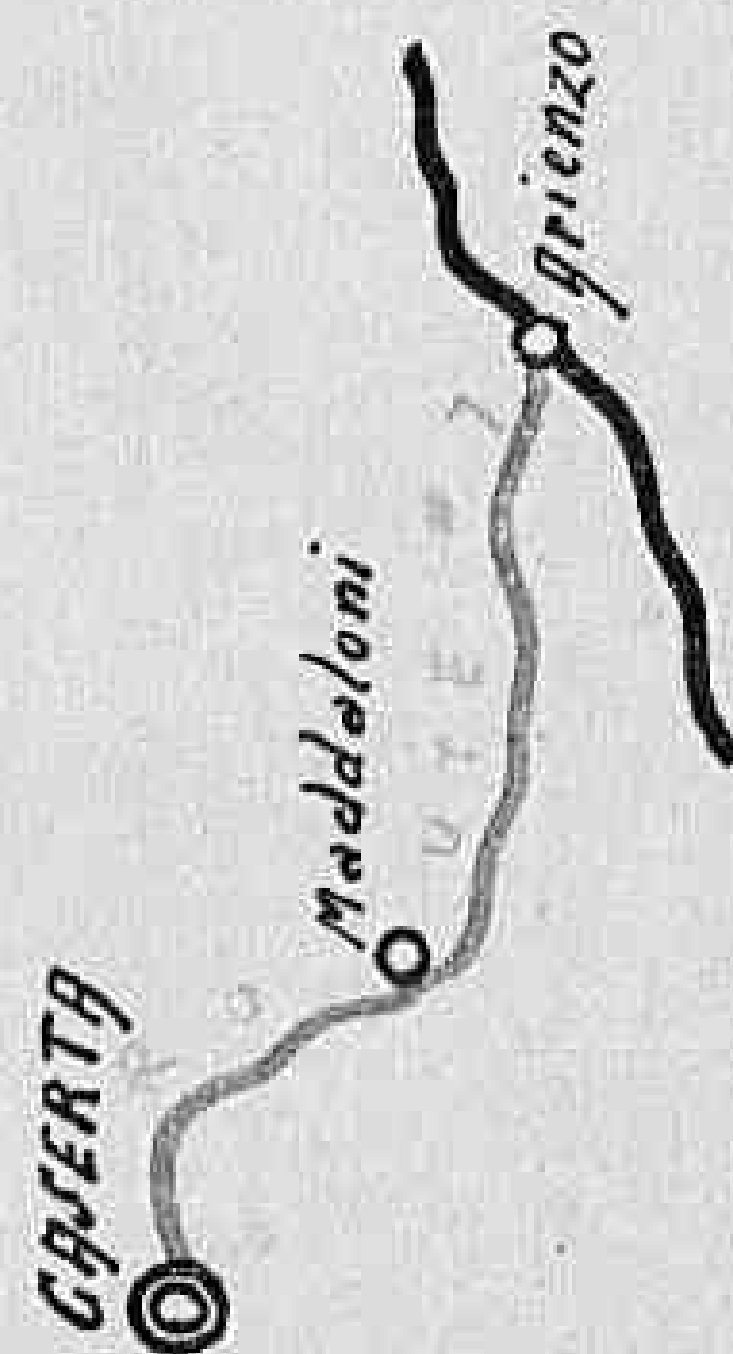

Serial PWT/R/35

FORM ACC.
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. *Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.*

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Southern

Province Potenza N. 3442

1. (a) Building-Bridge, Road, Power-Stn., Pumping-Stn. etc. and location *Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località*

Provincial Rd. to Consenza Provincial Rd. (Kz. 37) Estimate for extraordinary maintenance for three months (1 October to 31 December 1944)

(b) By contract or direct labour *Contratto*
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate *Importo approssimativo della perizia*
L. 970.000,00X

(d) Urgency of project: *Urgenza del progetto*

(e) Probable time for completion *Data probabile per l'esecuzione*
Three months

(f) Special remarks *Note speciali*

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire *Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire*
L. 970.000,00X

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. *è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.*

Signature
Firma

Italian Engineer

279

Region.....Southern
Province.....Potenza P. 2442

1. (a) Building-Bridge, Road, Power-Stn, Pumping-Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
 By 105th Editorial Office-Military
 By-Section from Taranto
 Provincial Bdy to Comune Provinciale Bdy (Kn. 37) Estimate for extraordinary
 maintenance for three months (1 October to 31 December 1944)

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
 Contract

(c) Amount of approximate estimate	Ir. 970,000,000
<i>Ammontare dell'a perizia</i>	

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note special/

2. Certificates:
Certificate

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire~~1,970,000,000~~
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature _____
Firm _____

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation ~~Chino Special~~ ~~Ufficiale Speciale~~ ~~Chino Speciale~~ per la
Designazione Ufficiale ~~Chino Speciale~~ ~~Ufficiale Speciale~~ ~~Chino Speciale~~ per la

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and ~~recommend approval~~

Regional Engineer, or his representative. W. J. D. D. D. Date 14 Oct 1964

2. Approved. (Highway Fund)

(Other ~~fetus~~)

G. S. G. A. Chief, Public Work Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. Lt. Colonel R. E.

Deputy } Director
 } wing

U. S. Sub Commission
on the Commission

SOUTHERN REGION
ALLIED CONTROL COMMISSION
BARI ZONE

Ref. BZ/PU/2/4
16. October 1944

*C/PW
C/S*

Subject: FORM ACC/1

To : LT.COL. THOMPSON, H.Q. A.C.C. PW&U S.C. ROME

Herewith Formm ACC/1 for 3 months (1st October-31st December 1944) maintenance for Highway 106 from TARANTO PROVINCIAL BDY-COSENZA PROVINCIAL BDY, for your approval to debit against the Highway Fund.

This Section of Highway 106 is named in the CE II District Priority, reference 14CE/101 of 20.8.44 for general gravel maintenance.

W. Knight
Major W. Knight
P.W.&U. SUB COMMISSION
Bari Zone

278

FORM AEC-1
(Estimate Rev. 17 June 1964)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

NOTE: This form is for

This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Costo	LAPEIN
-------	--------

(APPROVALS)

Approvazioni

[illegible]

(c) Amount of approximate estimate L. 2,700,000.00 (lire) diventazioni
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion.....**mei quattro**
Data probable per l'esecuzione

(f) Special remarks Note speciali	La ricostruzione del ponte si rende assolutamente necessaria per evitare che nella stagione delle piogge le acque di piena possumo inondare la campagna limitrofa per la insufficiente sezione idrica assegnata al deflusso delle acque attinverno il passaggio provvisorio	Certificates:
--------------------------------------	---	---------------

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire..... 2,700,000.00
 Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire.....

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature _____
Firma _____

Jeffery Mancini

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designation officielle

Capo Compartimento della Viabilità

Date, and place.

Caecata = 9

10

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Region Southern
Province Napoli

Perizia Lavori di ricostruzione del ponte sul torrente di Somma al
(APPROVALS)
Approvazioni
fabbrica ponte, rete di pompaggio, etc. e test della provvisoria l.m. ca. 3.7600
della strada statale n. 7 bis

(b) By contract off per contratto
Per contratto per contratto

(c) Amount of approximate estimate L. 2.700.000.00 (lire due milioni settecentomila)
Ammontare delle perizie

(d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La ricostruzione del ponte si rende assolutamente necessaria
Note speciali per evitare che nella stagione delle piogge le acque di piena possano
inondare le campagne limitrofe per la insufficiente sezione idrica assegnata
al deflusso delle acque attraverso il passaggio provvisorio

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.700.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me. It covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Raffaele Mancini

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Capo Compartimento della Viabilità
Designation Ufficiale

Date, and place
Data e luogo

Caserta 20 OTT 1944

2778

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

Regional Engineer, or his representative.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.


3. Approved.

Lt. Colonel R. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Director

REG. ENO. REG. III. & U. Sub-Commission
(Commission)

(39)

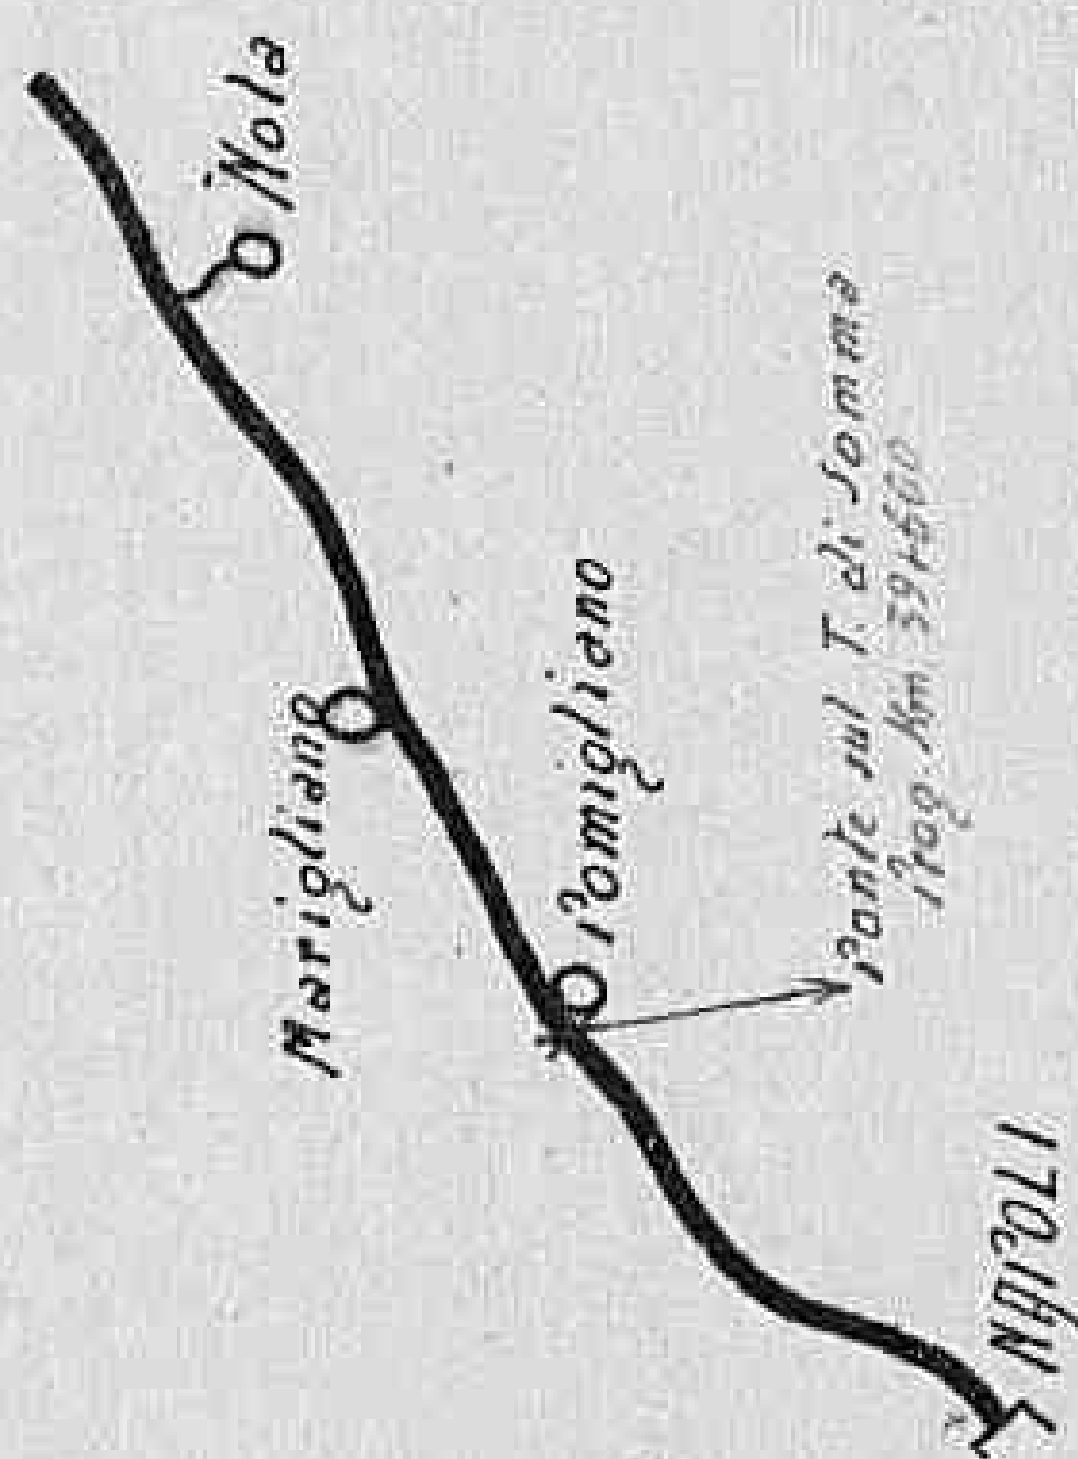

FCB-1, AGO, 1
(Estimate Rev. 7 June 45)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, Italy. *Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.*

MILITARY HIGHWAYS.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Southern.

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sln, Pumping Sln etc. and location Autostrada Napoli-Pompei Trattato
Febricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località to Bivio S. Giovanni-Pompei

(b) By contract or direct labour Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate I.250.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente perchè strada a carattere militare danneggiata dagli alluvioni
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31-12-44
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks non occorrono materiali contingenti
Note speciali

1503
NAPOLI 15 OTT 1944
L'ISPIETTORE GENERALE

2 Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I.250.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount, *è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.*

Signature *ing.*

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ing. Ingegnere di Sezione
Designazione Ufficiale

276

10-10-44

MILITARY HIGHWAYS.

Region SOUTHERN.Province Napoli

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sln, Pumping Sln etc. and location Autostada Napoli-Pompei Treat-
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
to Bivio S. Giovanni-Pompei

(b) By contract or direct labour Per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate I.250.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente perchè strada a carattere militare danneggiata da-
Urgenze del progetto gli alluvioni
ISPELTORE SUPERIORE GENIO CIVILE

(e) Probable time for completion 31-12-44
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks non occorrono materiali contingenti
Note speciali

NAPOLI

Viso: si applica in base tecnica

1503 NAPOLI 13 OCT 1944

L'ISPELTORE GENERALE



2 Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I.250.000,00

Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature

m

Italian Engineer
 Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere di Sezione
 Designazione ufficiale

Date, and place
 Data e luogo

10-10-44

276

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

Regional Engineer, or his representative.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

Lt. Colonel R. E.


3. Approved. Deputy

Acting

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

P. W. & U. Sub-Commission

(Attied Commission)

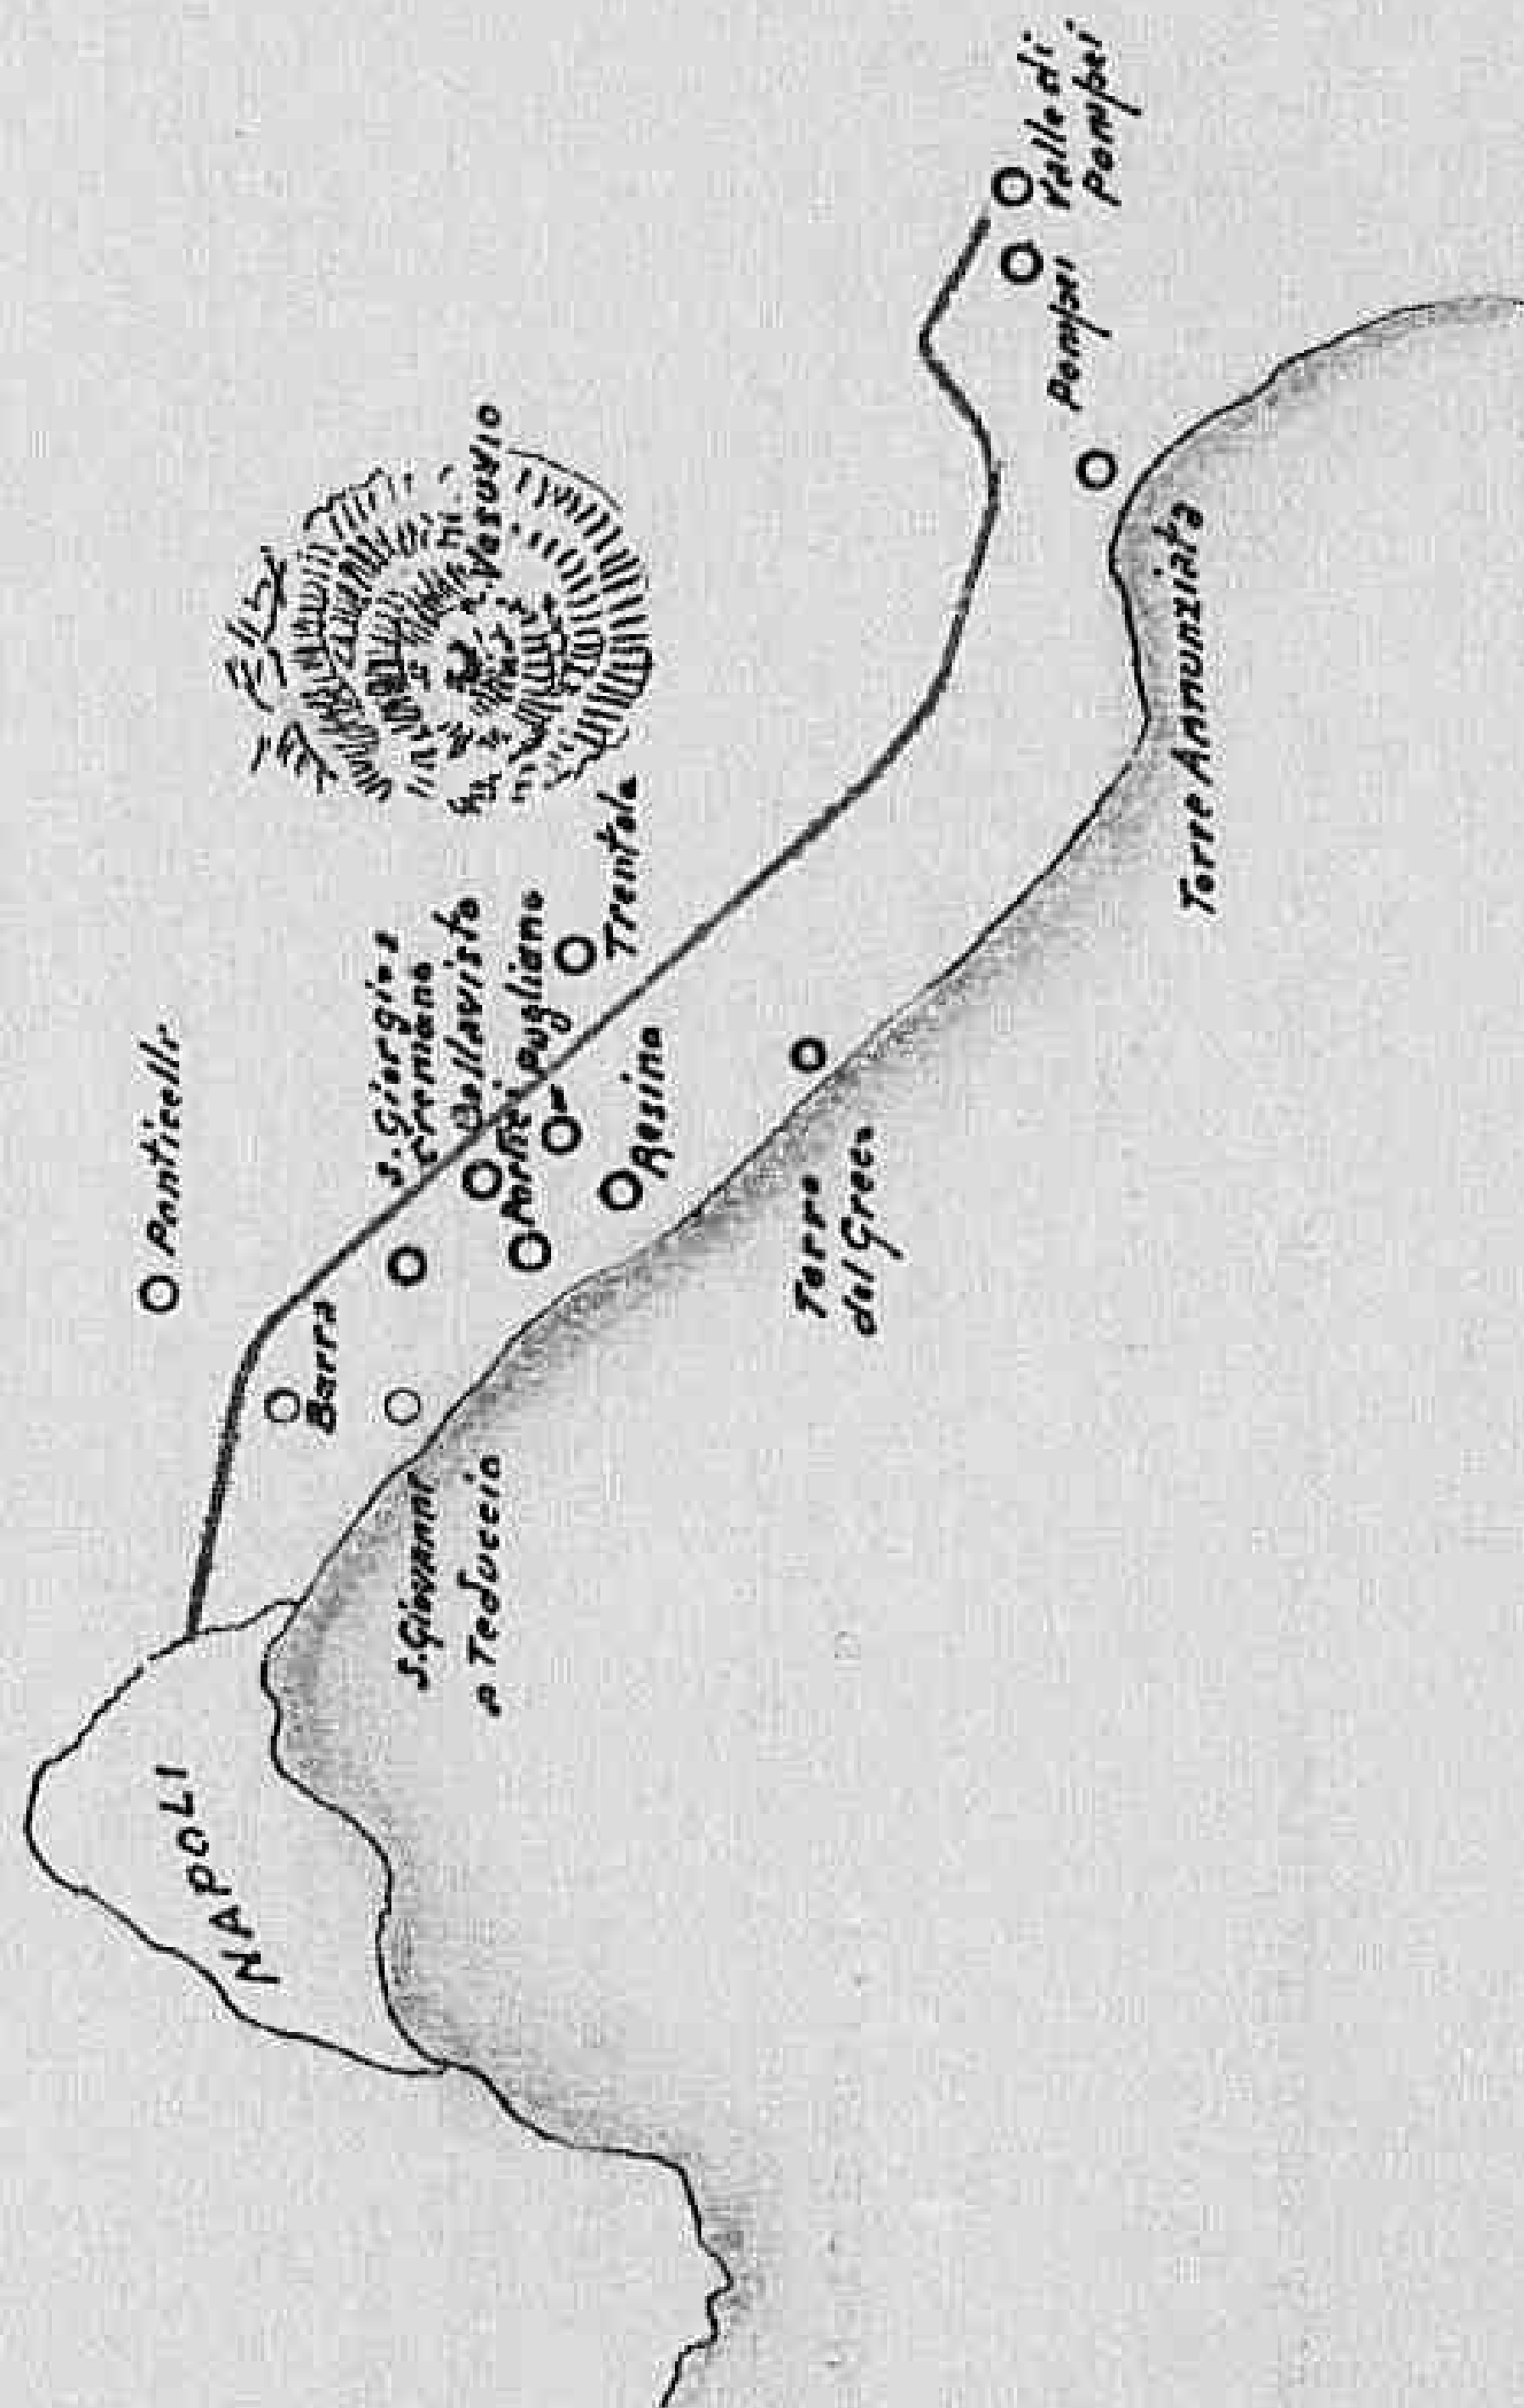

FORM ACC. 1
(Estimate, Rev. 7 June 40)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This module va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

MILITARY HIGHWAYS

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region SOMMER

(APPROVALS)
Approvazioni

Province NAPOLI

1. (a) Building, Bridge, Road, Power-Site, Pumping-Site etc. and location S. IS. Lavori urgenti per lo
 Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località gomboro della sede stradale ad
 (b) By contract or direct labour in economia tratto tra Torre del Greco e Torre Annunziata
 Per contratto o lavoro in economia

- (c) Amount of approximate estimate L. 180.000,00
 Ammontare della perizia

- (d) Urgency of project: urgente
 Urgenza del progetto

- (e) Probable time for completion giorni 15
 Data probabile per l'esecuzione

- (f) special remarks trattandosi di interruzione del transito i lavori sono
 Note special stati già iniziati.

2. Certificates: Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 180.000,00 =
 Certificato che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable 275ount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. R. Affuso Nancini
 Firma

Italian Engineer
 Ingegnere Italiano

Official designation CAP. QUARTIERMESTRO A.A.S.S. CASERTA

Designazione Ufficiale

Date, and place Caserta 11 20 SET 1944

147

Perizia Costo (APPROVALS) Province Region

1. (a) Building—Bridge, Road, Power, etc. and location: S. I.R. Lavori urgenti per la
fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località
vicino tra Torino del Graco e Torre Annunziata
- (b) By contract or direct labour in economy
 Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate Lu. 180.000,00
 Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: urgente
 Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion giorni 15
 Data probabile per l'esecuzione
- (f) special remarks trattandosi di interruzione al transito i lavori sono
 Note speciali

2. Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire Lu. 180.000,00
 Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire
 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable 275
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
 Ingegnere Italiano

Signature Ing. A. Afratolo Mancini
 Firma

Official designation CAPO QUARTIERE A.A.S.S. CASERTA
 Designazione Ufficiale

Date, and place CASERTA 11 20 SET 1944
 Data e luogo

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

Regional Engineer, or his representative.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.


Lt. Colonel P. W. & U. Sub-Commission A. C. C.

Deputy } Director
 Acting }

P. W. & U. Sub-Commission

(Noted - omission)

Pianta indicativa

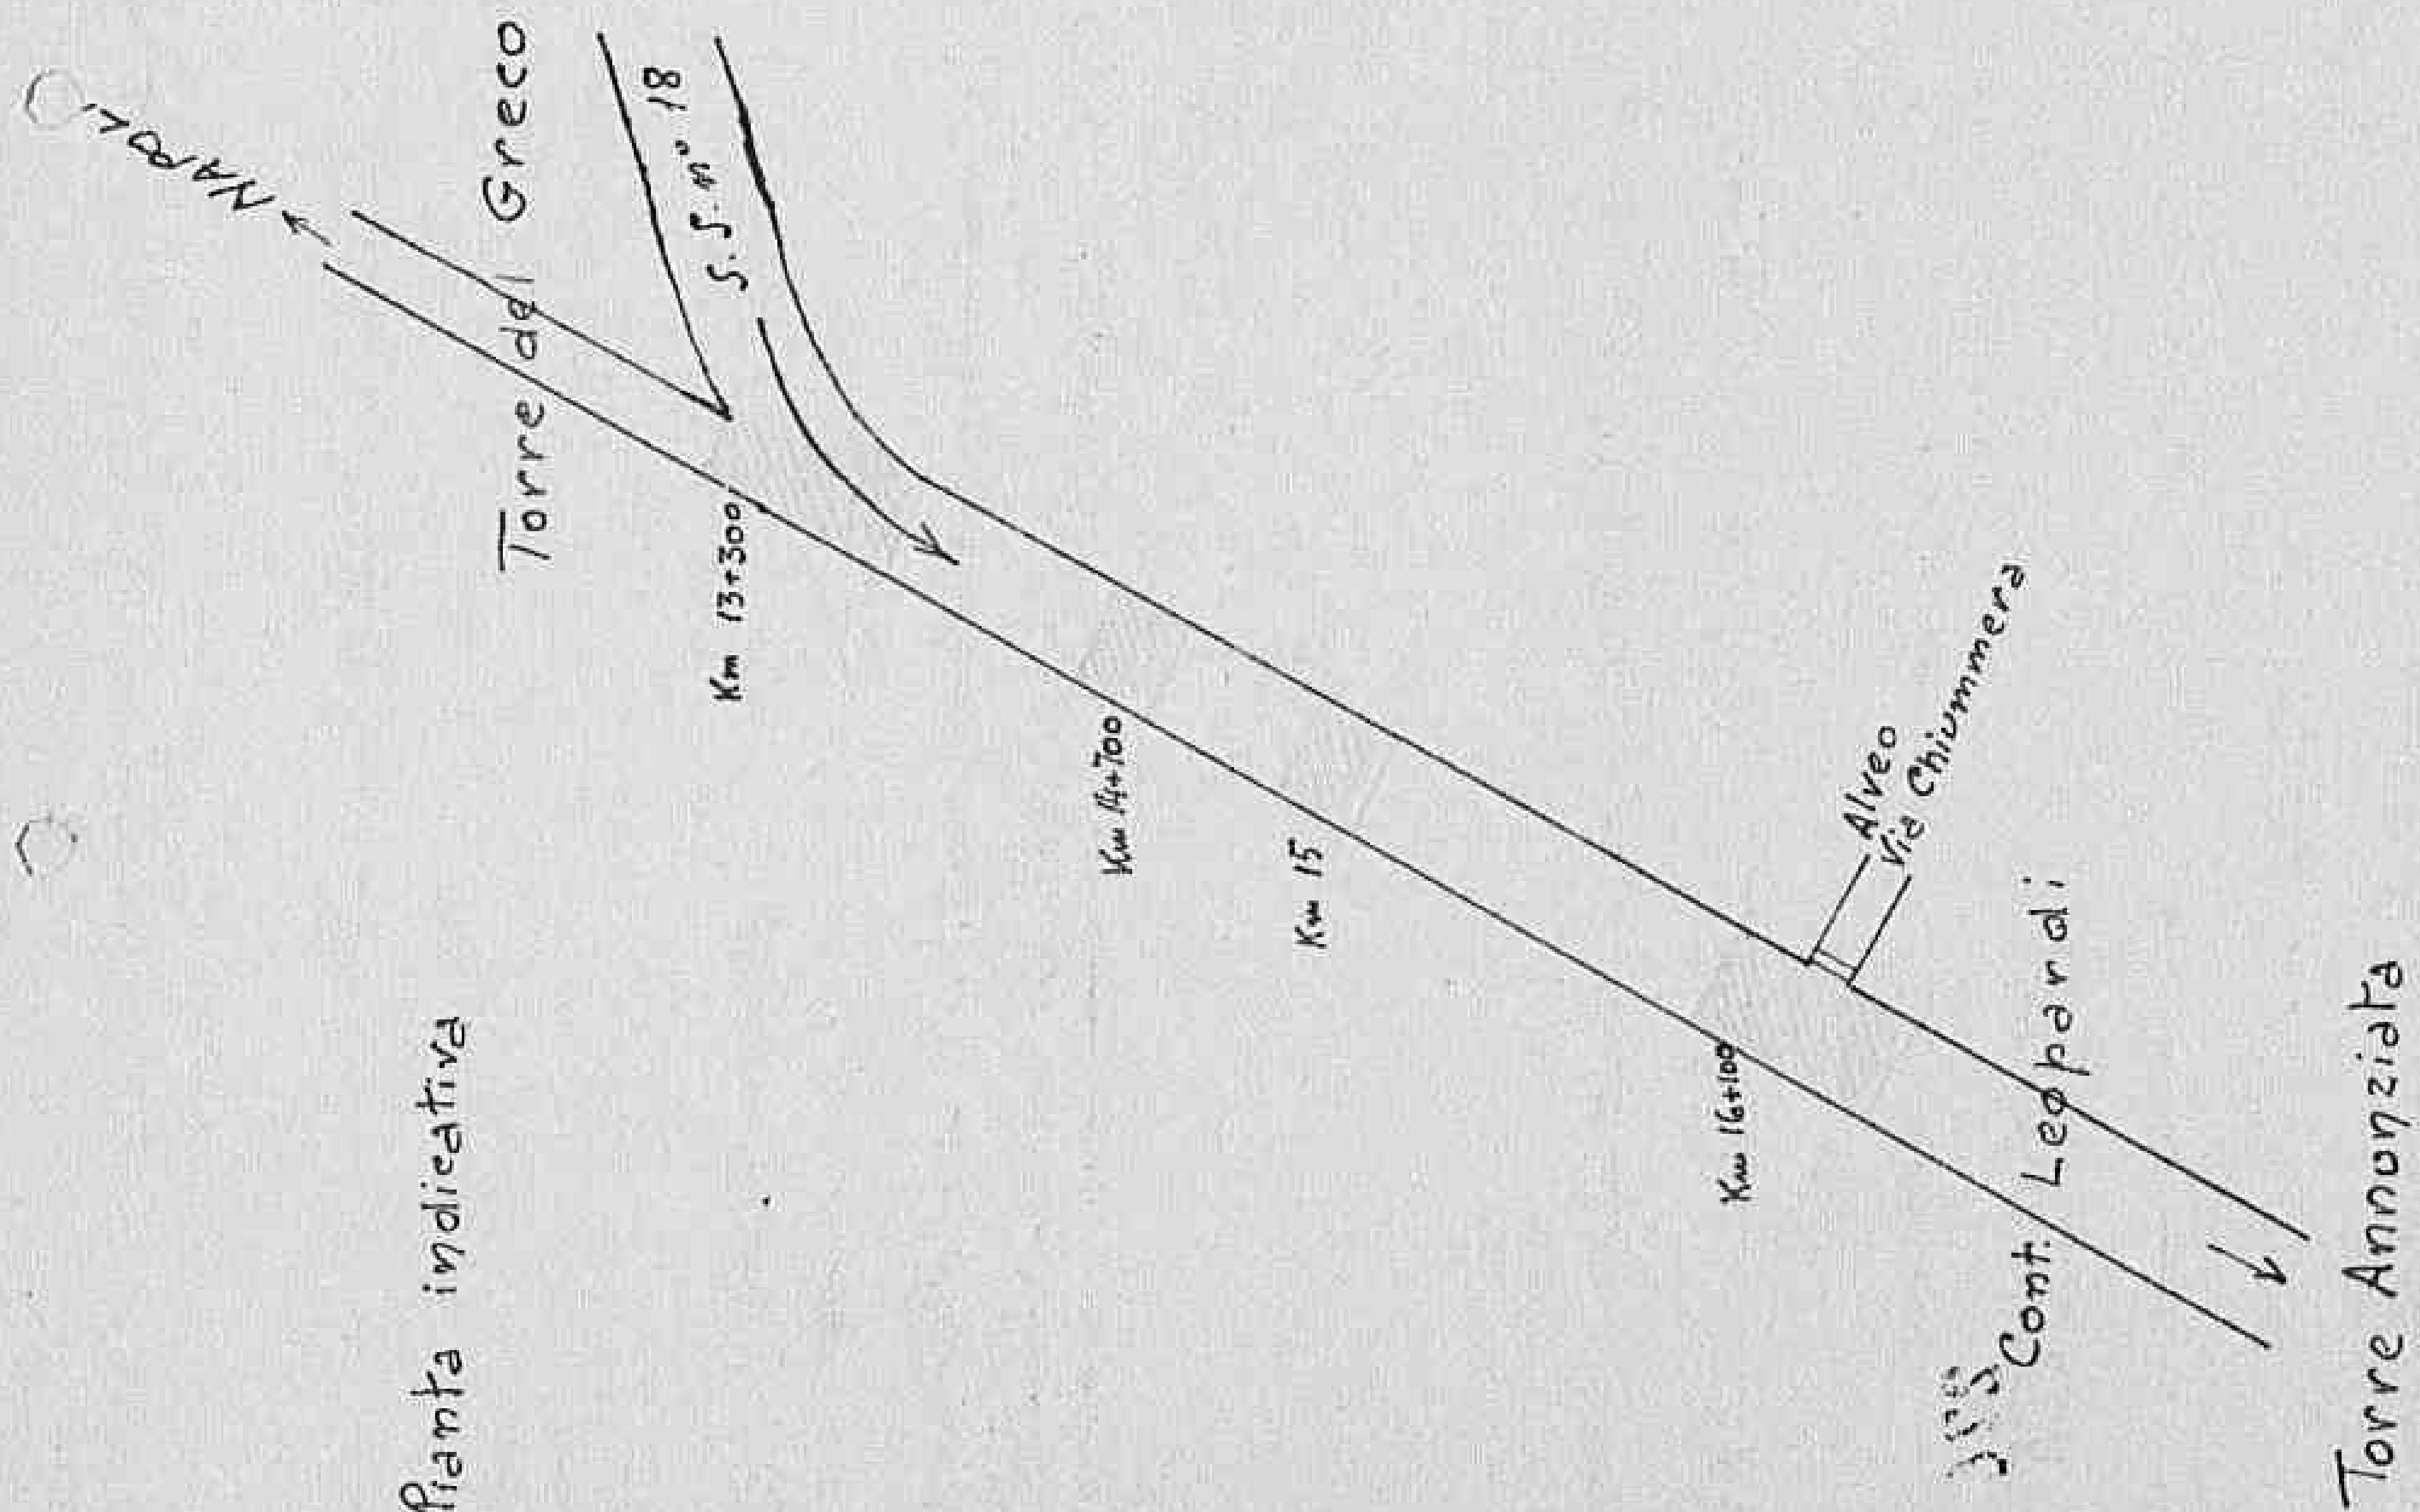

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
Estimate of Works to be carried out

---000---

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATE OF CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location: Maintenance off road n.97 between Gravina and junction of road n.98 near Canosa for months October-November and December 1944.

(b) By contract or direct labour: Direct labour

(c) Amount of approximate estimate: £. 3,000,000,=

(d) Urgency of project:

(e) Probable time for completion: 3 months

(f) Special remarks:

2. CERTIFICATES:

(a) Certified ^{that} the attached approximate estimate amounting to Lire 3,000,000,= has been prepared by me; it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.

Italian (Signature: *at name*)
Engineer (Official designation: *Ingegnere capo della Pubblica*)
(Date, and place: 17 OCT 1944 BARI 274)

(b) I agree with preceding certificate and recommend approval

..... *Mr. Knight-Rogers* DATE 23 October 1944
Regional engineer, or his representative.

3. APPROVED (Highway Fund) *Thompson* 31/10/44
(Other Funds)
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. APPROVED
Director, P.W. & U. Sub-Commission A.C.C. Lt. Colonel R. E.
Deputy }
Acting } Director
P. W. & U. Sub Commission
(Allied Commission)

K/L

ALLIED CONTROL COMMISSION **PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION** Estimate of Work to be carried out

Form AAC/1
 (Estimate
 Rev - 7 June 44)

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H.Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE **(APPROVALS)**

1. - a) Building, Bridge, Road, ~~Power Sta Pumping sta etc.~~, and location **Maintenance of road n.7 between Matera and Brindisi for months October-november and december 1944**
 (b) By contract or direct labour **direct labour**
 (c) Amount of approximate estimate **£. 1.750.000,=**
 (d) Urgency of project
 (e) Probable time for completion **3 months**
 (f) Special remarks

2. - CERTIFICATES:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire **1.750.000=** has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer	Signature	<i>M. M. M.</i>
	Official designation	<i>Ingegnere capo della Viabilità.</i>
	Date, and place	17 October 1944 - Bari

273

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

M. K. M.

Regional Engineer or his representative.

3. - APPROVED. (Highway Fund) Date **23 October 1944**

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

1. - a) Building, Bridge, Road, Power Sta Pumping sta etc., and location Maintenance of road n.7 between Matera and Erindisi for months October-November and December 1944
 (b) By contract or direct labour direct labour
 (c) Amount of approximate estimate £. 1.750.000,00
 (d) Urgency of project
 (e) Probable time for completion 3 months
 (f) Special remarks

2. - CERTIFICATES:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.760.000= has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer	Signature <u>Adman</u>	273
	Official designation <u>Ingegnere per pubblica Istruzione</u>	
	Date, and place <u>17 October 1944 - Bari</u>	

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

h. K. W. Dwyer Date 23 October 1944
Regional Engineer or his representative.

3. - APPROVED. (Highway Fund)

(Other funds) GER A. Thompson Nov 31/10/44
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

4. - APPROVED.

Lt. Colonel R. E.	Director, P. W. & U. Sub-Commission A. C. C.
Duty	
Director	
P. W. & U. Sub-Commission	
(Chief Commission)	

E/L

File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

These forms to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be retained in the Regional Engineer's file, and one to be sent to the Minister of Public Works. This approval must be given by the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This approval must be given by the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This approval must be given by the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES – CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo
---------	-------

Region 7a

(APPROVALS)

Province _____ 800-0734

1.1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Stn. Pumping, Stn. etc. and Location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc. e localit 

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

continued

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

739-4465, 00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

91-1204

(f) Special remarks *For a full discussion in military affairs & state*
Note special

At the time of the

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire *Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire*

292,000,000

272

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature _____
Firm _____

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation **Reggimento 110° Villoso** **Armeo Prov. 10 di Napoli**
Designazione: Ufficiale

Approved to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
 Per la n. ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
 Perizia Costo
 (APPROVALS)
 Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, S.W., Pumping, etc., and location
 Fabbrica ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc. e località

(b) By contract or direct labour
 Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
 Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
 Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks *Fra di dette concorrenti la migliore offerta è stata*
 Note speciali

2. Certificates:
 Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 335,000,00 272
 Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
 Firma

Italian Engineer
 Ingegnere Italiano

Official designation
 Designazione Ufficiale

Date, and place
 Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)

Regional Engineer, or his representative.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.


3. Approved. Lt. Colonel R. E.

Deputy Acting Director

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Col. Henry W. & P. Sub-Commission (Attached Commissioners)

36

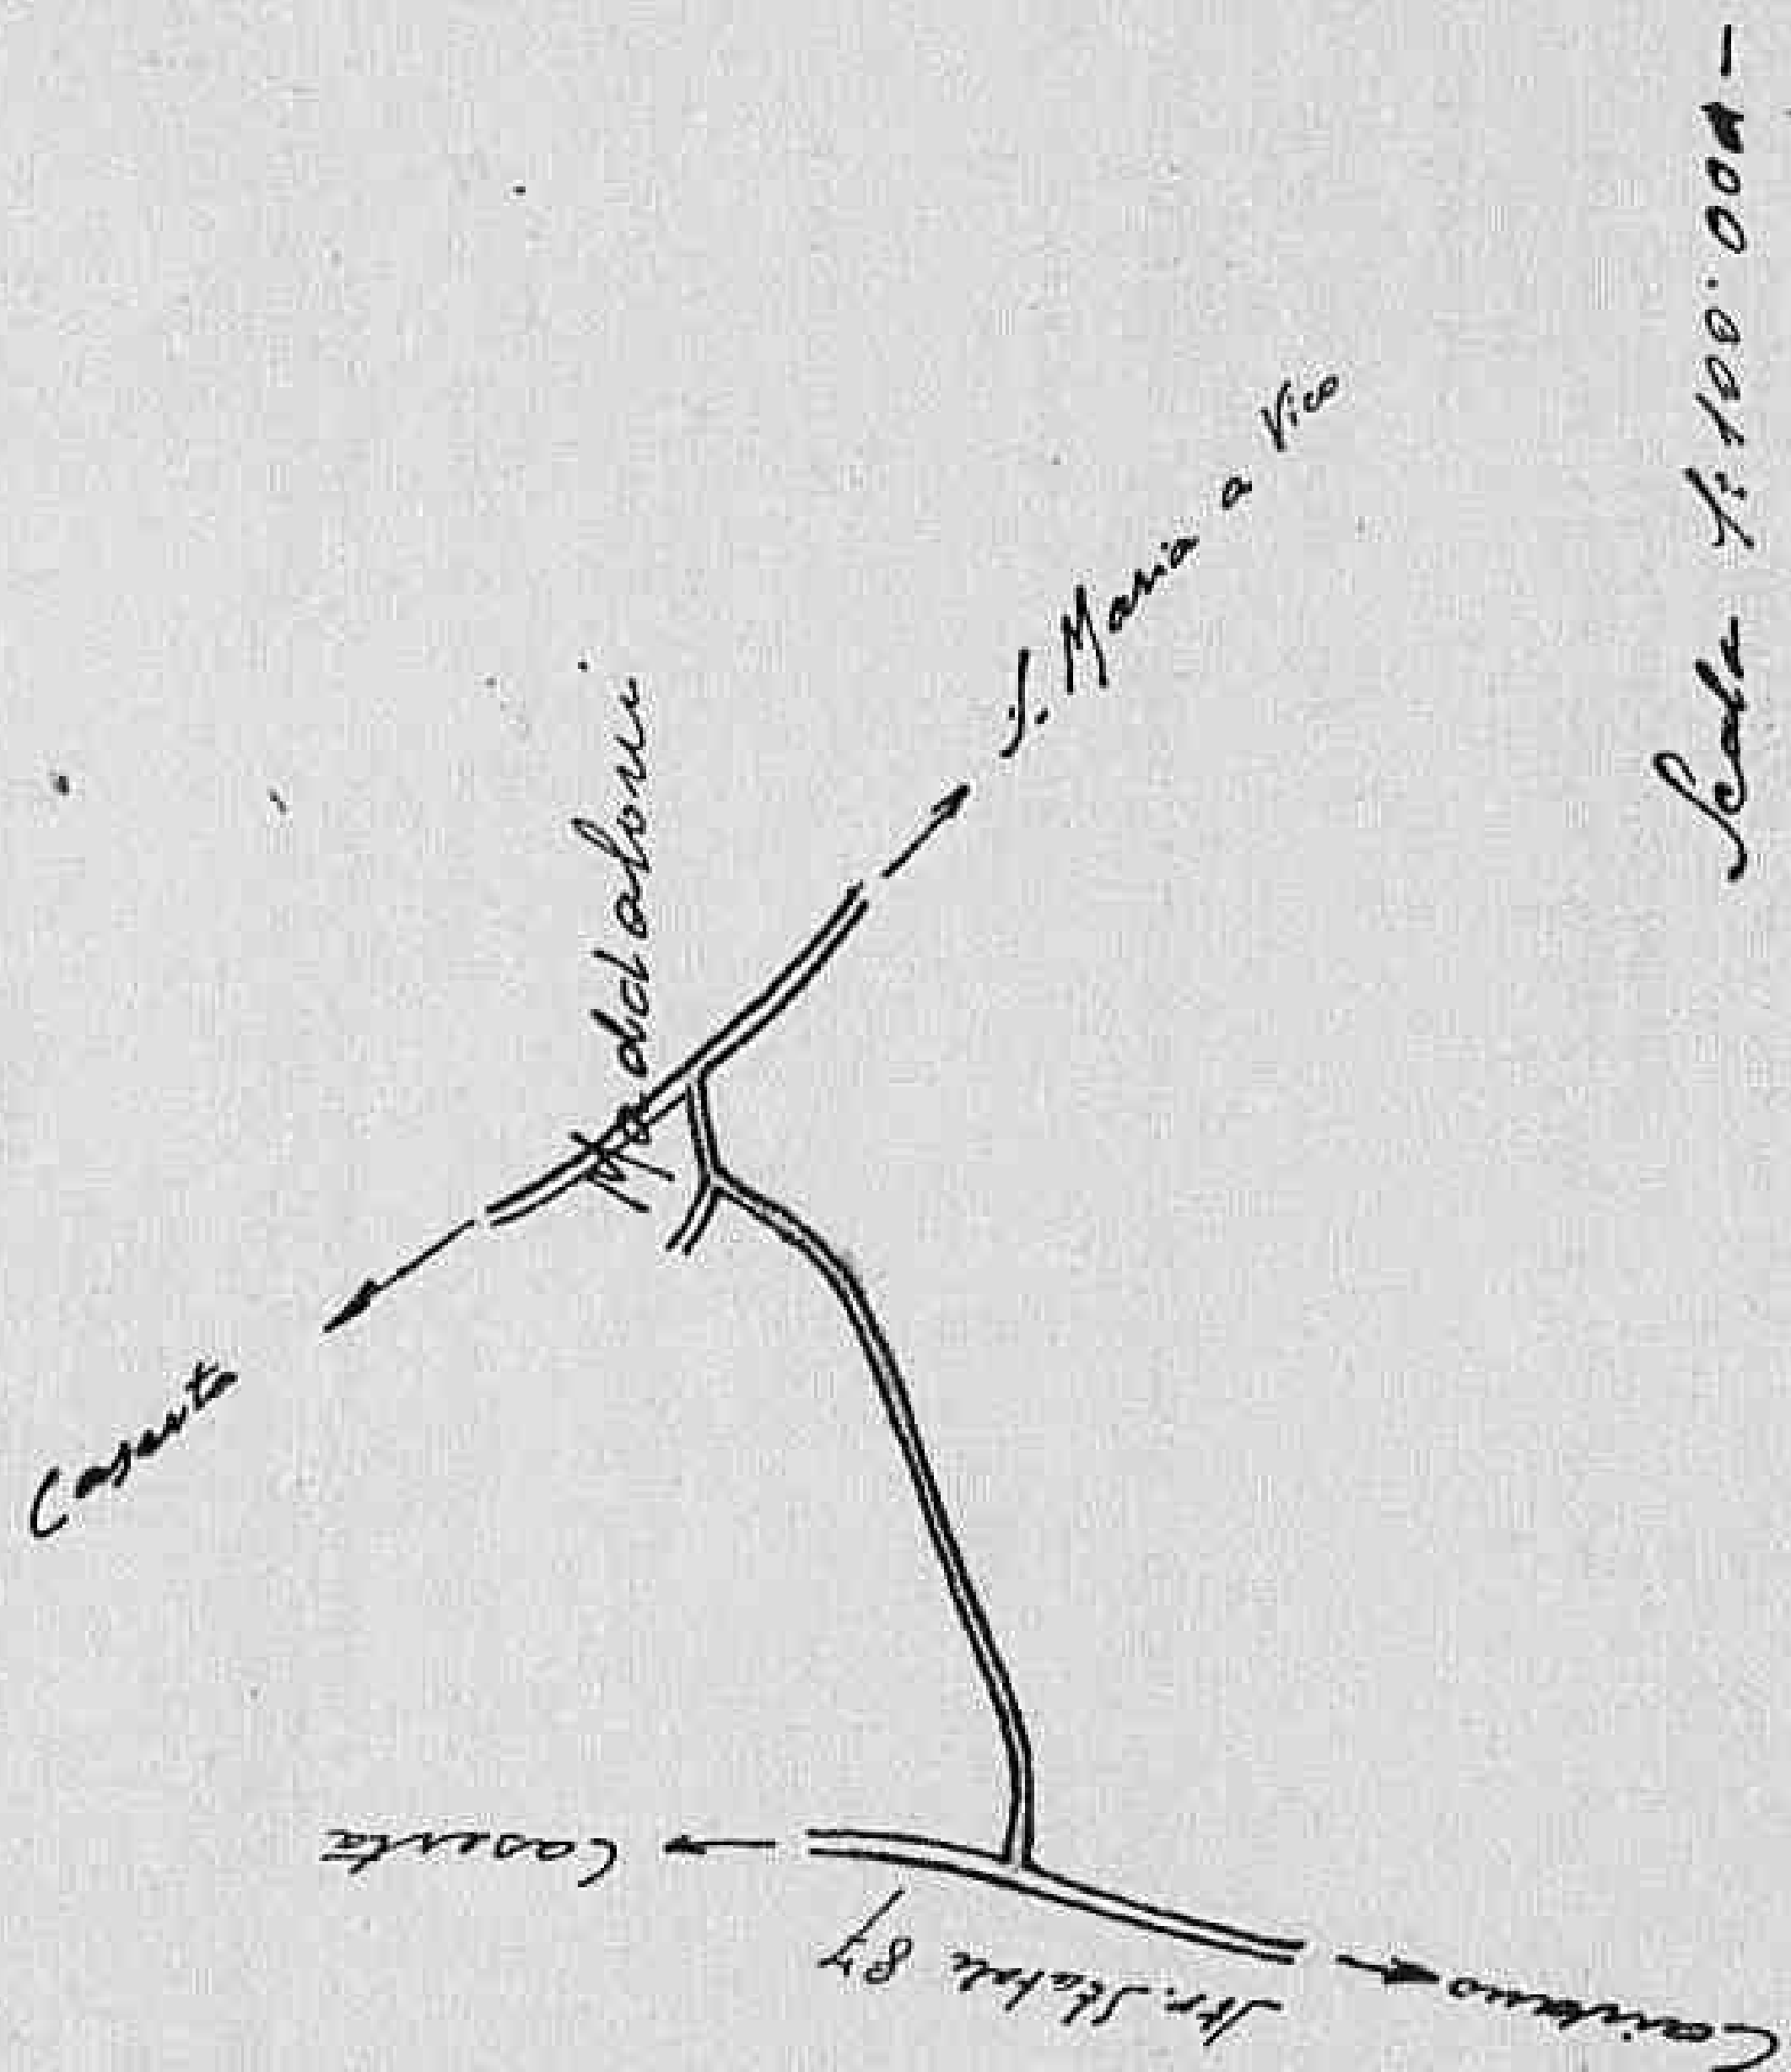

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

PER STRADE MILITARI

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region	III*
(APPROVALS)		Province	Napoli
Approvazioni			

1. (a) Building, Bridge/Road, Power/Gen. Pumping/Str./Etc. and location Gestione autocarri alleati
 Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località residenti a Caserta

(b) By contract or direct labour In economia
 Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.300.000,00
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente perchè la gestione è già iniziata
 Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Un trimestre 1944
 Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks = =
 Note speciali

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.300.000,00
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 1.300.000,00
 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me; essa comprende tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
 Ingegnere Italiano

Signature
 Firma

Official designation
 Designazione Ufficiale

R. MARCINI

Ingegnere Capo Compartimento A.A.S.S. Caserta

271

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Region III*

Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sta, Pumping Sta, etc. And location Gestione autocarri alleati
Fabbriato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
residenti a Caserta

(b) By contract or direct labour In economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.300.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente perchè la gestione è già iniziata
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Un trimestre 1944
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks = =
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.300.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa comprende tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature

R. MARCINI

Italian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione Ufficiale

Ingegnere Capo Compartimento A.A.S.S. Caserta

Date, and place
Data e luogo

23 agosto 1944 n. 4282

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds)

Regional Engineer, or his representative.

3. Approved. Lt. Colonel R. E.

Deputy
Acting

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

W. & U. Sub-Commission

(Attended Commission)

271

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Southern Region Napoli Province Napoli

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Lavori di ricostruzione del Ponticello n. 463 alla pro-
gettata ponte, strada, centrale elettrica, idro-elettrica S.S. 10.0 "Vie Casilina"

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 570.000.00 (cinquecentosettantamila)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente ed indifferibile
Urgenze del progetto

(e) Probable time for completion mesi quattro
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I lavori sono stati richiesti dal Cap. PARRY MARSHALL RE-
Note speciali

HQ 82 - C R E REF LETTER AUG 1944 1/10

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 570.000.00 270
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Raffaello Mangini

Italian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione Ufficiale

Ingegnere Capo Genio Civile Viabilità Statale

Date, and place
Data e luogo

Caserta

30.11.1944

5430

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)

Other funds

Regional Engineer, or his representative.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.


3. Approved.

Lt. Colonel R. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Deputy Director

Reg. Eng. Reg. M. & U. Sub Commission
(Commission)

112

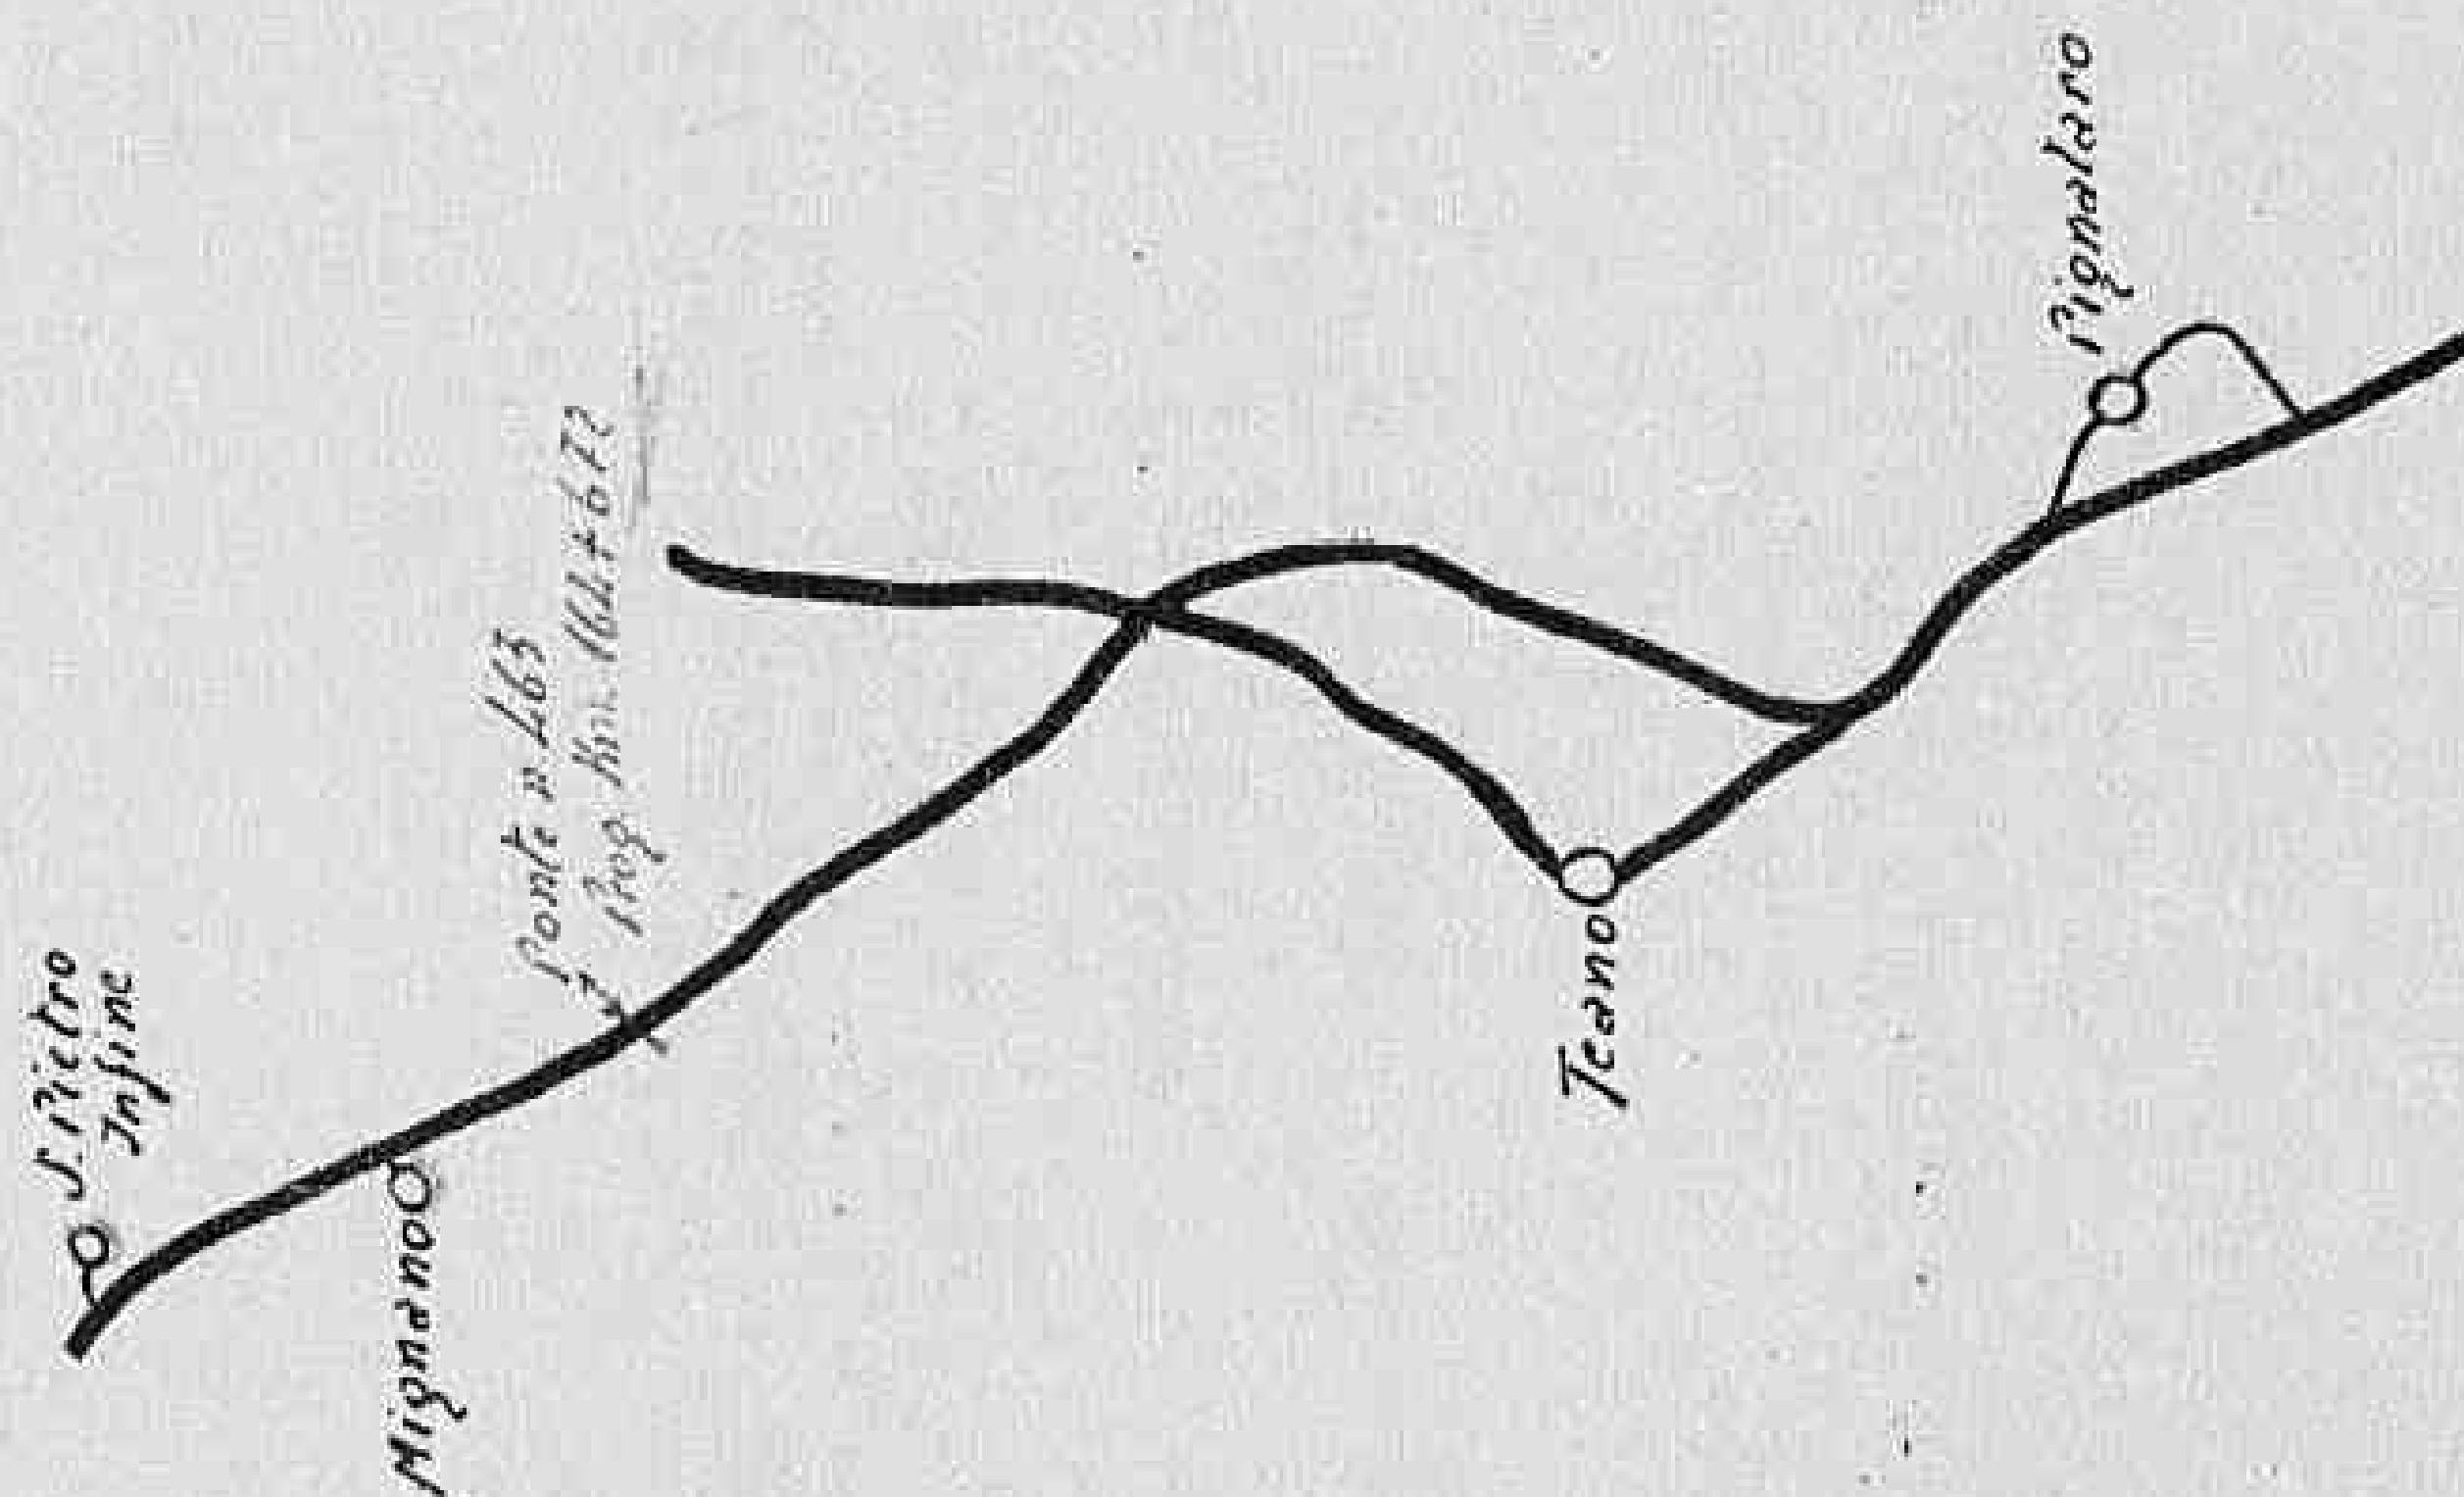

FORM 400-1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, Italia all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo
(APPROVALS)	
Approvazioni	

Military Highways
Region Southern.

Province SALERNO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sta., Quarries, etc. and localities S.S. 18 Tratto Camerelle-Vietri
Febricatio ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Riparazioni-I° supplementivo.-
(Km. 42 e Km 50)

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £. 1.400.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali Trattasi di lavori già eseguiti dall'Impresa D'Annora e

269

perizia a seguito di disposizioni del Cap. Weber.

2 Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.400.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. R. Mancini

irma

Italian Engineer

Official designation Capo Compartimento A.A.S.S. CASERTA

tuita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Military Highways
Region Southern
Province SALERNO

1. (a) Building, Bidas, Road, Power Sta. Pumping, Sta. etc. and location S.O. 18 Tratto Camerelle-Vietri
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Riperezioni-I° suppletivo.-
(Nu. 42 e Nu. 50)

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £: 1.400.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto Urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali Trattasi di lavori già eseguiti dall'Impresa D'Amore

269
a seguito di disposizioni del Cap. Reuber.-

2 Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.400.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature Ing. R. Mancini
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano Capo Compartimento A.A.S.S. CASERTA

Date, and place
Data e luogo Caserta, 11 30 agosto 1944. - n° 105 RA


(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

1. Approved (Highway Fund)
(Other funds) *Champion* Date *25/10/44*
Regional Engineer, or his representative.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.
Lt. Colonel R. E.
Deputy Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
Acting

W. & U. Sub Commission
(Acting Commission)

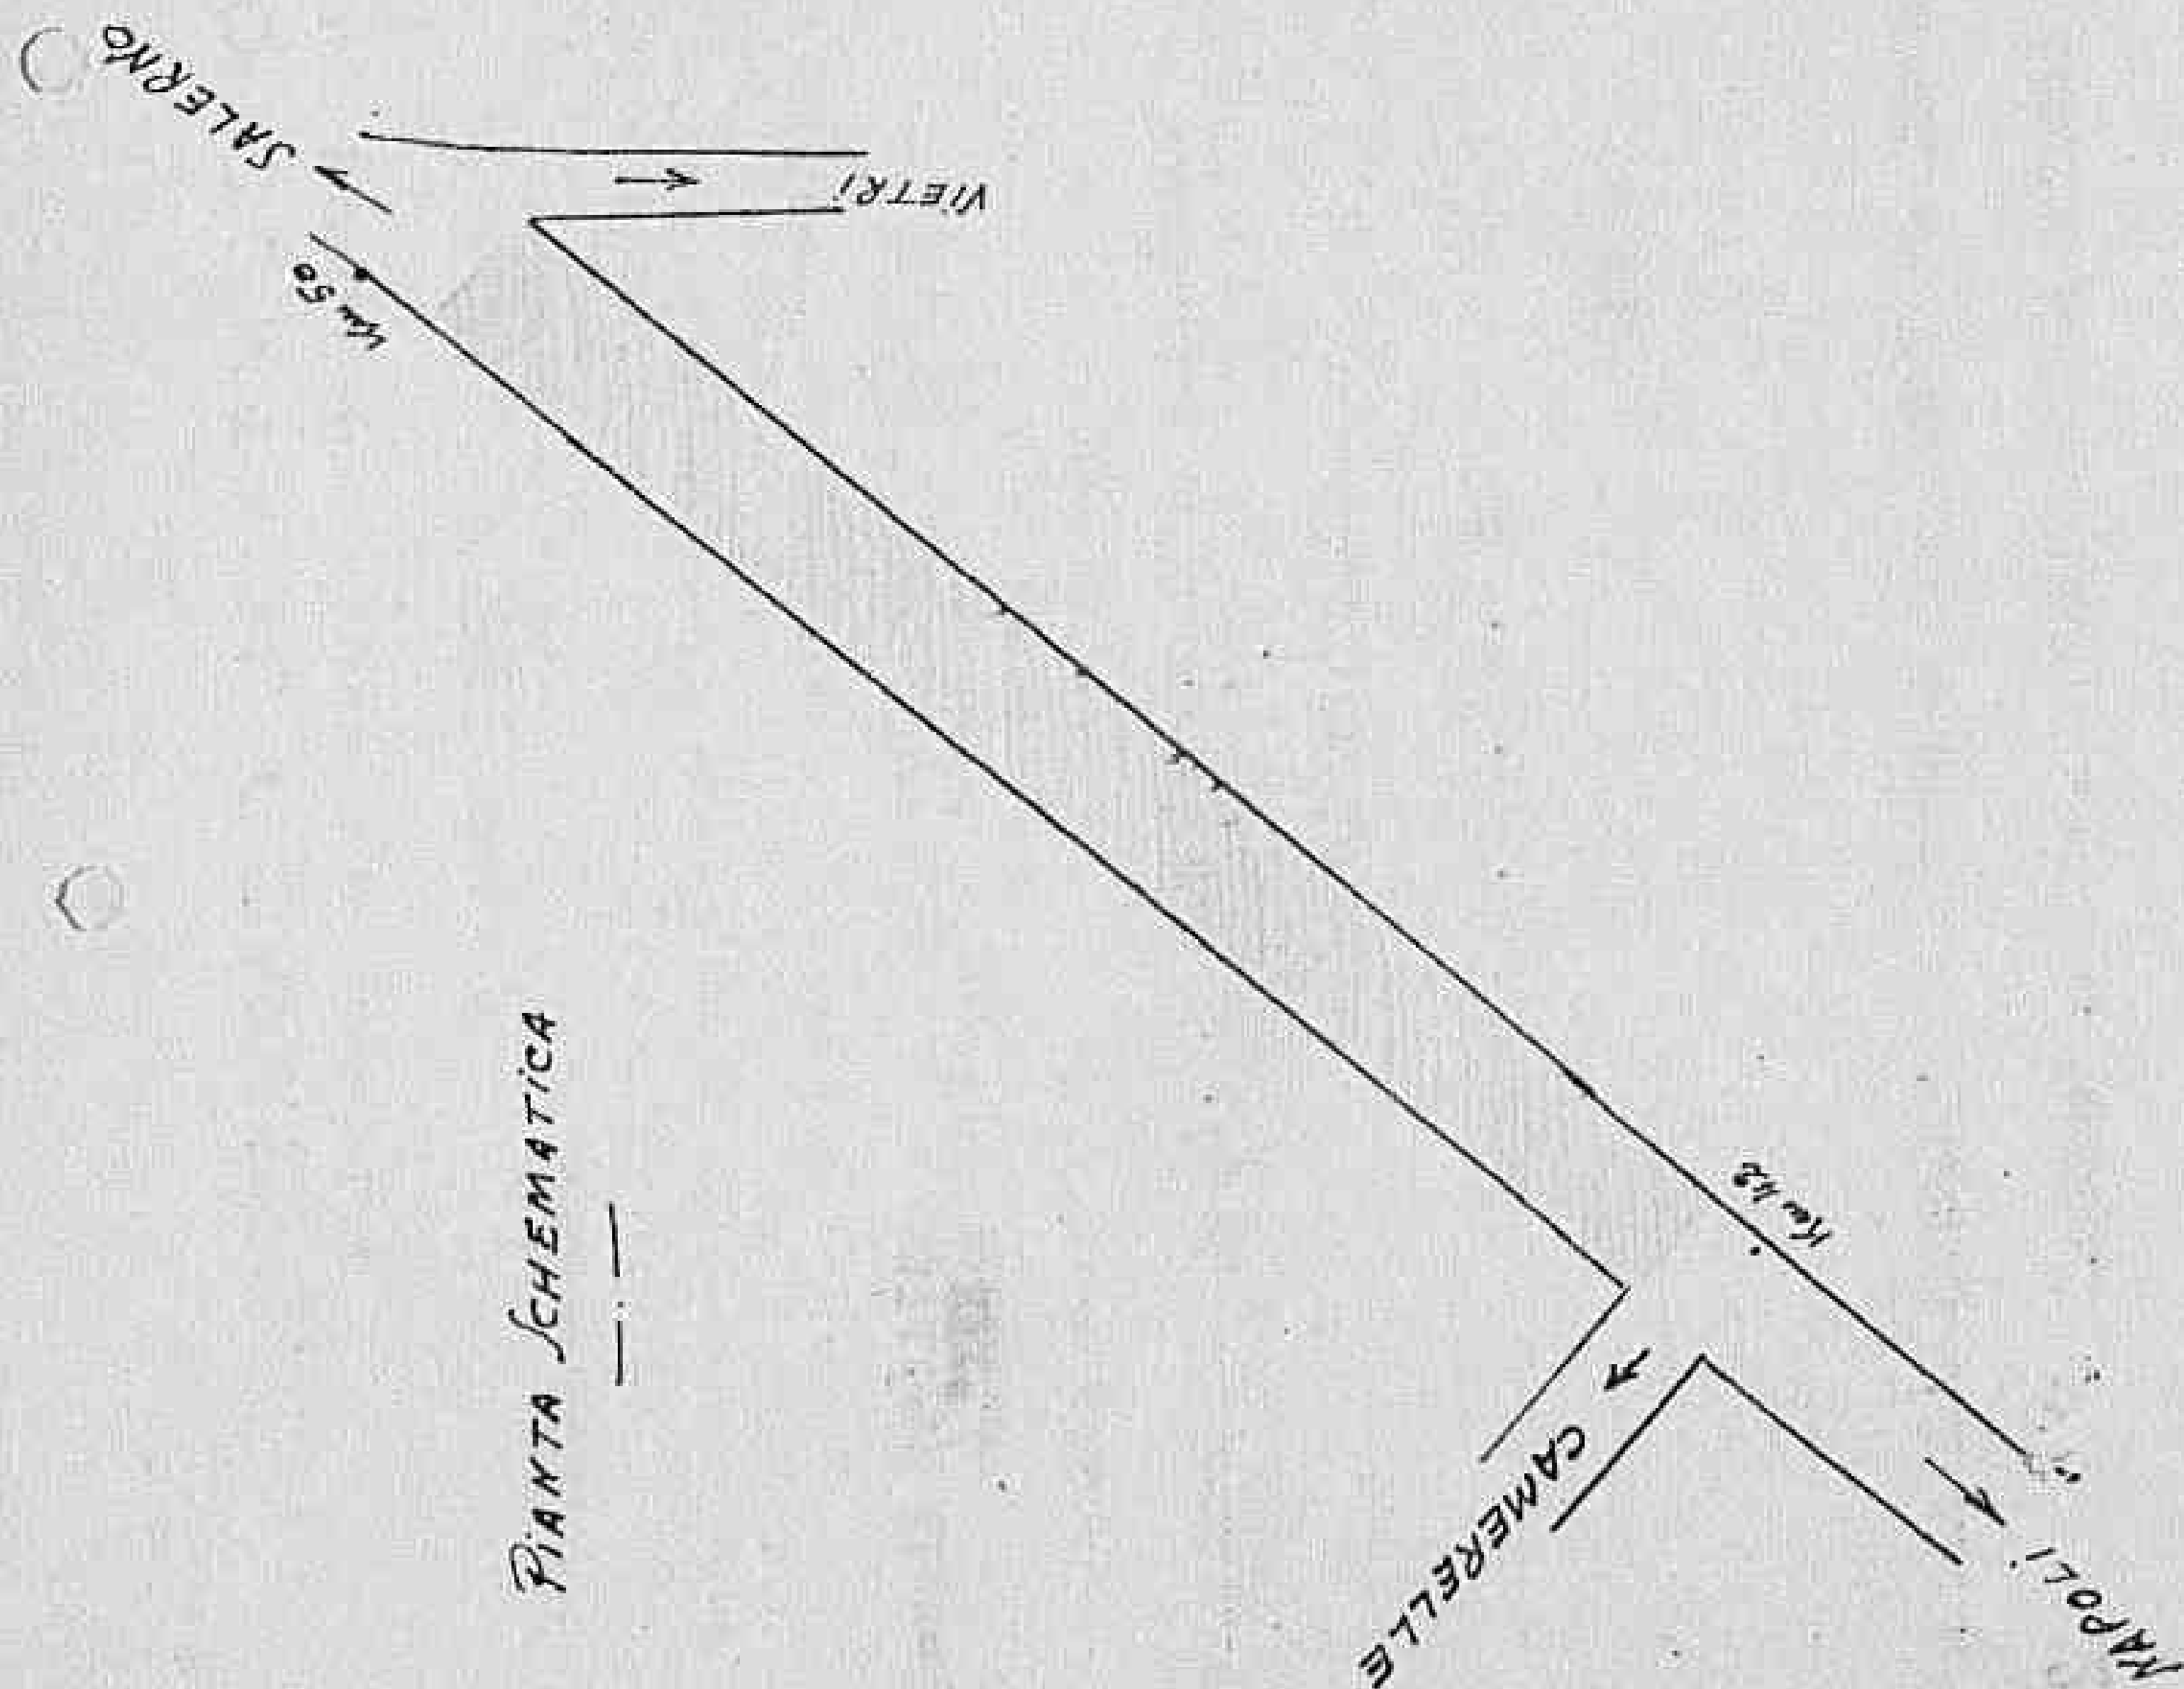

FORM ACO. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo
(APPROVALS)	
Approvazioni	

Region Military HighwaysProvince 1 alone

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Stn., Pumping Stn. etc. and location Stazione 13 - tratto Stna. per
fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
roviale P.S. Francese - spondo
materiali vulcanici

- (b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

- (c) Amount of approximate estimate 1.300.000,00
Ammontare della perizia

- (d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

- (e) Probable time for completion un anno
Data probabile per l'esecuzione

- (f) Special remarks non occorrono materiali
Note speciali

2 Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.300.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. A. Mancini
Firma

Italian Engineer CAPO COMPLESSIVO A.A.C.S. - ROMA
Official designation

268

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, tutta all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Military HighwayProvince il piano

1. (a) Building-Bridge, Road, Power, Sln, Pumping, Sln, etc. and location Stato 10 - tratto Sten. Per
 Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località rovicaria P.O. Francisco - secondo

(b) By contract or direct labour in economia
 Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 1.500.000,00
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
 Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion in 1944
 Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks NON OCCORRONO MATERIALI
 Note speciali

268

2 Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.500.000,00
 Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. R. ManciniItalian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione Ufficiale

CAPO QUARTIERAMENTO 4.A.S.P. - CIVITRA

Date, and place 8 agosto, 11 12 settembre 1944

118

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

Regional Engineer, or his representative.

gch

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.


Deputy

, ting


Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

V. & U. Sub Commission

(Atted Commission)

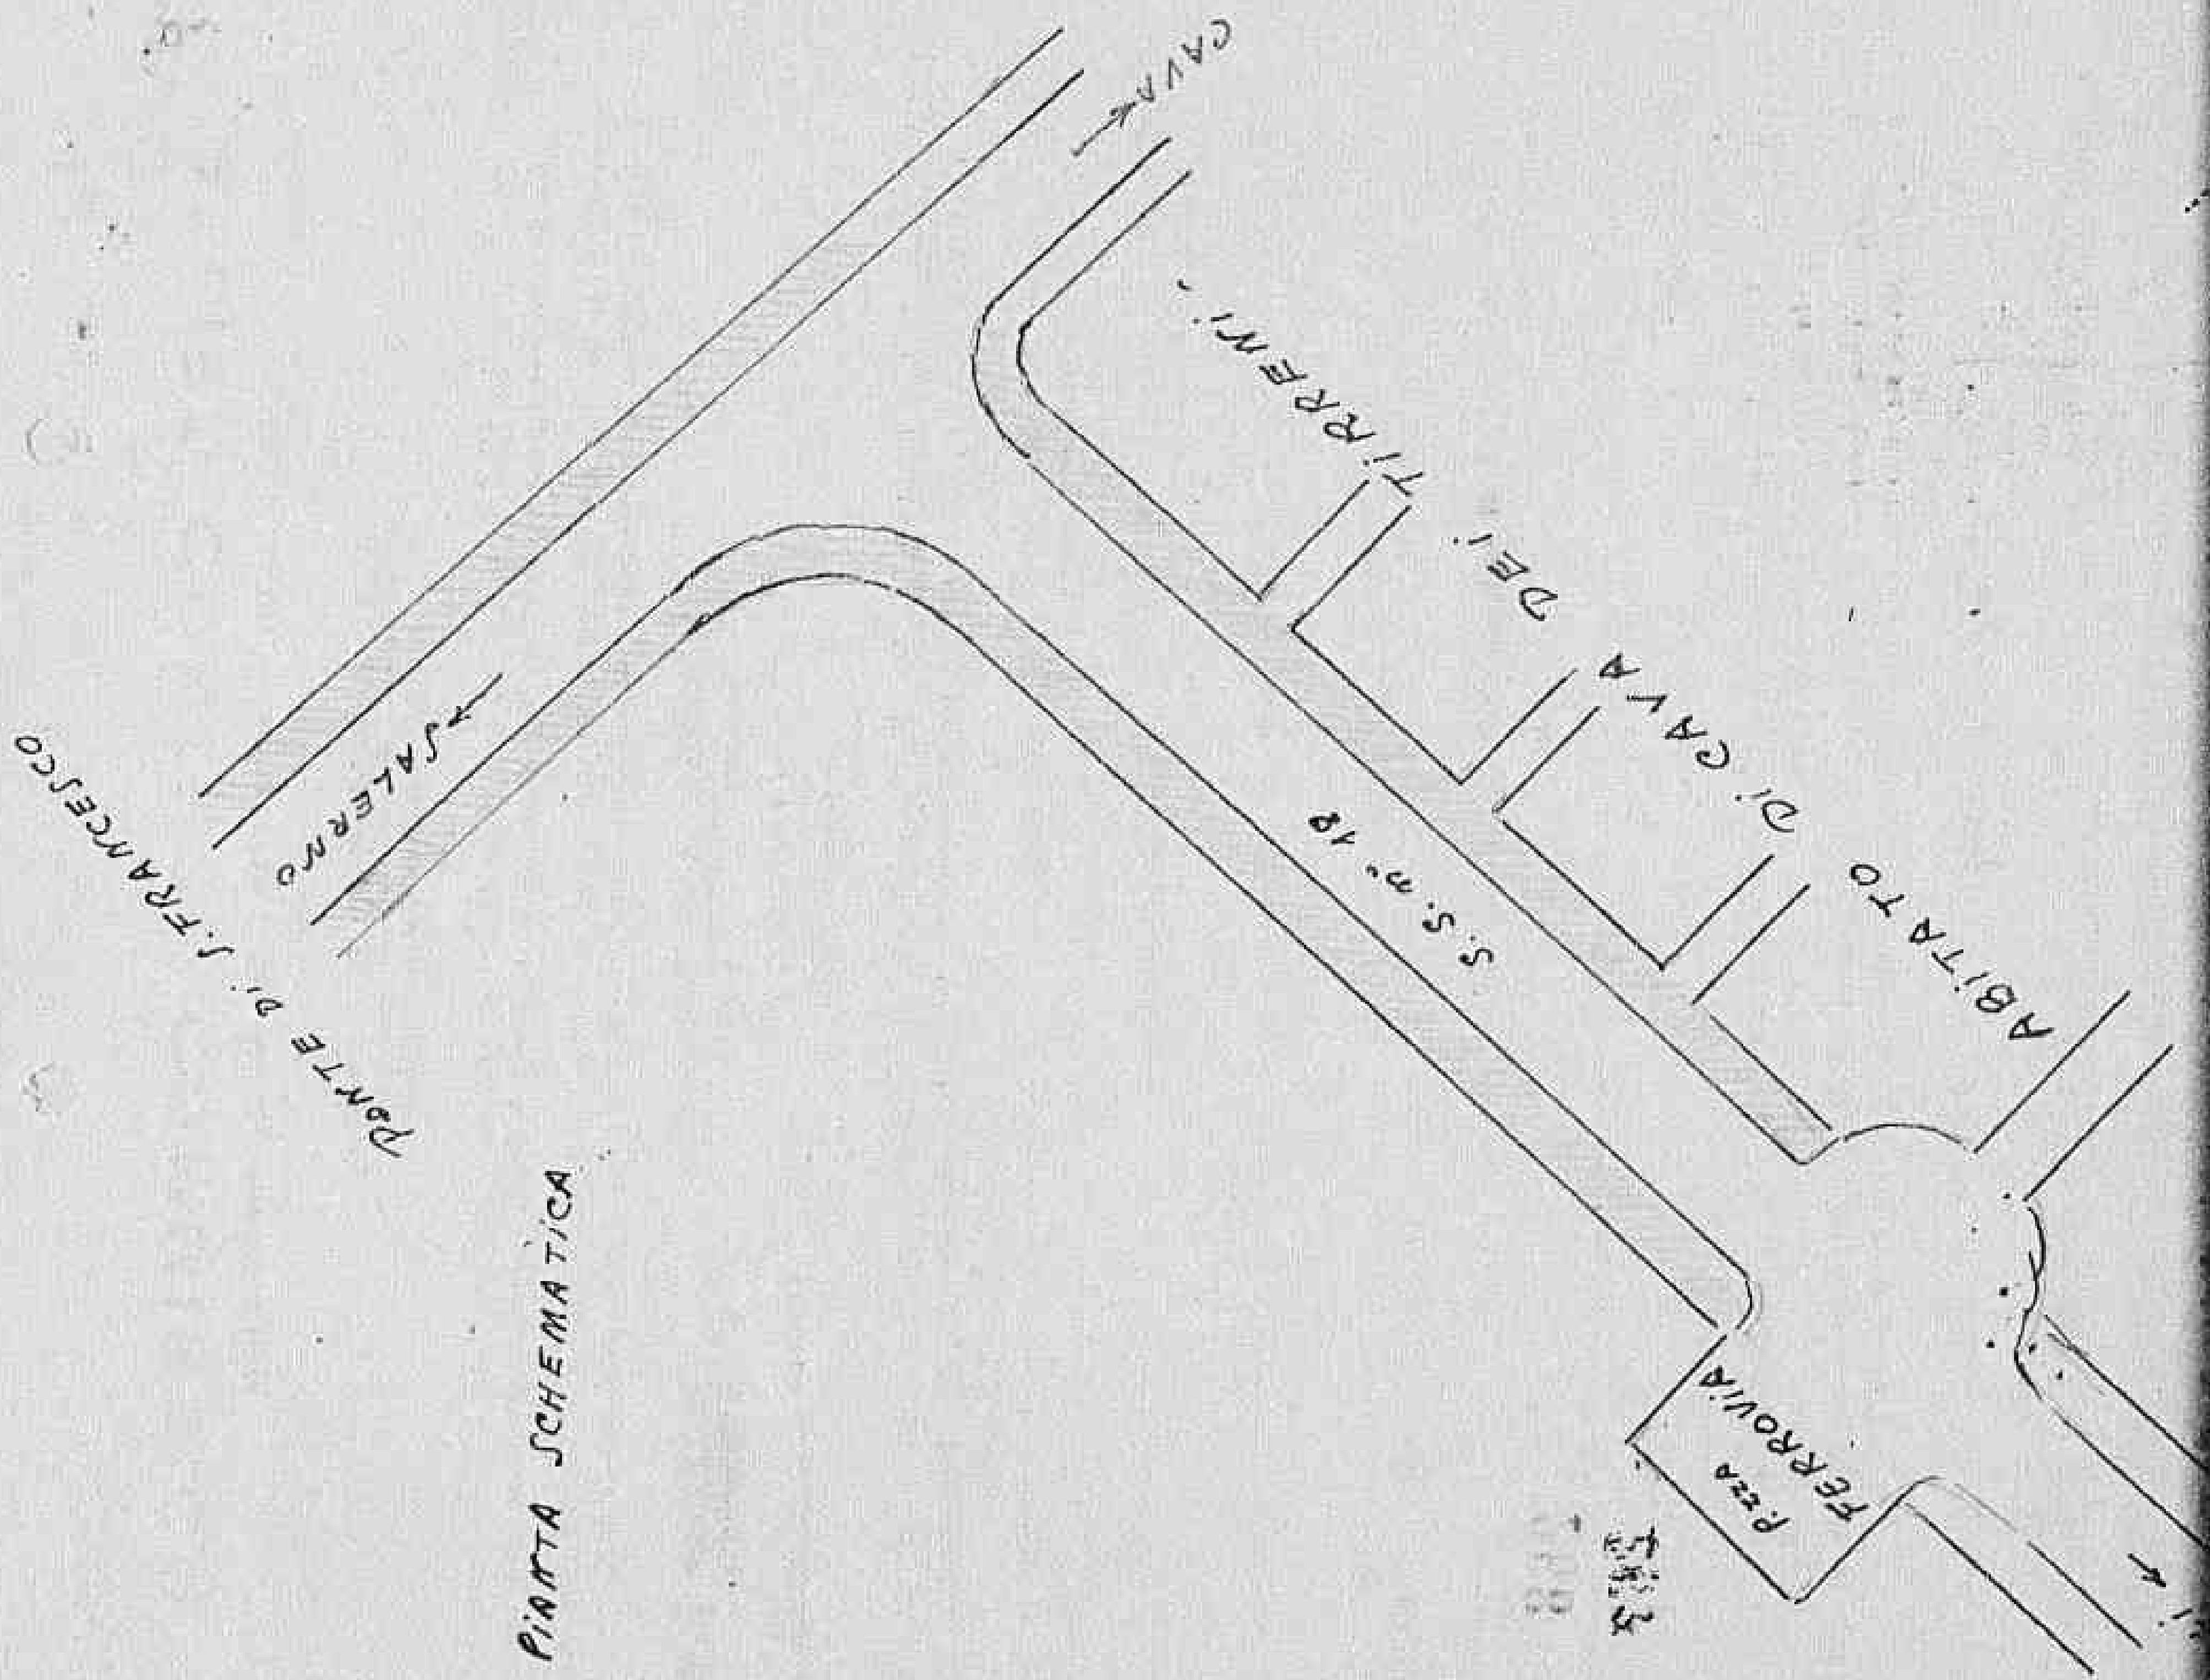

PIANTA SCHEMATICA

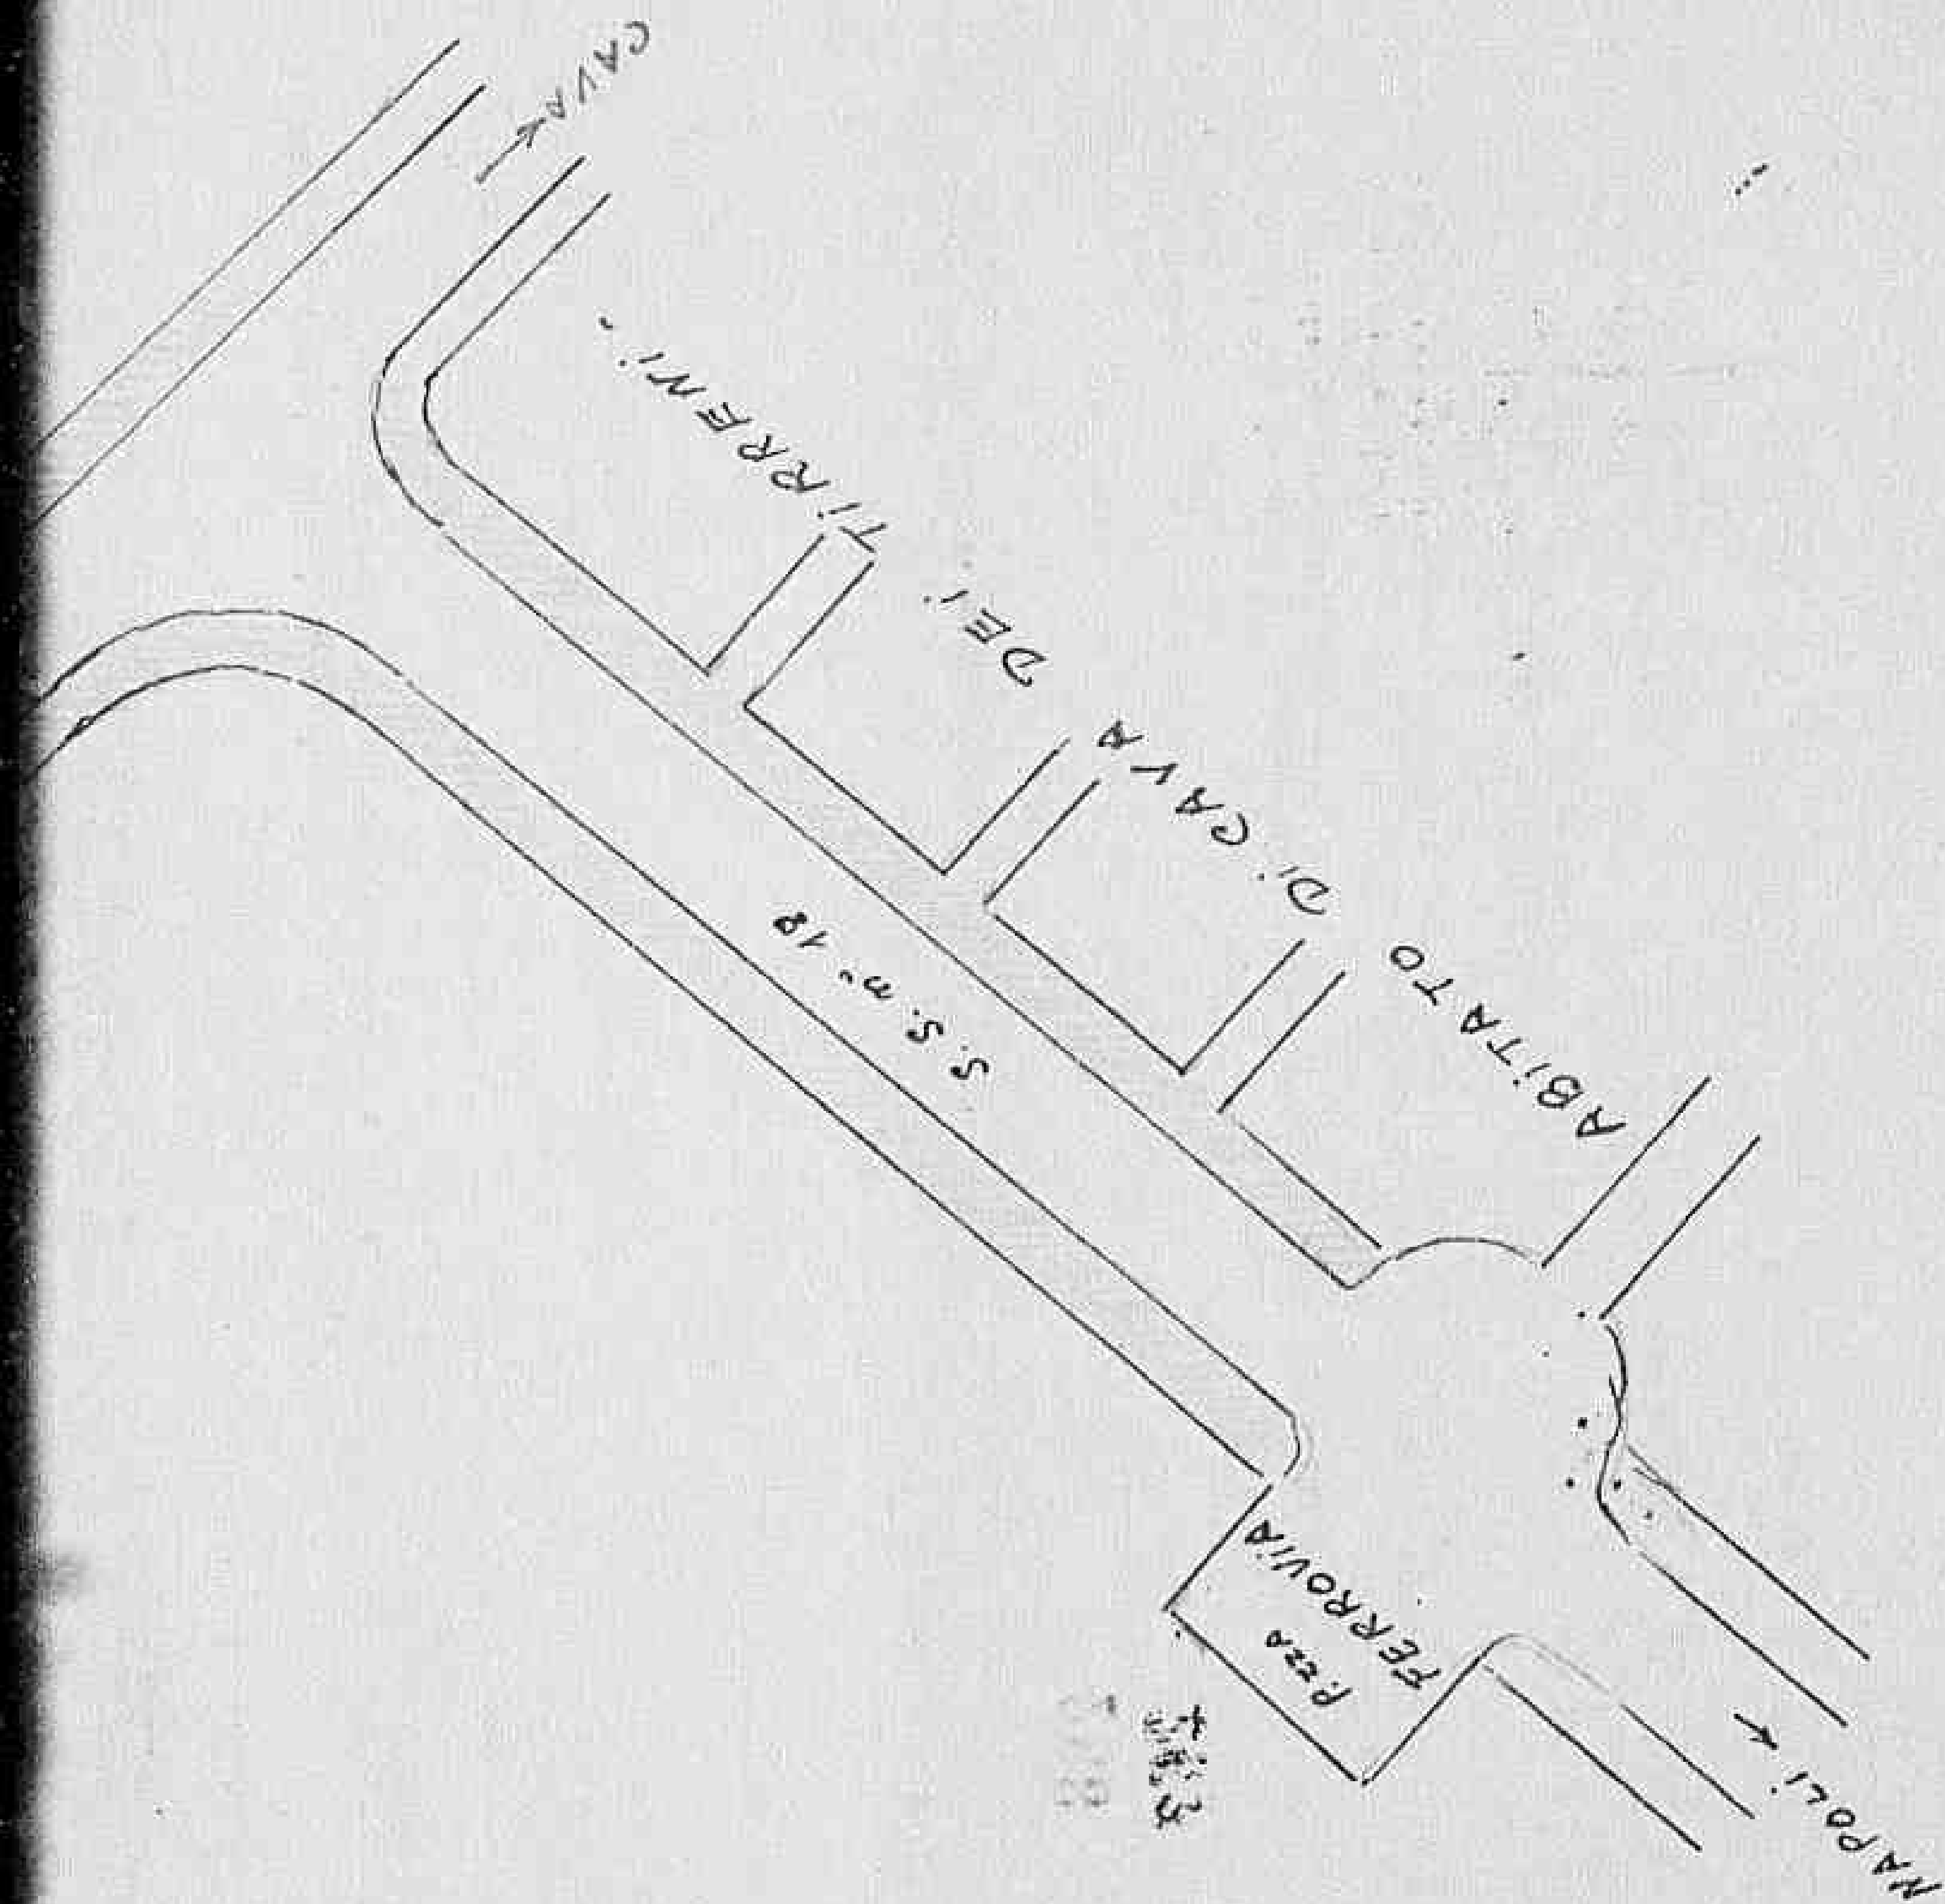

FORM 100, 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va compilato in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Southern

(APPROVALS)

Province Benevento

Lavori di ricostruzione del ponte nei pressi di Arpaia alla progr/va Km/oa

1. (a) ~~Building Bridge, Road Power Station Pumping Station and Jetties~~ ~~234+400 della Strada Stg~~ ~~chiuso ponte, strada e opere di difesa della foce e della~~ ~~tale no 7 "Via Appia"~~

(b) By contract or direct labour per contratto

Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate

L. 2.850.000

(duemilioni ottocentocinquanta mila)

(d) Urgency of project:

Urgente ed indifferibile

(e) Probable time for completion

mesi cinque

(f) Special remarks

I lavori si rendono necessari per assicurare la regolarità e la continuità del transito.

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.850.000. =

Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared and it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

è stata preparata e risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

R. Mancini

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

Ingegnere Capo Genio Civile Viabilità Statale

267

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Southern

(APPROVALS)

Province Benevento

Lavori di ricostruzione del ponte nei pressi di Arpaia alla progr/va Km/08

1. (a) Buildings, Bridge, Road, Power Sub-Pumping Station and Jachien 234+400 della Strada Sta
 fabbricato ponte, strada centrale, centrale idraulica e la linea tele n° 7 "Via Appia"

- (b) By contract or direct labour per contratto
 Per contratto o lavoro in economia

- (c) Amount of approximate estimate I. 2.850.000 (duemilioni ottocentocinquanta
 Ammontare della perizia mila)

- (d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile
 Urgenza del progetto

- (e) Probable time for completion mesi cinque
 Data probabile per l' esecuzione

- (f) Special remarks I lavori si rendono necessari per assicurare la regola-
 Note speciali rità e la continuità del transito.

2. Certificates:
Certificati

267

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.850.000.
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

R. Mancini

Italian Engineer Official designation Ingegnere Capo Genio Civile Viabilità Statale
 Ingegnere Italiano Ufficiale Designazione

Date, and place Caserta 11 OCT 1944 5650
 Data e luogo

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)
 (Other funds)

Chief, Public Works Div. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.
 Lt Colonel R. E.

3. Approved.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission Director C.

VB/ Reg. Eng. Reg. III.

U. S. S. Commission
 (Commission)



588
588

FORM. 100. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

RB

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region Southern

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Napoli

1. (a) Building Bridge, Road, Power Sta, Pumping Sta, etc. and location Lavori straordinari di ri-
fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e localita parazione del tratto della stra-
da statale n. 85 "Venafrana" compreso tra il quadrivio di Campobasso.
(b) By Contracting firm Perizia di Campobasso.

Per contratto o lavoro in economia

In economia

- (c) Amount of approximate estimate L. 1.980.000,00 (un milione novecentottantamila
Ammontare della perizia

- (d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

- (e) Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

- (f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates : Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.980.000,00
Certifico che l'ammontare a lire
has been prepared by me and covers the full requirements of the project, and is reasonable amount.
è stata preparata da me e copre a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. 266

R. Mancini

Italian Engineer

Official designation

Ingegnere Capo Genio Civile Viabilità Statale

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. restituita all' Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Region Southern

Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sta., Pumping Sta. etc. and location Lavori straordinari di ri-
parazione del tratto della stra-
da statale n. 85 "venafra" compreso tra il quadrivio di Campobasso.
(b) By contract or labor in economy In economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.980.000,00 (un milione novecentottantamila
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi tre
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.980.000,00
Certifico che l'ammontare a lire

has been prepared by me covers the full requirements of the project, and is reasonably amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole. 286

R. Manoini

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

Ingegnere Capo Genio Civile Viabilità Statale

Date, and place
Data e luogo

Caserta

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.


Lt Colonel R. E.

Director

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

U. S. C. Commission

H. Q. A. C. C.

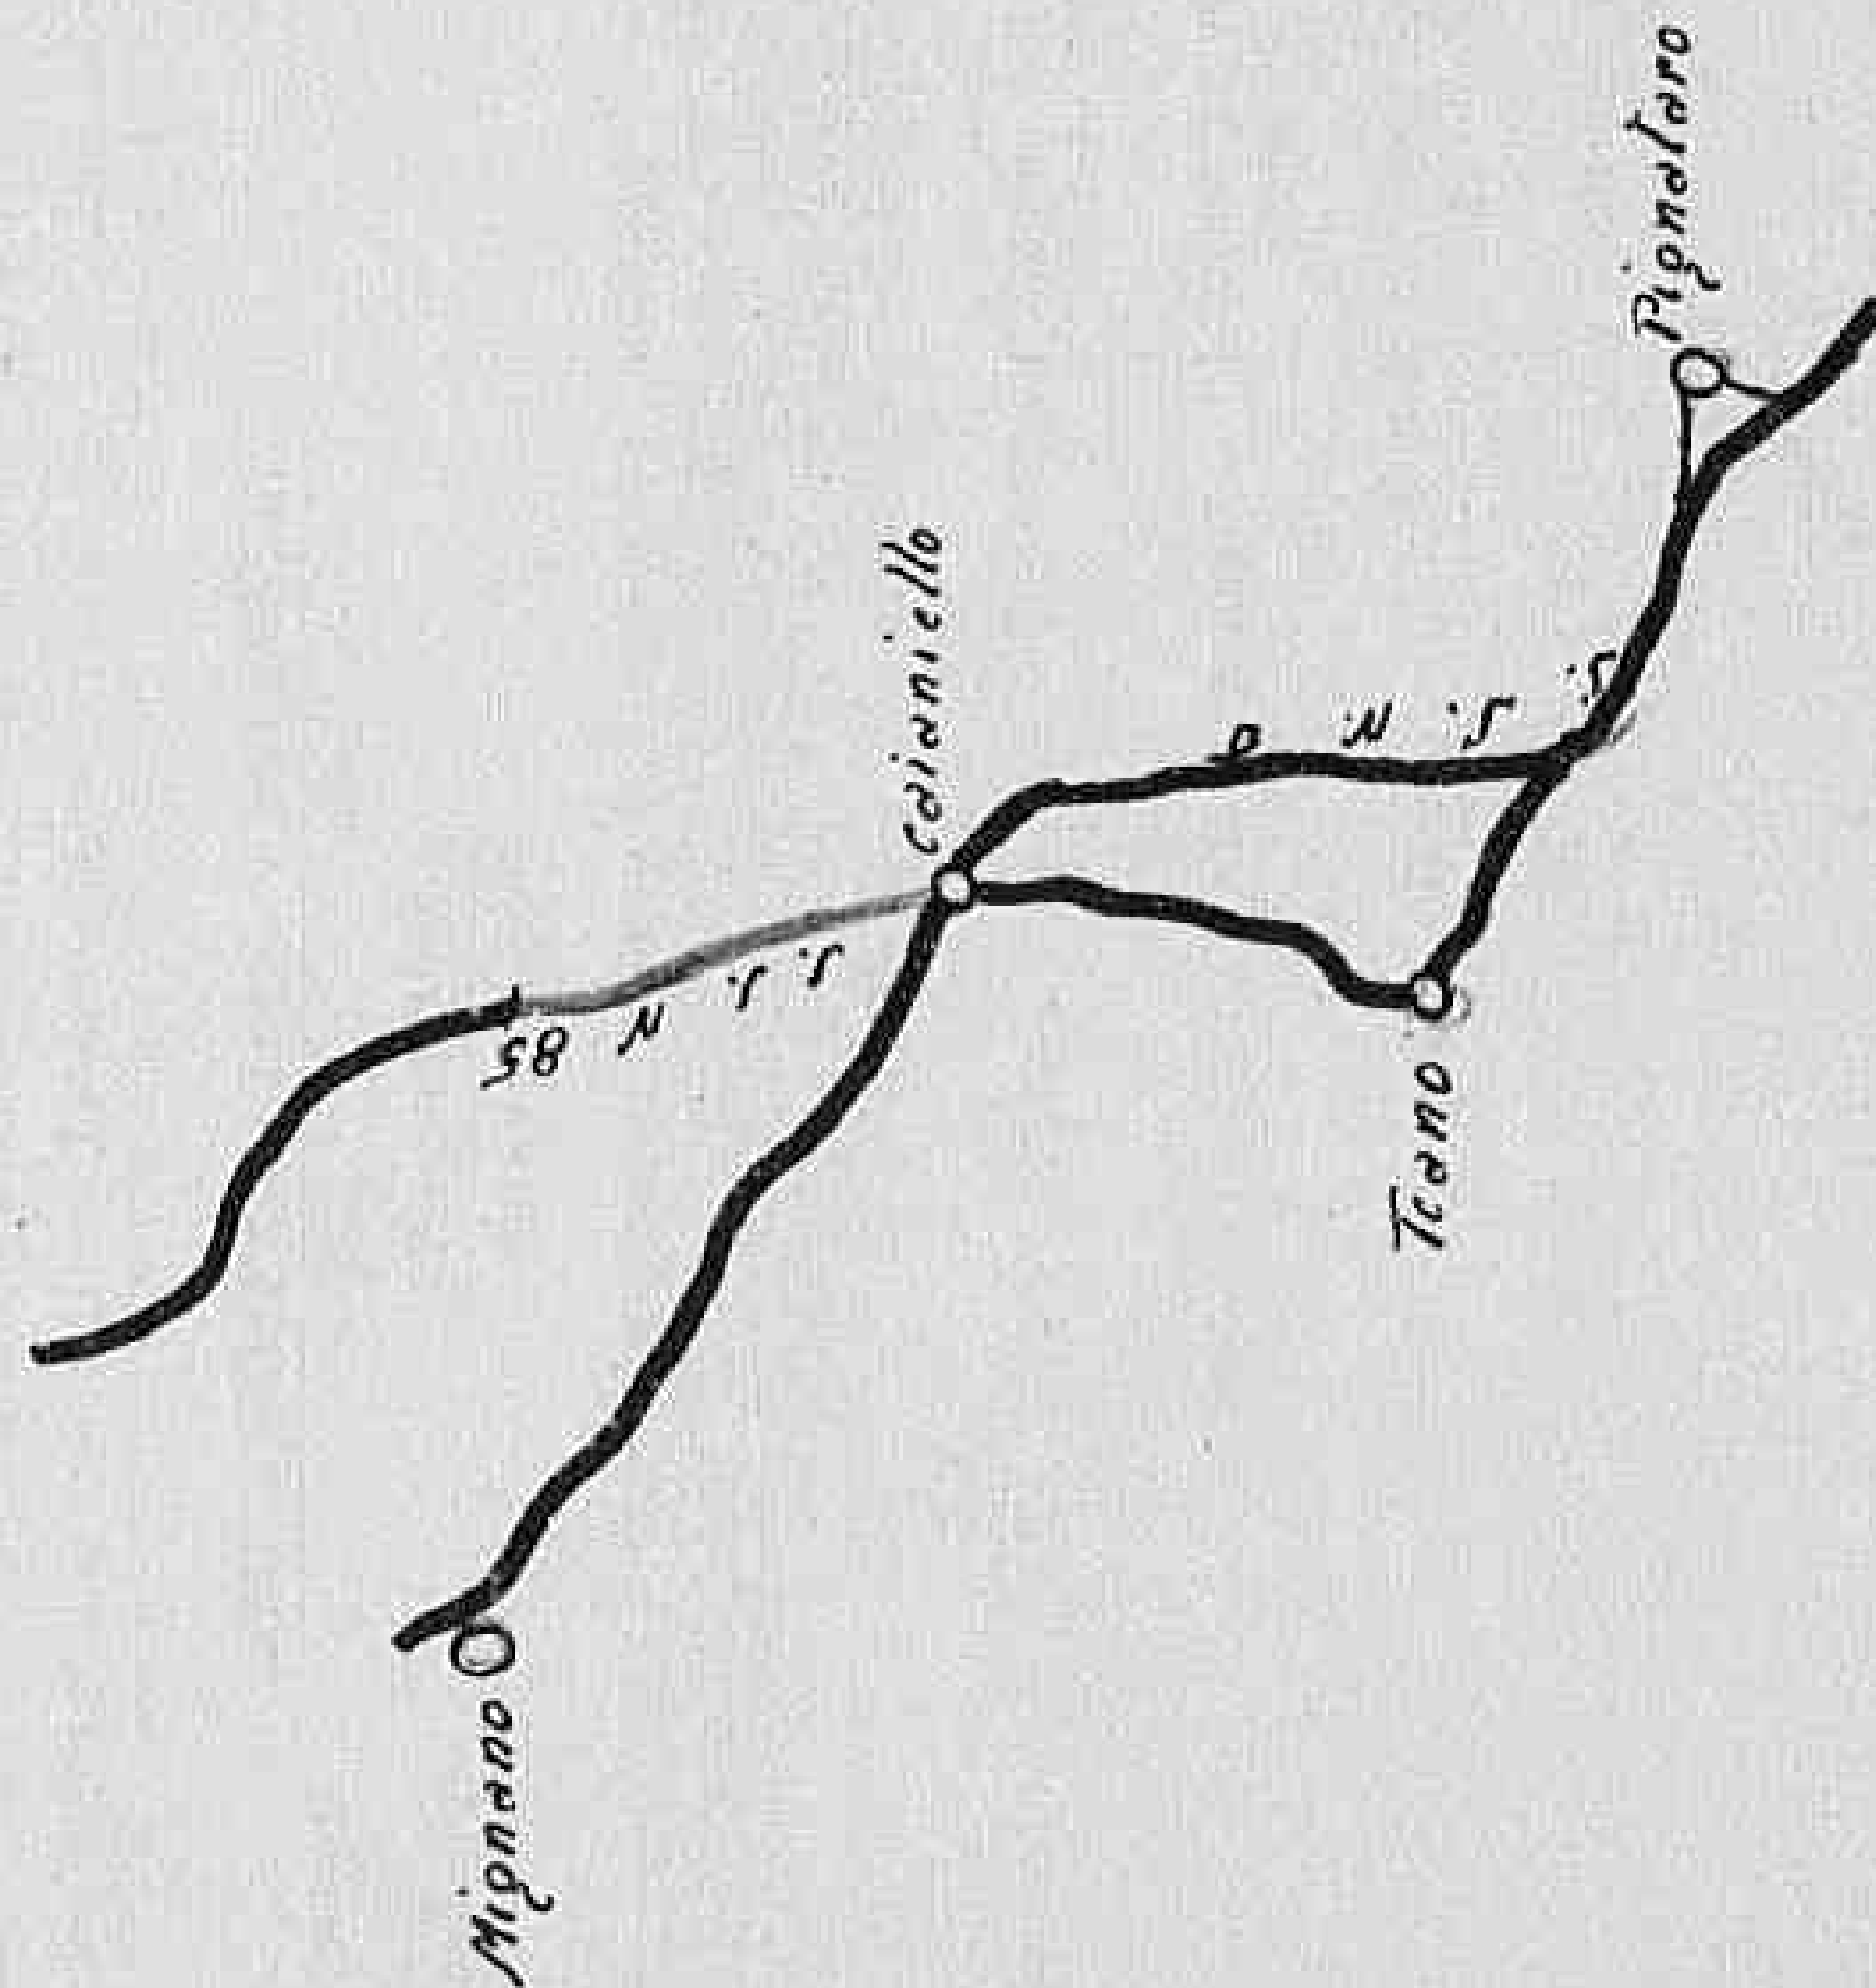

to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Region SOUTHERN

Province S A L E R N O

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sin, Pumping Sin etc. and location. Benincasa per l'esercizio degli
 (b) By contract or direct labour alla sezione Viabilità di Salerno - 15-6-999112241. A.C.C.
 Per contratto o lavoro in economia Per lavoro diretto

(c) Amount of approximate estimate £. 3.300.000,00.-
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente
 Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 dicembre 44
 Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Gli automezzi vengono esclusivamente impiegati nei lavori
 Note speciali stradali di interesse Militare . -

2. Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.300.000,00.-
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 3.300.000,00.-
 has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable 265 amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

Date, and place
Data e luogo

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)

Regional Engineer, or his representative.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.

Lt. Colonel R. E. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Deputy
ng

& U. Sub Commission
Chief Commission)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perin

Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Southern

Province Avellino

1. (a) ~~Building=Bridge, Road, Power Sta. Pumping=San etc. and location pavimentazioni deteriorate ;~~
 (b) ~~By contract or=direct labour~~ ~~per contratto o lavoro in economia~~

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in proprio

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Nel caso in cui l'Amministrazione fornisca oltre che il le-
Note special gante anche la graniglia in cava, per la saturazione del bitu-
me, l'importo della perizia riducesi a L. 3.800.000.00 e nel caso in fi-
ne che detta graniglia venga fornita su strada, l'importo della perizia
riducesi a L. 1.820.000.00.

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4,260,000.00 - oppure a
Certifico che l'accusa, senza ammontante a lire 2,800,000 oppure a L. 1,820,000:00

has been prepared by me. it covers the full requirements of the project, and is reasonable **26** amount.
è stata preparata da me, esse risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature _____
Firma _____

Meinung

William Shakespeare

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region	Southern
(APPROVALS)		Province	Avellino

Approvazioni

1. (a) Building-Bridge, Road, Power, Sub-Pumping-Station and location pavimentazioni deteriorate; fabbricato ponte strada, centrale elettrica, centrali idroelettriche e bivio mediante trattamento superficiale con bitume a caldo, lungo il tronco tra ponte Calore ed Avellino.

(b) By contract or-direct labour per contratto Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 4.260.000 (quattromilioni duecentosessantamila Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Nel caso in cui l'Amministrazione fornisce oltre che il le-
Note speciali gante anche la graniglia in cava, per la saturazione del bitu-
me, l'importo della perizia riducesi a L. 3.800.000.00 e nel caso infri-
ne, che detta graniglia venga fornita su strada, l'importo della perizia
riducesi a L. 1.820.000.00.

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.260.000.00 - oppure a
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.800.000 oppure a L. 1.820.000.00

has been prepared by me it covers the full requirements of the project, and is reasonable 264
è stata preparata da me essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Mancini

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Capo Compartimento della Viabilità
Designazione Ufficiale

Date, and place Caserta, 26 settembre 1944 n° 5217
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

2 Approved (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

Lt. Colonel R. E.


3. Approved.

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

VB/17
Sub-Commission

(Commission)

5E

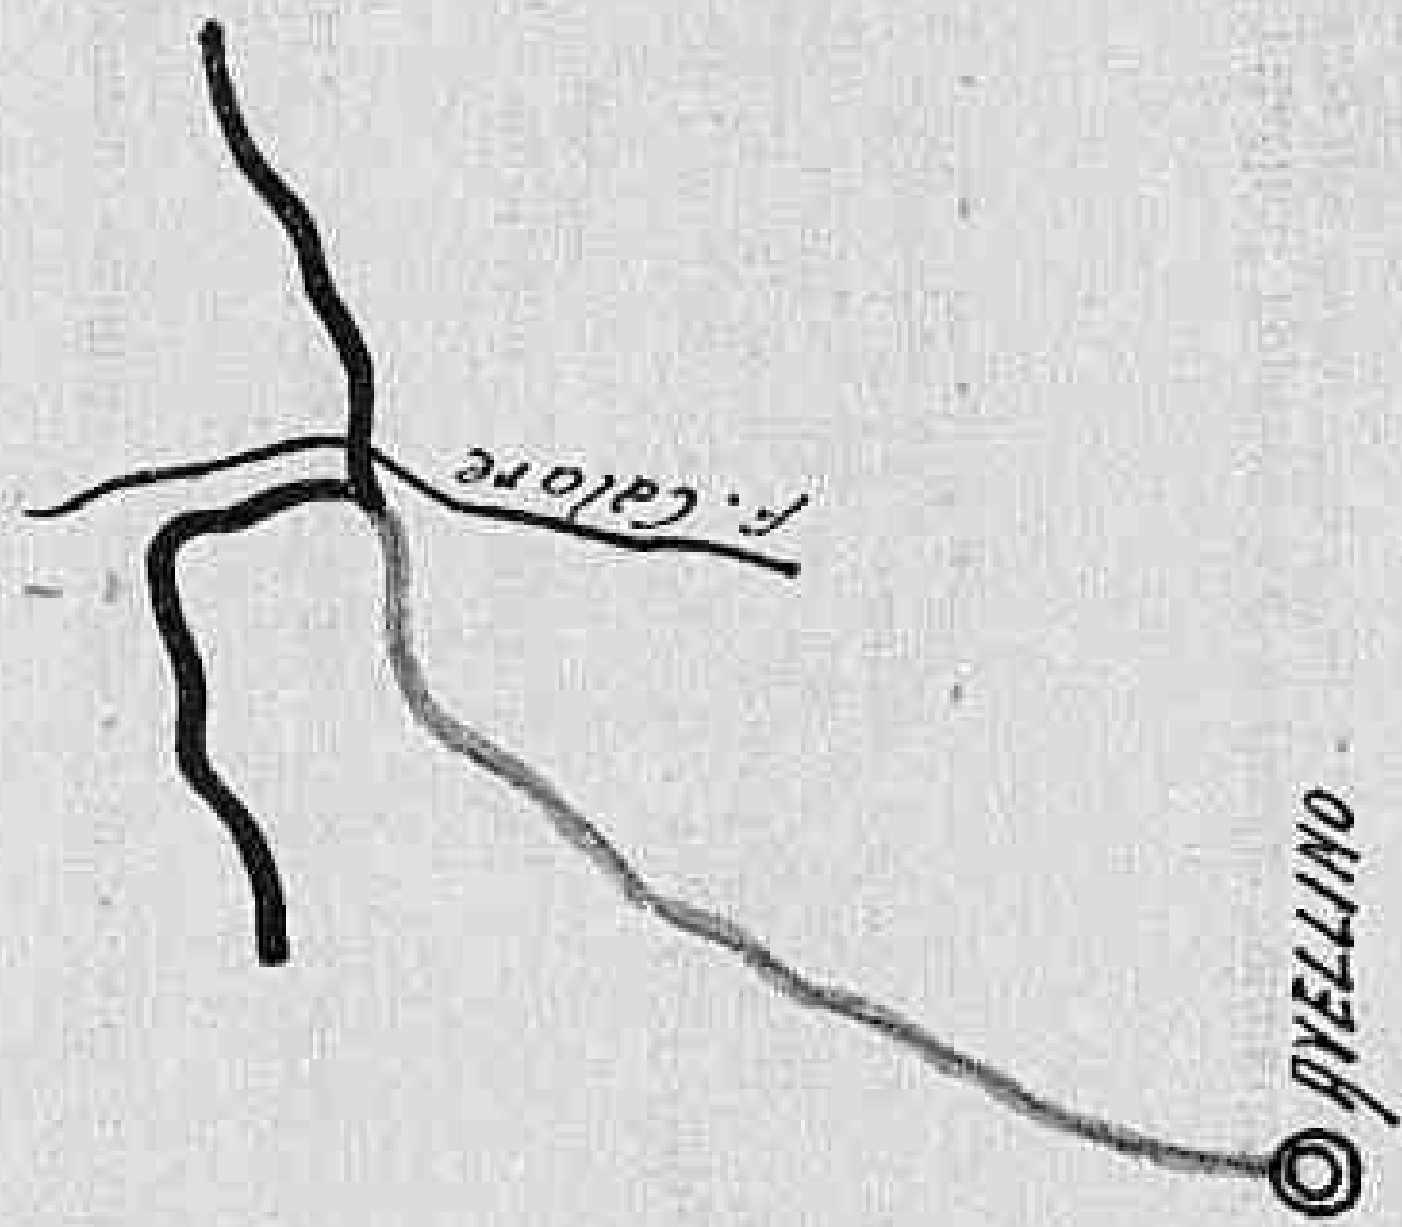

235

FORM. ACC. 1
(Estimate May - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizie lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

Seal Coating

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region Southern

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Napoli

1. (a) Building Bridge, Road, Power Sta., Pumping Sta., etc. and location pavements etc. deteriorated, le con bitume a caldo lungo il tronco compreso tra il Bivio per Ariano e per Arriano, per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 4,970.000 (quattromilioni novemcentosettanta mila)

(d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile

(e) Probable time for completion mesi due

(f) Special remarks Nel caso in cui l'Amministrazione fornisca, oltre che il le- Note speciali gante anche la griglia in cava, per la saturazione del bitume, l'importo della perizia riducesi a L. 3.625.000 e nel caso infine che detta griglia venga fornita su strada l'importo della perizia riduce- si a L. 2.250.000.

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.970.000 oppure 3625/000 oppure lire 2.250.000. = 263

has been prepared by me. It covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature

R. Mancini

Italian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial Registration
Designazione Ufficiale

Capo Compartimento della Viabilità

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
resistita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region Southern
CAPITAL EXPENDITURE		

Region Southern

Province Napoli

Approvazioni

Application

1. (a) Building-Bridge, Road, Power Sta., Pumping Sta etc. and location
fabbrica-ponte, strada, centrale elettrica, centrali idriche e localita'
le con bitume a caldo lungo il tronco compreso fra il
(b) By contract or direct-labour
Per contratto o lavoro in economia

Statale no 7 "Via Appia"
Lavori di ripresa generale delle
pavimentazioni deteriorate,
trattamento superficiale,
il Divio per Ariento
Bancovetto

provincia NAPOLI

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
L. 4.970.000 (quattromilioni novacentosettanta
mila)

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Nel caso in cui l'Amministrazione fornisca, oltre che il le-
Note speciali Gante anche la Graniglia in cava per la sicurezza del di-
l'importo della perizia riducessi a L. 3.625.000 e nel caso infine che,
detta Graniglia venga fornita su strada l'importo a
si a L. 2.280.000. =

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4.970.000 oppure 2.280.000 oppure Lire 2.280.000. = 263 3625/000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature: *R. Mancini*
Firma: *R. Mancini*

Official Registration
Designazione Ufficiale
Capo Compartimento della Viabilità

Date, and place CASTRIA 26 settembre 1944 no 5017
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. **Approved** _____ Date _____
Regional Engineer, or his representative.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.
& U. Sub Commission
(ated Commission)

52

BENEVENTO

Montecarchio

Spigno

1825

FORM. ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Strada Militare

Perizia lavori da eseguirsi

SEA COUNTING

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. restituirla all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo Region Southern

(APPROVALS)

Province Napoli

Approvazioni

Lavori di spalmatura generale con bitume a caldo e di ripresa dei giunti.
1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ti delle pavimentazioni in Fabbicato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località calcestruzzo ed in cubetti di porfido o vesuviani con mastice bituminoso lungo il tronco della strada.
(b) By contract or direct labour da statale n.7bis compreso fra Napoli ed Avellino per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate L.7.870.000,- oppure L.5.320.000,- oppure Lire
Ammontare della perizia 3.710.000,00

(d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks La previsione di lire 7.870.000, riflette l'esecuzione dei
Note speciali lavori con l'esclusione del solo bitume; quella di L.5.320.000,-
esclude anche il costo della graniglia in cava, quella infine
di L.3.710.000,- esclude pure il trasporto della graniglia su
strada.

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L.7.870.000,- 2822
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 5.320.000,00 - oppure L.3.710.000,-

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature

Firma

R. Mancini

Italian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione Ufficiale

Capo Compartimento della A.A.S.S.

Date and place of receipt 94 e. H. 1944 5189

NOTE.: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo Region Southern Province Napoli

(APPROVALS)

Approvazioni

Lavori di spalmatura generale con bitume a caldo e di ripresa dei giunti Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location ti delle pavimentazioni in Fabbicato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località calcestruzzo ed in cubetti di porfido o vesuviani con mastice bituminoso lungo il trocchio della strada By contract or direct labour da statale n.7bis compreso fra Napoli ed Avellino Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate 1.7.870.000,-oppure 1.5.320.000,- oppure Lire Ammontare della perizia 3.710.000,00

(d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due Data probable per l'esecuzione

(f) Special remarks La previsione di lire 7.870.000, riflette l'esecuzione dei Note speciali lavori con l'esclusione del solo bitume; quella di L.5.320.000,- esclude anche il costo della graniglia in cava, quella infine di L.3.710.000,- esclude pure il trasporto della graniglia su strada.

2. Certificates : Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.7.870.000,-²⁸²pure Lire Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 5.320.000,00 - oppure 1.3.710.000,-

has been prepared by me it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. è stata preparata da me, ed risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Firma

R. Mancini

Italian Engineer Ingegnere Italiano

Official designation Capo Compartimento della A.A.S.S. Designazione Ufficiale

Date, and place Data e luogo

Caserta 24 settembre 1944 n. 5182

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

Lt Colonel R. E.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.


3. Approved.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

H. G. A. C. C.

U. Sub-Commission

(Commission)

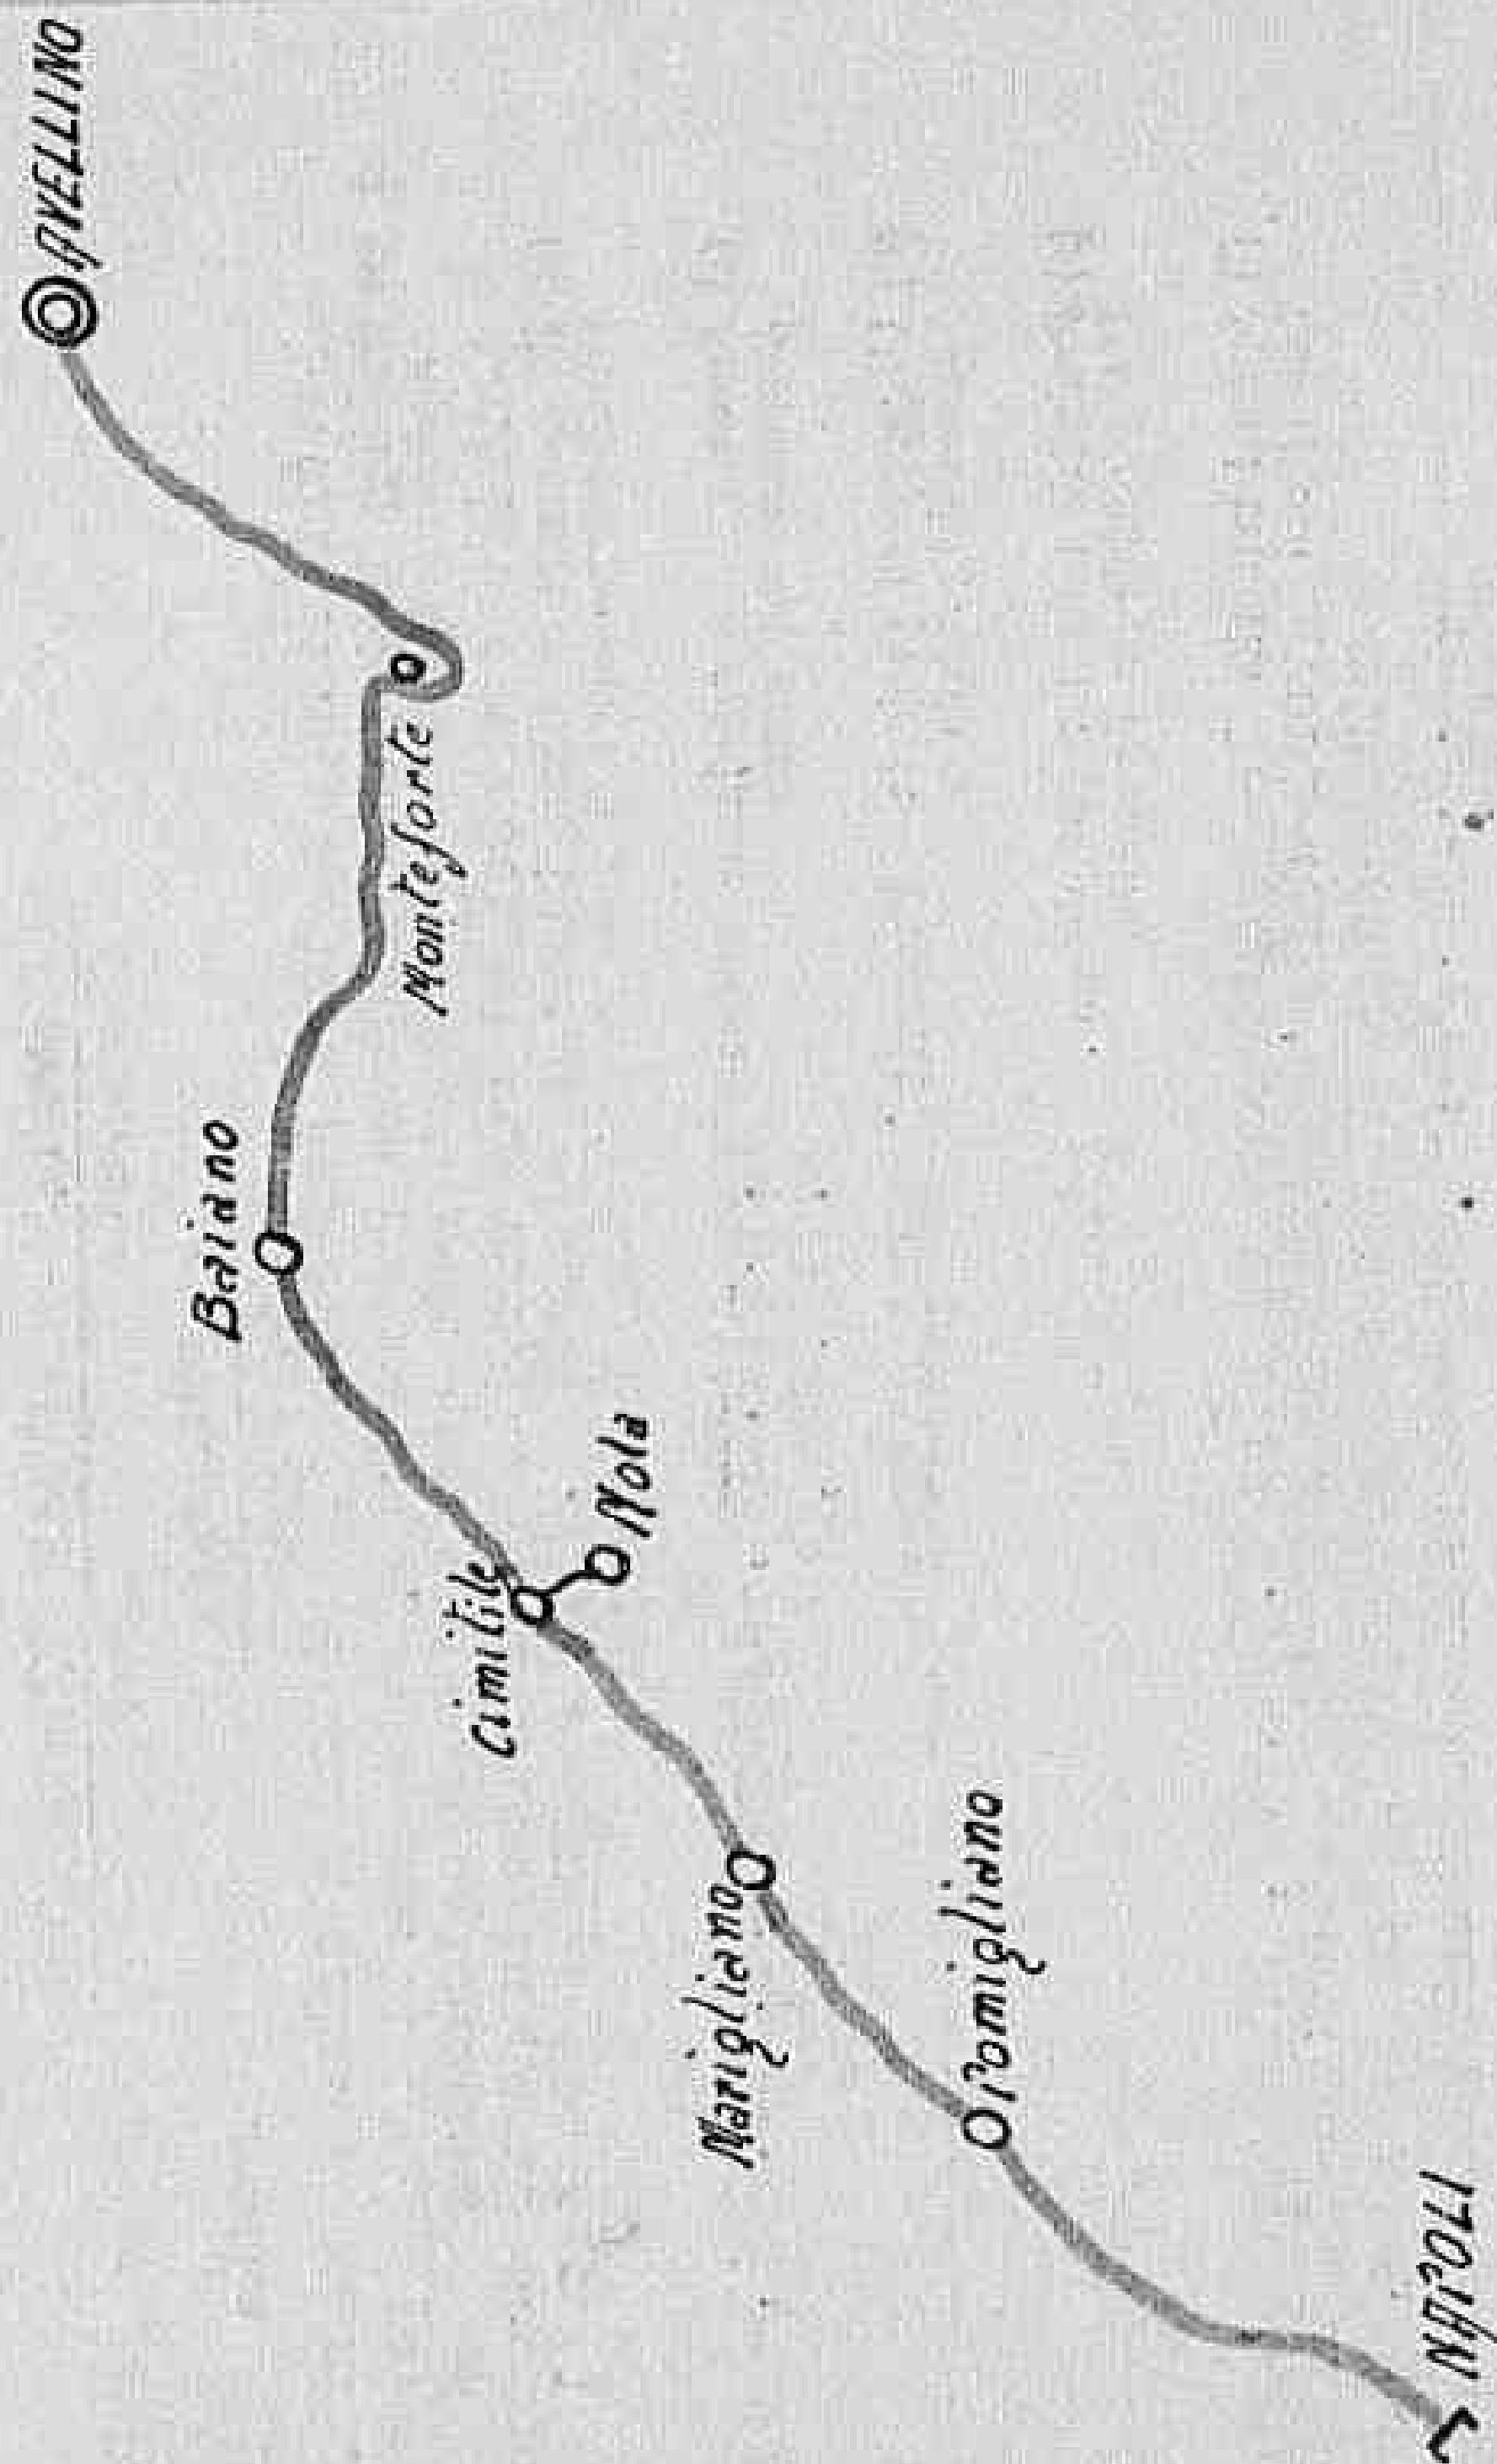

FORM AOS. 1
(Estimate Rev. 7 June 43)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà resti-
returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works,
tutta all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo
(APPROVALS)	
Approvazioni	

Region Military Highways
Southern.
Province S alerno

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sm, Pumping Sm etc. and location

~~Fabbrica, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica, etc. e località~~ S. S. 18-Tratto: Bivio Pagani -
Ganerelle-Riparazioni-I° supplementivo
(No. 34 + 660 + 661 + 662)

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

1.900.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

Lavori già eseguiti dall'Impresa MALATESTA per disposti

2 Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.900.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in 261 mt.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature

Ing. R. Mancini

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

CAPO COMPARTIMENTO A.A. S.S. Caperta

Date, and place
Data e luogo

C aserta, 11 30 Agosto 1944

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Southern.
S alerno

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Str, Pumping Str etc. and location
Fabbricato, ponte, strade, centrale elettrica, centrale idroelettrica, etc. e località
S.S. 18-Tratto: Bivio Pagani -
Gamelle-Riparazioni-I. supplementivo
(Km. 34 + 500 - Km. 42)

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

1.900.000,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

Lavori già eseguiti dall'Impresa MALATESTA per disposti

2 Certificates:
Certificati

sizione del Cap. WEBER . =

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.900.000.00
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in 261 mt.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma

Ing. R. Mancini

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

CAPO COMPARTIMENTO A.A. S.S. Caserta

Date, and place
Data e luogo

Caserta, 11 30 Agosto 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.


Lt. Colonel R. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Deputy } Director

13 }

U. Sub-Commission

(and Commission)

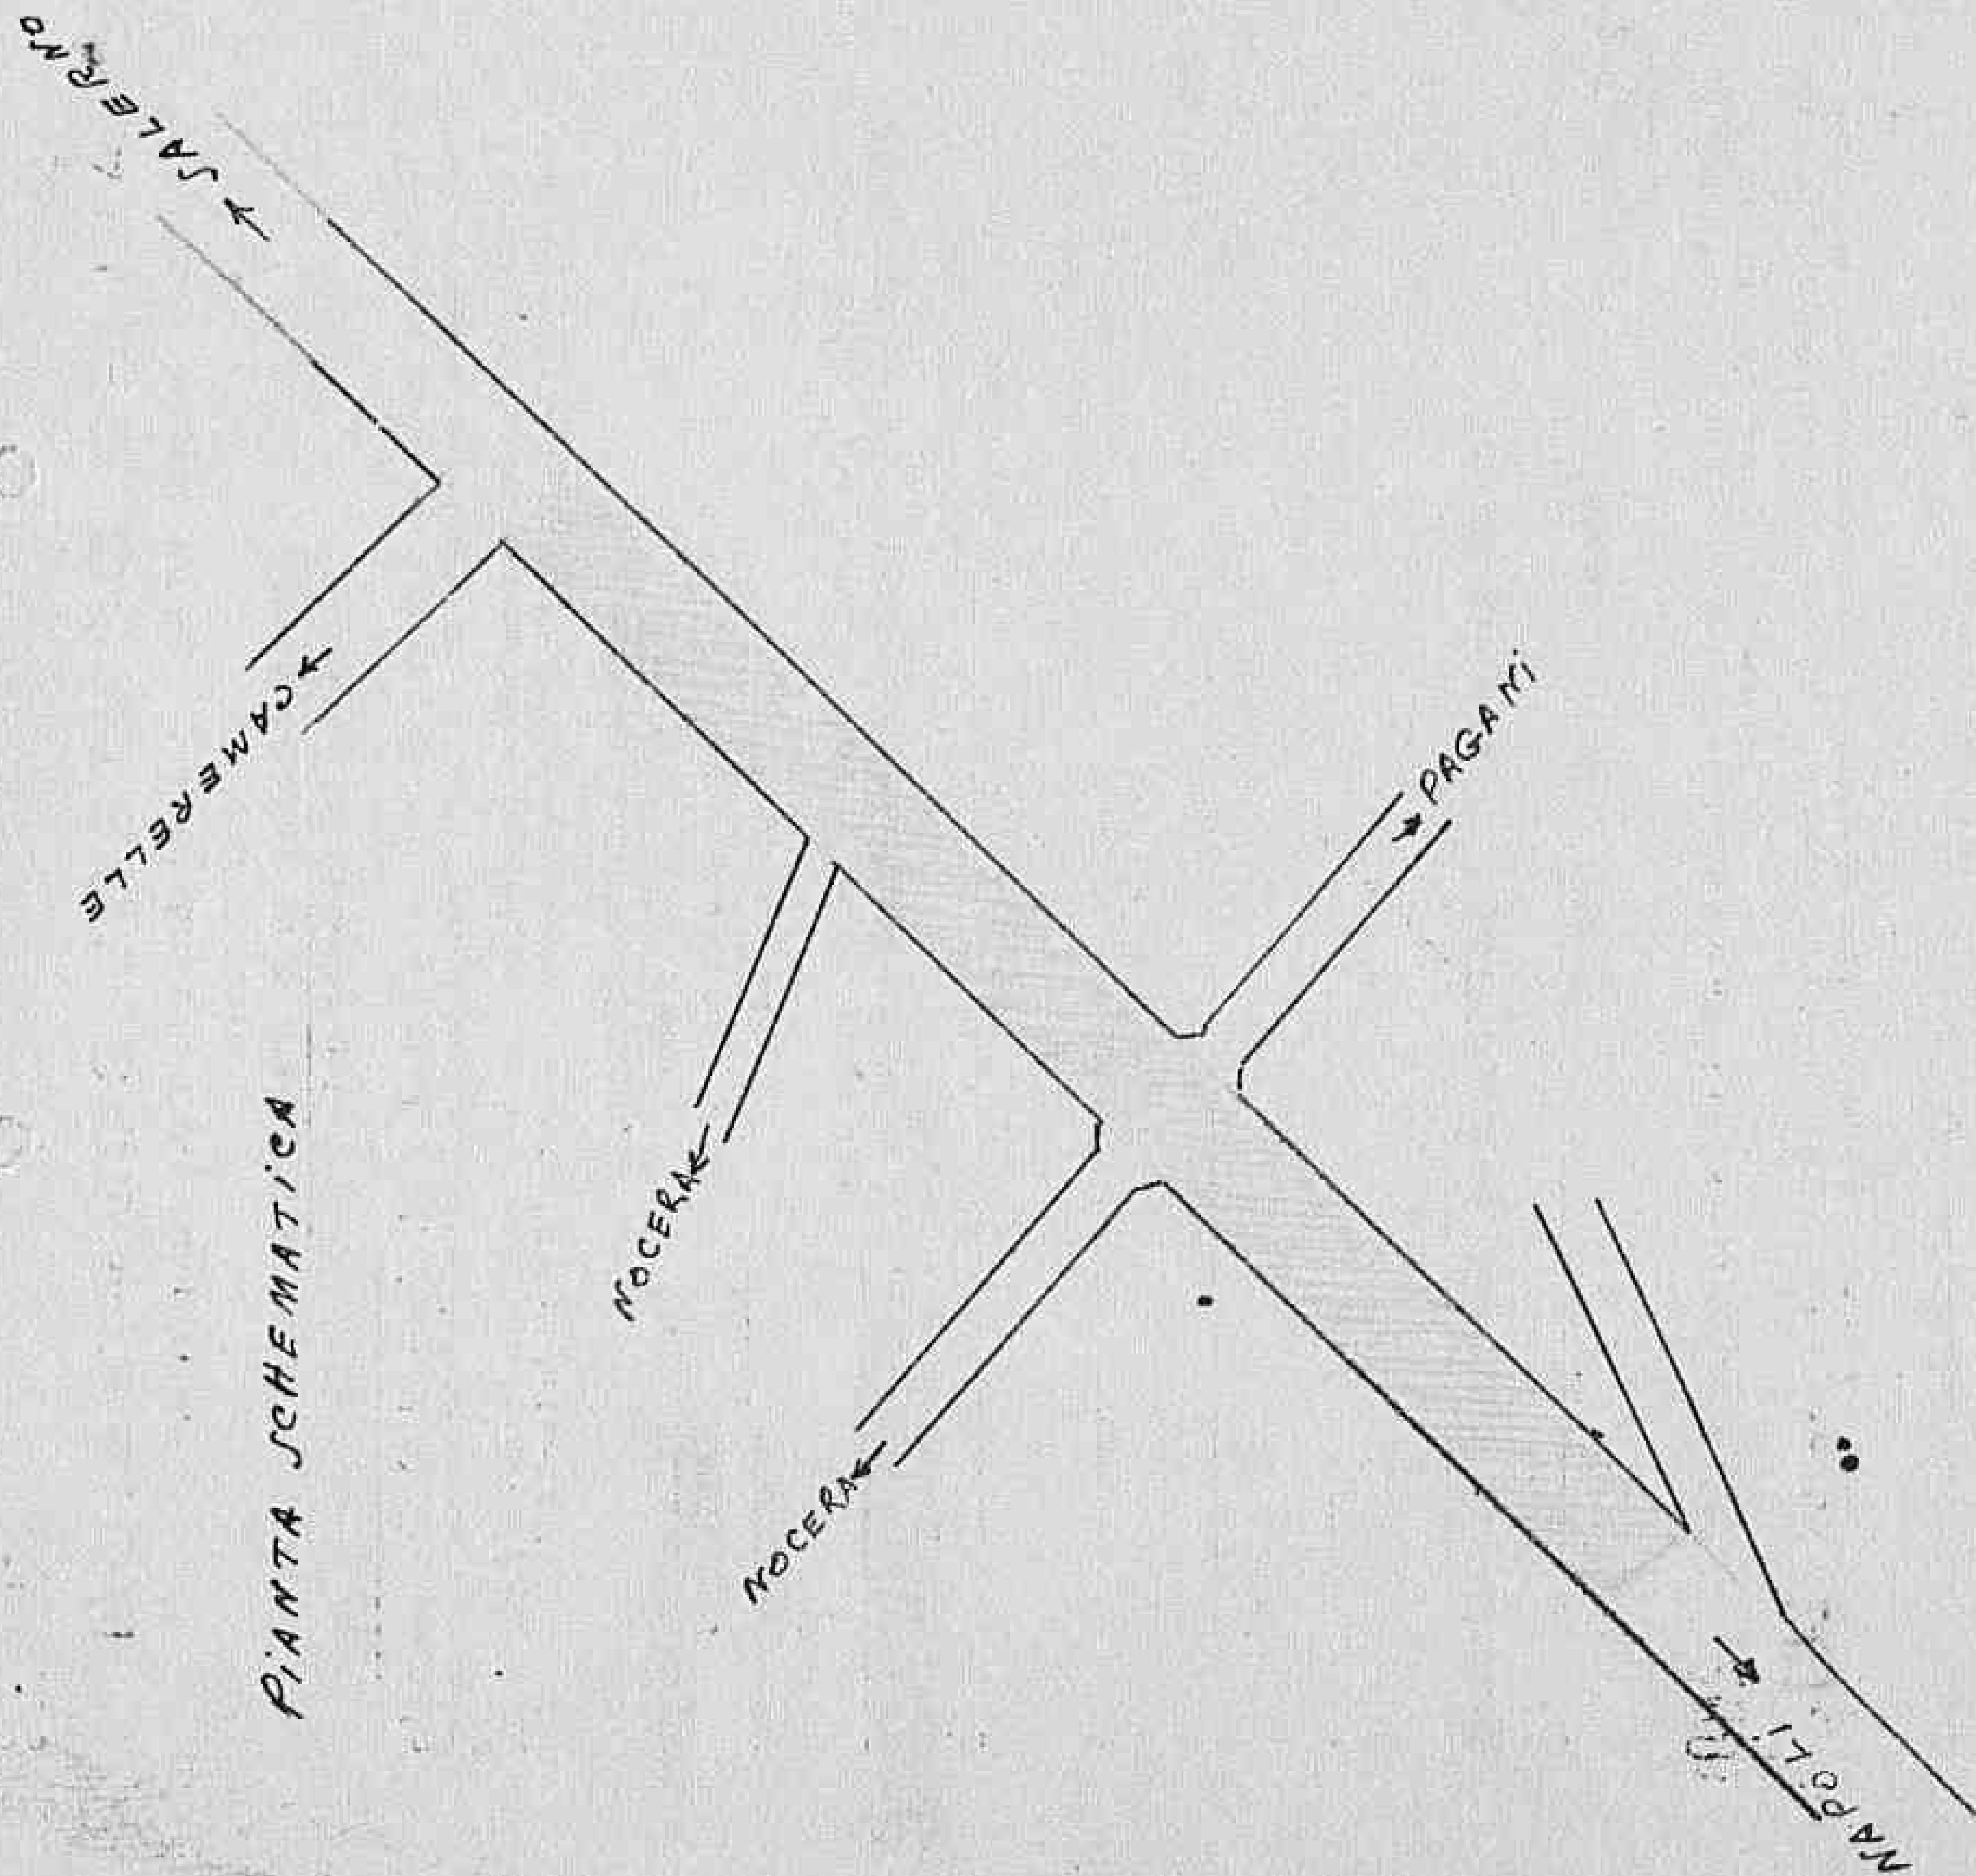

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 49)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB.COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. *Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.*

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Region Southern

Province Avellino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ponte N. 110 - Strada Statale
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
- (b) By contract or direct labour N. 7 Appia (km. 118+530) presso di
Per contratto o lavoro in economia
vic Salina Ispina
per cottimo fiduciario

(c) Amount of approximate estimate L. 38.500 -
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion giorni sessanta
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I lavori per ragioni di urgenza sono già stati eseguiti
Note speciali

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 38.500 -
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature GRISCI SAVERIO
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation V. Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione Ufficiale

260

(APPROVALS)
Approvazioni

Region Southern

Province **Avellino**

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sm, Pumping Sm etc. and location **Ponte N. 110 - Strada Statale**
 Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località **N. 7 Appia (Km. 318+530) presso di**
via Salsa Irpina

(b) By contract or direct labour **per cottimo d'ogni giorno**
 Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **L. 38.500 -**
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **urgente**
 Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **giorni sessanta**
 Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks **I lavori per ragioni di urgenza sono già stati eseguiti**
 Note speciali

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **38.500 -** **260**
 Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature

Firma

CRISCI Saverio

Italian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation: **Ing. Ingegnere Capo del Genio Civile**
Designazione UfficialeDate, and place
Data e luogo**29 luglio 1944 in Avellino**

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

Other funds

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.

Lt. Colonel R. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Deputy }
Acting } DirectorW. & U. Sub Commission
(Attied Commission)

(20)

Ponte n° 110 - Strada Statale n° 7 "Apia" (km. 312 - 313) presso

bivio Selsa Irpina



L'INGEGNERE CAPO
Saverio CRISCI

[Signature]

Avellino 11 29 luglio 1944

FORM 407, 1
(Estimated Nov - 7 June 49)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, Italia all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici. Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)
Approvazioni

Military Highways
Region Southern

Province Salerno

- 1 (a) ~~Building-Bridge, Road-Power-Street-and location~~ STRADA MILITARE Tratto tra km. 28 e km. 31+500-Piromatura pavimentazione in cubetti

(b) By contract or direct labour economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.000.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2 Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature Ing. B. Mancini

259

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This module va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Military Highways

Region Southern.

Province Salerno

STRADA MILITARE

- 1 (a) ~~Building~~ ~~Bridge~~, Road, ~~Power~~ ~~Stn~~ ~~Power~~ ~~Stn~~ ~~etc.~~ ~~and location~~ ~~Statole~~ ~~18~~ ~~Tratto tra km. 28 e~~
 Fabbrica ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e localita ~~km. 31+500~~ ~~Ritumatura pavimentazione~~
 in cubetti

- (b) By contract or direct labour ~~economia~~
 Per contratto o lavoro in economia

- (c) Amount of approximate estimate ~~L. 1.000.000,00~~
 Ammontare della perizia

- (d) Urgency of project: ~~urgente~~
 Urgenza del progetto

- (e) Probable time for completion
 Data probabile per l'esecuzione

- (f) Special remarks
 Note speciali

2 Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire ~~259~~
 Certifico che l'elabora perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me, essa risponde a tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature ~~Ing. R. Mancini~~Italian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation ~~CAPO QUARTIERE~~ ~~A.A.S.S.~~
Designazione UfficialeDate, and place ~~Caserta, 12~~
Data e luogo

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

Regional Engineer, or his representative.

Lt. Colonel R. E.

3. Approved. Deputy
Acting

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

W. & U. Sub Commission

(Attied Commission)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region Southern

(APPROVALS)

Approvazioni

Province **Avelino**

1. (a) Buildings-Bridge, Road, Power-Stair Pumping-Structures-and-towers
fabbricati-ponti-strada, centrali-elettrici-elevatori-idraulici-e termici
civili con bitume a caldo lungo il tronco compreso tra Renevento e ponte
(b) By contract or-direct-labour per contratto
Per contratto e-lavoro-in-economia

(b) ~~By contract or direct-labour~~
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 3,600,000. = (tre milioni seicentomila)
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion _____ mesi due
Data probabile per l'esecuzione _____

(f) Special remarks
Note speciali anche la graniglia in cava, per la saturazione del citone, l'im-
porto della perizia riducesi a L. 2.545.000 e nel caso infine cge det-
ta graniglia venga fornita su strada l'importo della perizia riducesi a
Lire 1.685.000. =

2. Certificates:

(a) Certified that the ~~attached~~ approximate estimate amounting to lire 3,600,000. = oppure lire
Certifico che l'accusa perizia ammontante a lire 2.545/000 oppure L. 1.685/000. =

has been prepared by me. It covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto, e l'ammontare è ragionevole.

258

Italian Engineer

Official designation Ing. Capo Compartimento della Viabilità

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo Region Southern
(APPROVALS) Province Avellino

Statale n° 7 "Via Appia" Lavori di ripresa generale delle

1. (a) ~~Buildings-Bridge, Road, Power Sta., Pumping-Stations and locations~~ ~~pavimentazioni deteriorate~~ ~~fabbricati-ponte, strada, centrale elettrica, stazioni di pompaggio e località~~ ~~mediante trattamento superficiale con bitume a caldo lungo il tronco compreso tra Benevento e Ponte~~
(b) By contract or direct labor per contratto o lavoro in economia Calore

(c) Amount of approximate estimate 3.600.000.= (tre milioni seicentomila)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi due
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Nel caso un cui l'Amministrazione fornisca oltre il legante
Note speciali anche la famiglia in cava, per la saturazione del bitume, l'im-
porto della perizia riducesi a L. 2.545.000 e nel caso infine esse det-
ta graniglia venga fornita su strada l'imposto della perizia riducesi a
Lire 1.685.000.=

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 3.600.000.= oppure lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire 2.545.000 oppure L. 1.685.000.=

has been prepared by me. It covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me. Essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer Ing. Cap. Compartmento della Viabilità
Ingegnere Italiano Designazione Ufficiale
Signature: Mancini 258
Date, and place Caserta 26 settembre 1944 - n° 5217
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.
Date Calore 1944

2. Approved. (Highway Fund)
(Other funds) 26/10/44


Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. Li. Colonel Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Deputy Director VB/ Director ing.

W. & U. Sub-Commission

52

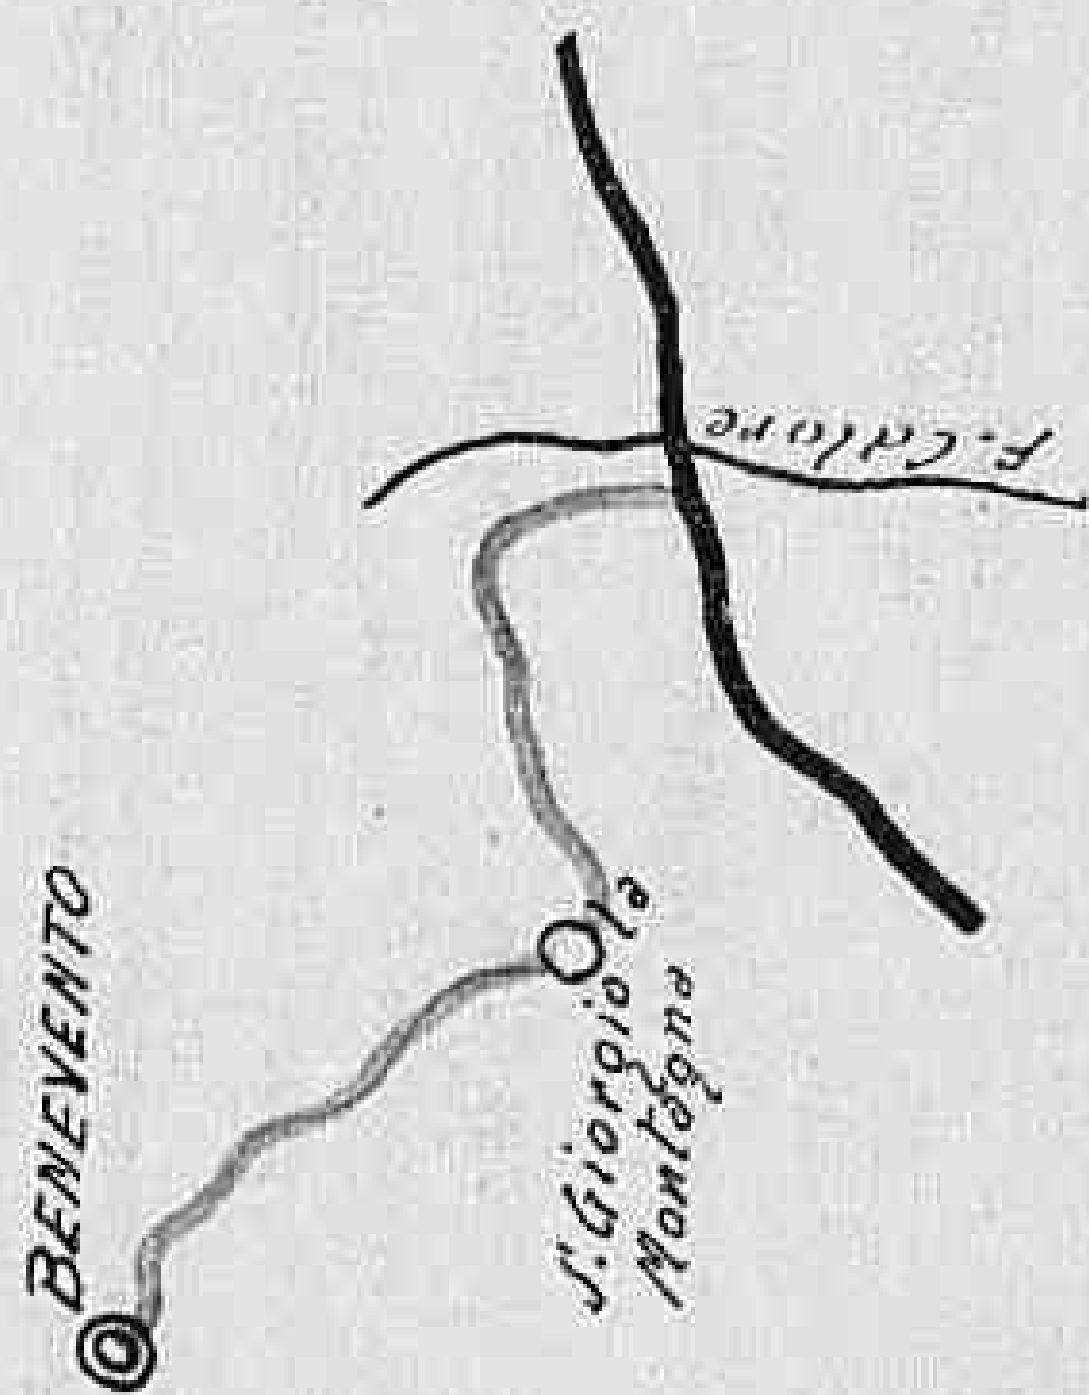

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

STRADA MILITAREESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va compilato in triplice copia; una copia rimane al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo (APPROVALS) Approvazioni	Region Southern Province <u>Avellino</u>
---------	--------------------------------------	---

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sta., Pumping Sta. etc. and location: Ponte N. 107 - Strada Statale
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour: per cottimo fiduciario
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate: L. 44.000 -
Importo della perizia

(d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: giorni sessanta
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: I lavori per ragioni di urgenza sono già stati eseguiti
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lira 44.000 -
Certifico che l'ultima perizia ammonta a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.



Signature: CRISCI Saverio
Firma

Official designation: P. Ingegnere Capo del Genio Civile
Designazione ufficiale

Date and place: 29 luglio 1944 in Avellino
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, all by registered mail. *Questo modulo va compilato in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Subcommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.*

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Region Southern
 Costo Province Avellino
 (APPROVALS)
 Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sta., Pumping Sta. etc. and location Ponte N. 107-Strada Statale
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
 (b) By contract or direct labour N. 7 Appie (Km. 316+850) presso
Per contratto o lavoro in economia bivio Salza Irpina
 (c) Amount of approximate estimate L. 44.000 -
Importo della perizia
 (d) Urgency of project urgente
Urgenza del progetto
 (e) Probable time for completion giorni sessanta
Data probabile per l'esecuzione
 (1) Special remarks I lavori per ragioni di urgenza sono già stati eseguiti
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 44.000 -
Certifico che l'ascolta perizia ammonta a lire
 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount,
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

CRISOL SAVERIO

Italian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation P. Ingegnere Capo del Genio Civile
*Designazione ufficiale*Date and place 29 luglio 1944 in Avellino
Data e luogo 257

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved: (Highway Fund)

(Other funds)

3. Approved:

Director

Minister of Public Works and Utilities, Sub Commission A. C. C.

Avellino - Tip. Pergola

(Ambed omission)

(19)

Ponte n° 107 _ Strada Statale n° 7 "Appia " (Km. 316 + 850) presso bivio
Salza Irpina .



L'Ingegnere Capo
(Saverio CRISCI)

Avellino 29 Luglio 1944



S. Crisci

FORM ACC. 1
(Exhaustive Rev. - 1 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

STRADA MILITARE

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Region Southern

Province Avellino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ponte N.108 sulla strada Sta-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località tale n.7 Appia (Km. 328+850) pres-
so Montemarano
- (b) By contract or direct labour Lavori in economia diretta
Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate Lire 45.000 -
Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project urgente
Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion giorni trenta
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks Sono stati già eseguiti i lavori per ragioni di urgenza
Note speciali

2. Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 45.000 -
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
- has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.*
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature CRISCI Saverio
*Firma*Official designation p. Ingegnere Capo del Genio Civile
*Designazione ufficiale*Date and place 7 agosto 1944 in Avellino
Data e luogo

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

[Signature] Date Oct 28, 1944
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved: (Highway Fund)

(Other funds)

[Signature] 26/10/44
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub Comm. A. C. C.

3. Approved: Lt Colonel R. E.

(Army)

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Col. Newley

P. W. & U. Sub-Commission

Ponte n° 108 sulla strata Statale n° 7 " Appia" (km. 328 + 850) presso
Montemarano.=



Il Maggiore Capo

(Saverio CRISCI)

Avellino li, 7 agosto 1944



[Handwritten signature]

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 40)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. *Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.*

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

<u>Perizia</u>	<u>Costo</u>	<u>Region</u>	<u>Military Highway</u>
(APPROVALS)		Southern	
Approvazioni		Province Salerno	

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sm, Pumping Sm etc. and location *Revisione e riverniciatura (Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ponte in ferro sul Picentino in Pentecagnano. (S.S. 18).-*
- (b) By contract or direct labour *in economia*
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate *£. 200.000,00*
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: *Urgente*
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion *30 giorni*
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks *Il materiale contingente dovrà essere fornito dagli*
Note speciali

Allegati

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire *£. 200.000,00-*
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature *Ing. Giuseppe Scialoja* *(Ing. Giuseppe Scialoja)*
Firma

Italian Engineer *Perizia*
Ingegnere Italiano *Designazione Ufficiale*

Date, and place *11 agosto 1944 - Salerno*

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Salerno

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sln, Pumping Sln etc. and location. Revisione e riproieciatura (Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località ponte in ferro sul picentino in Pentecagnano. (S.S. 18).-
- (b) By contract or direct labour in economia Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate L. 200.000,00
Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: Urgente
Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion 30 giorni
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks Il materiale contingente dovrà essere fornito dagli

Allegati:

2. Certificates:
Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 200.000,00-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

G. G. G. (Ing. Giuseppe G. G.)

Italian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione UfficialeDate, and place
Data e luogo

11 Agosto 1944 - Salerno

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)


(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved. Lt. Colonel R. E.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

U. Sub Commission
(Commission)

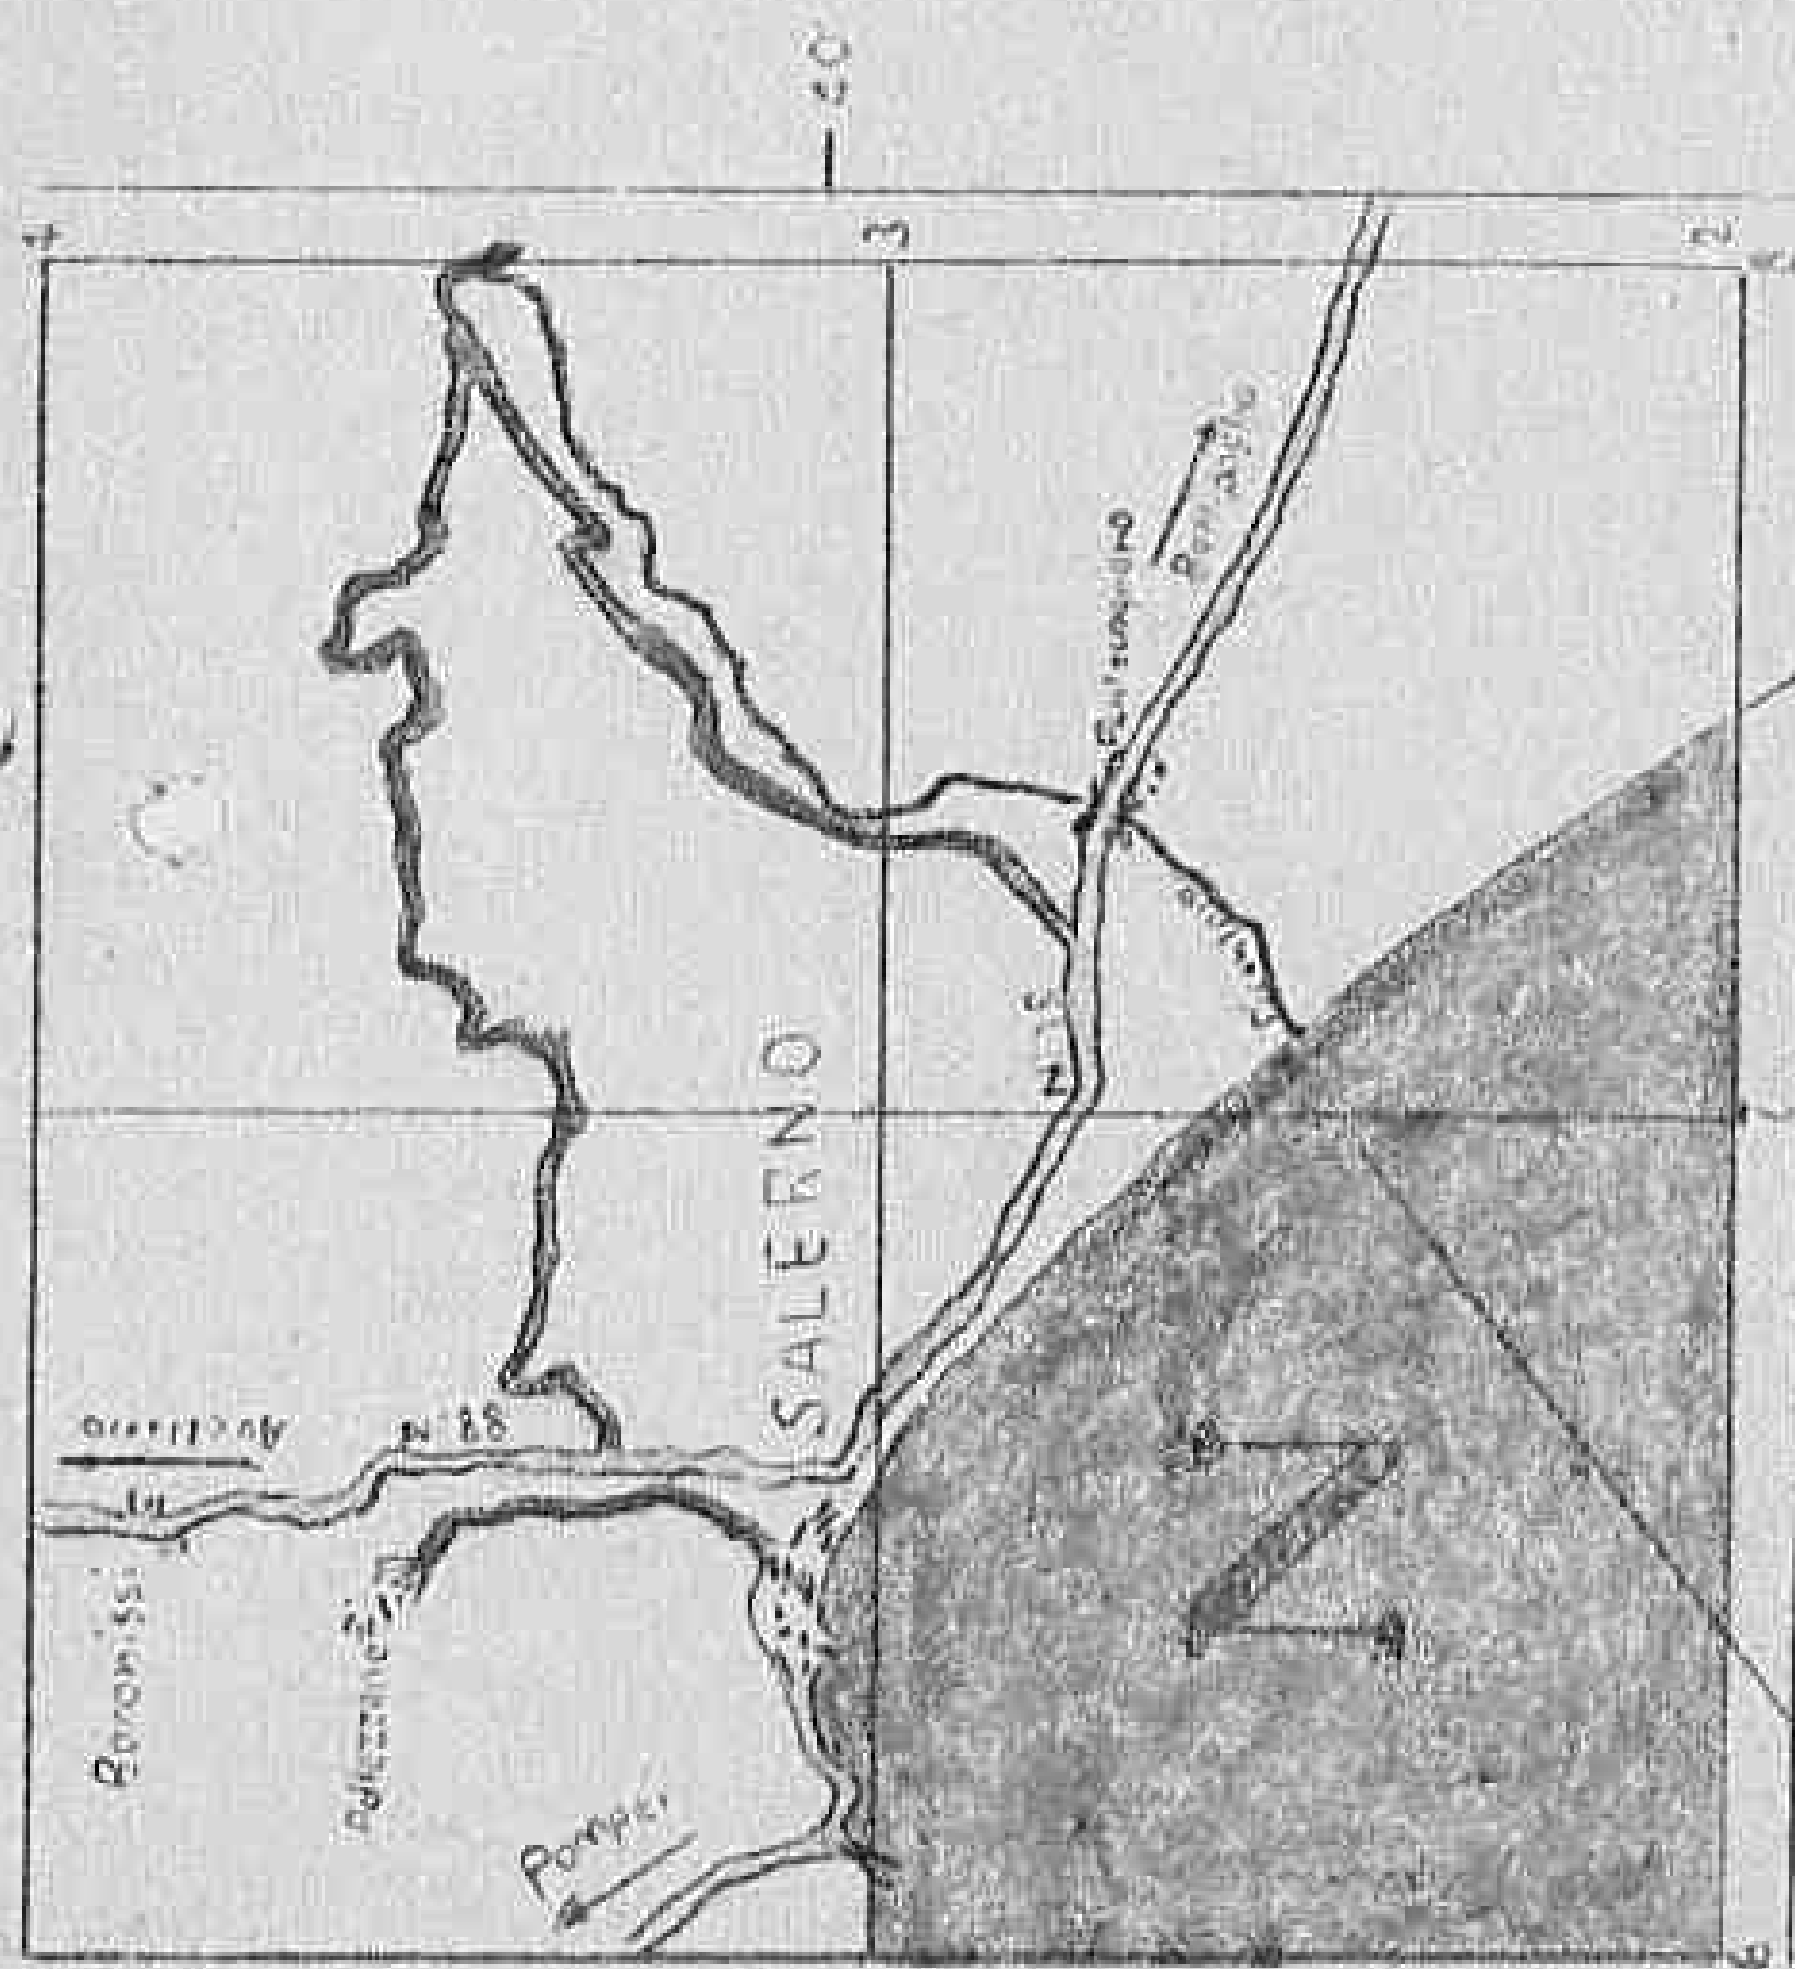

120' Scale 1:200,000
PONTE SUL PICENTINO

FORM. ACC. I
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo Region III

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Napoli

Lavori di ricostruzione del ponte sul fosso Pezzasecca alla progressiva Km/ca 136+500 della strada statale n° 6 "Via Cassilina".

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.700.000.00 (lire un milione settecento mila)
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente ed indifferibile
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion mesi cinque
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I lavori sono stati richiesti dal Cap. Parry Marshall -
Note speciali

RE - HQ82 - CRE REF LETTER 1/40 AVG 1946

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.700.000.00.
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa copre tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

2323

Mancini

Signature

Stamp

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region	III
---------	-------	--------	-----

(APPROVALS)

Approvazioni

Lavori di ricostruzione del ponte sul fosso Pezzasecca alla progressiva Km/ca
1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Site, Pumping, Sew, etc and location 186+500 della strada sta-
tionamento ponte, strada centrale, le luci = ~~segnali~~ ~~segnali~~ tale n° 6 "VIA Cassiling"

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. I. 700.000.00 (lire un milione settecento
Ammontare della perizia mila)

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Note speciali	I lavori sono stati richiesti dal Cap. Pariv Marshall
--------------------------------------	---

RE - HQ32 - CRF REF LETTER 1/20 AVG. 1966

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.700.000. =
Certifico che l'acclusa ~~stima~~^{stima} ammontante a lire

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole e soddisfacibile.

Signature Mancini 252

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation Ingegnere Capo Genio Civile Viabilità Statale
Designazione Ufficiale

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

Mr. Thompson Plot 29/10/44.


Lt Colonel R. E.

3. Approved.

Deputy Director of Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

VB/ *W. & W. Sub. Commission Works*
(Attd. Commission)

45

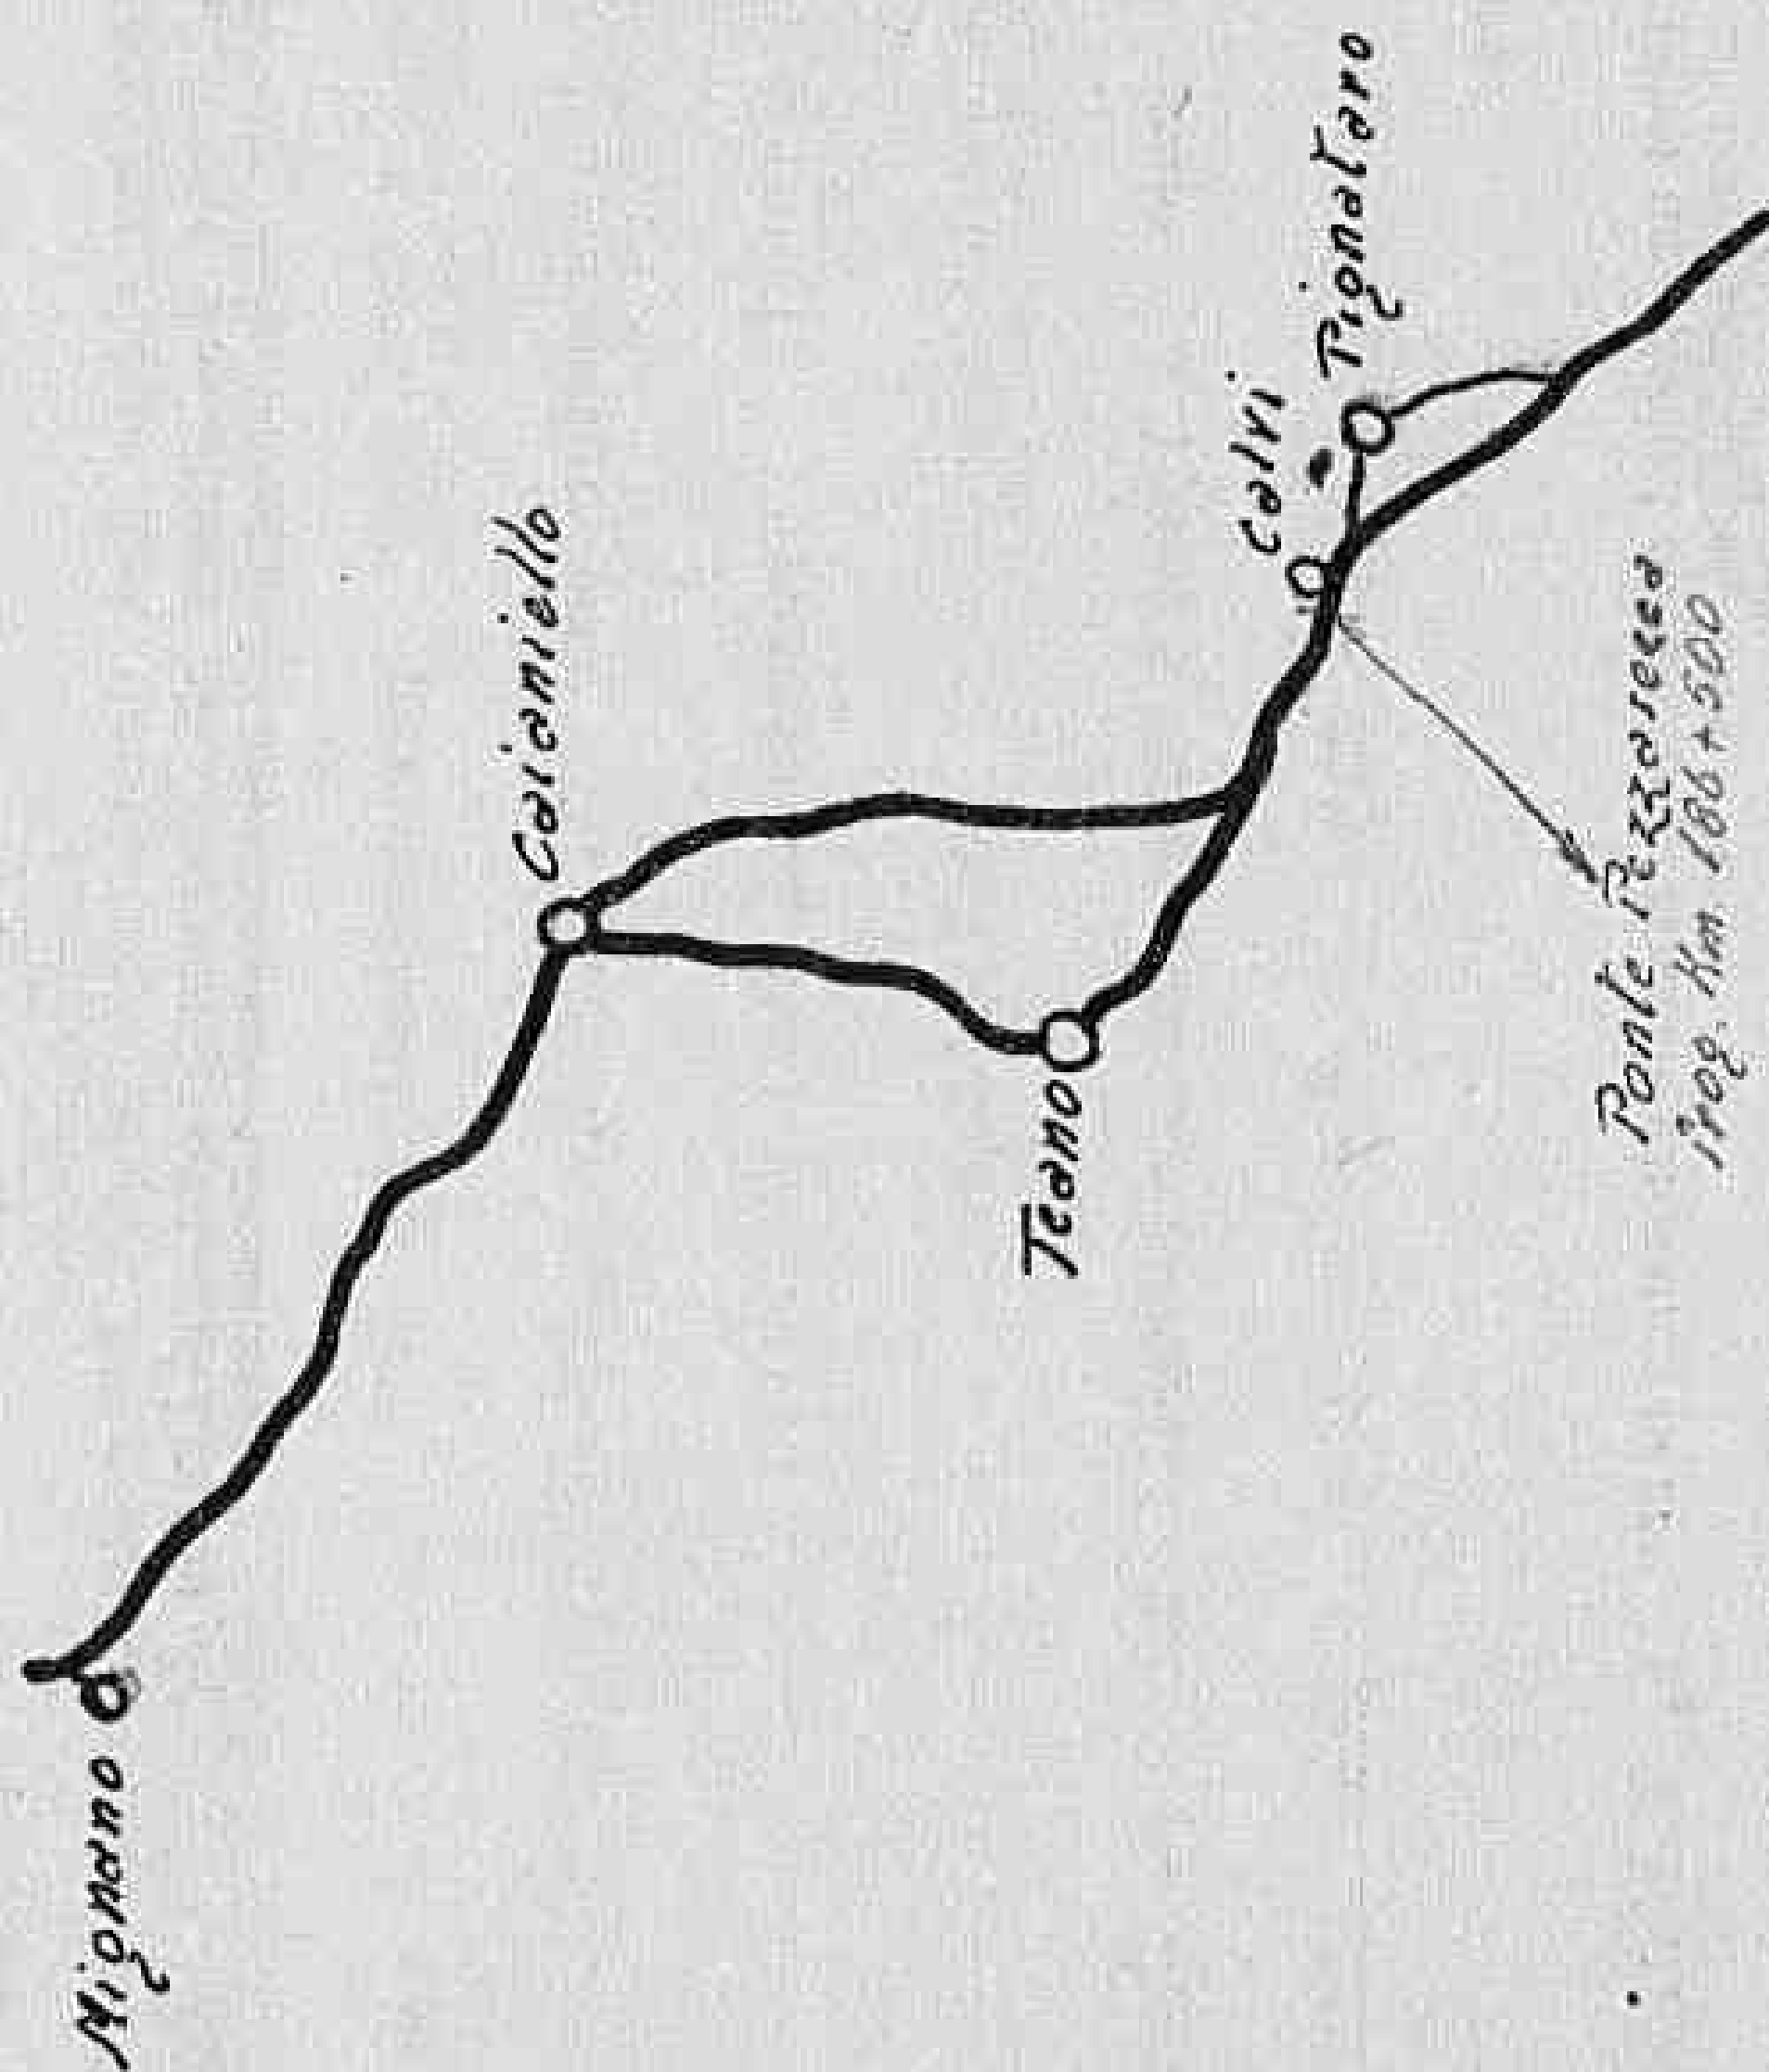

1.7.3

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA MILITARE

This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region	Southern
(APPROVALS)		Province	Benevento
Approvazioni			

1. (a) Building Bridge, Road, Benevento, Southern Italy (Tratto Quattrenti al Benevento, strada, Benevento, Southern Italy) fino al 31-12-1944

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate lire 380.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: U R G E N T E
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 Dicembre 1944
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I lavori saranno eseguiti a mezzo dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
Note speciali

Ref. Letter Hq 82 C.R.E.WKS 4/2/0

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 380.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
FirmaItalian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione Ufficiale

Ing. Capo Amm/ne Prov.le di Benevento

Date, and place
Data e luogo

Benevento addi 10 ottobre 1944

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
 costituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo Region Southern
 (APPROVALS) Province Benevento
 Approvazioni

1. (a) ~~Building-Bridge, Road, Power Sub-Stations, etc.~~ Tavernovola-Quattroventi (Tratto Quattroventi al
~~Fabbricate: ponte, strada, centrale elettrica, etc. e località~~ Volturno). Manutenzione
fino al 31-12-1944

(b) By contract or direct labour per contratto
 Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate lire 380.000,00
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: U R G E N T E
 Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 31 Dicembre 1944
 Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks I lavori saranno eseguiti a mezzo dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
 Note speciali

Ref. Letter Hq 82 C.R.E. Wks 1/2/0

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 380.000,00
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me it covers the full requirements of the project, and is reasonable amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
 Firma

Ing. Capo Am. no Prov. le di Benevento

Italian Engineer
 Ingegnere Italiano

Official designation Ing. Capo Am. no Prov. le di Benevento
 Designazione Ufficiale

Date, and place Benevento addi 10 ottobre 1944
 Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Ing. Capo Am. no Prov. le di Benevento

Date

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved: (Highway Fund)

(Other funds)

W. Thompson

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.


3. Approved. Lt. Colonel R. E.

Deputy }
 Acting } Director

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

& U. Sub-Commission
 (Sub-Commission)

72

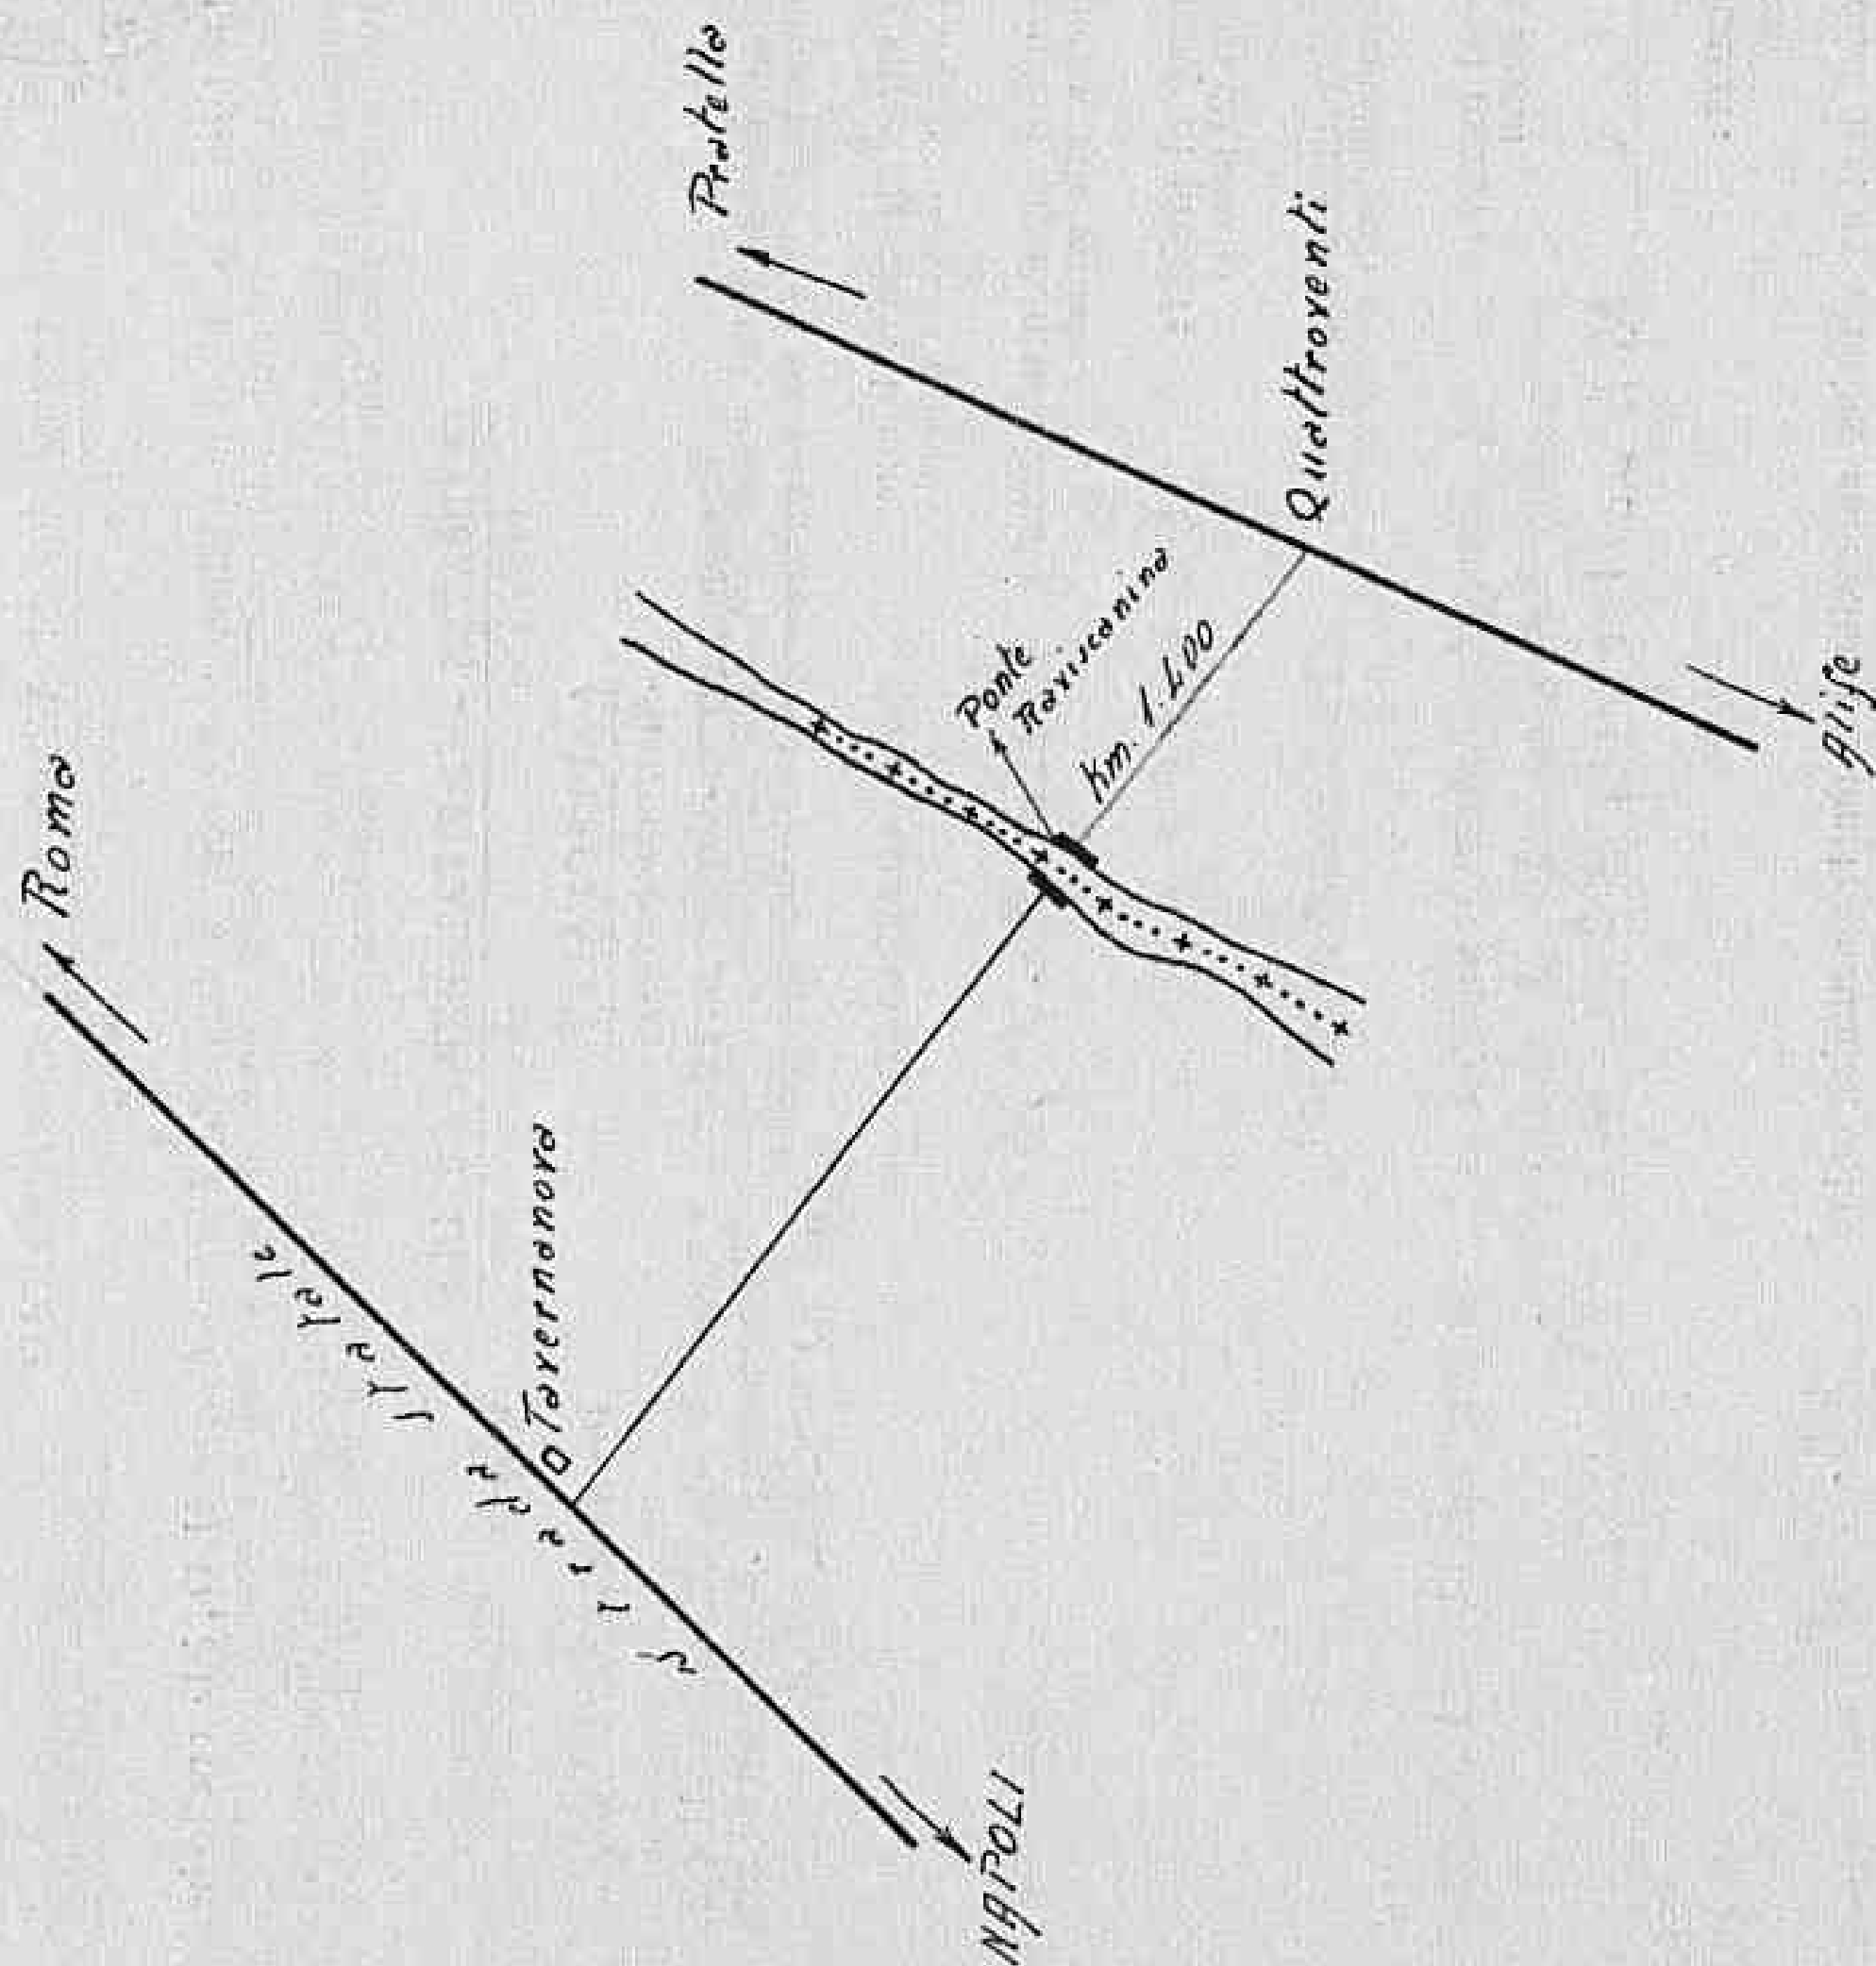

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried out

SECRET

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub+ Commn. E.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES = CAPITAL EXPENDITURE

(APPROVALS)

11. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping Stn etc. and location: Maintenance of road n.99 between Altemura and Matera for months october-november and december 1944.
- (b) By contract or direct labour: direct labour
- (c) Amount of approximate estimate: £.310.000,=
- (d) Urgency of project:
- (e) Probable time for completion: 3 months
- (f) Special remarks:

2. CERTIFICATES:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 310.000,= has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

(Signature: *[Signature]*

Engineer (Official designation:

(Date and place: 17 OCT 1952 BARB) 11

- (b) I agree with preceding certificate and recommend approval

Hubert W. Davis Date 23 October 1944

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping Stn etc. and location: Maintenance of road n.99 between Altamura and Matera for months October-November and December 1944.

(b) By contract or direct labour: direct labour

(c) Amount of approximate estimate: £.310.000,=

(d) Urgency of project:

(e) Probable time for completion: 3 months

(f) Special remarks:

2. CERTIFICATES:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 310.000,= has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian (Signature: *afumax*)

Engineer (Official designation: *Supplente della 252*)

(Date and place: 17 OCT 1944 BARI)

(b) I agree with preceding certificate and recommend approval

..... *W. W. W. W.* Date 23 October 1944
Regional Engineer, or his representative

3. APPROVED (Highway Fund)

(Other funds)

..... *W. W. W. W.*
Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.E.C.

4. APPROVED

.....
Director, P.W. & U. Sub-Commission A.C.C.

Lt. Colonel R. E.

Deputy } Director
Acting }

P. W. & U. Sub-Commission
(Chief Commission)

K/L

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
Estimate of Work to be carried out

---000---

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. (a) Building, Bridge, Road Power Stn Pumping Stn etc., and location: Expenditure for function of 34 A.C.C. lorries for months October, November and December 1944
- (b) By contract or direct labour: direct labour
- (c) Amount of approximate estimate: £.4.245.000,00
- (d) Urgency of project:
- (e) Probable time for completion: 3 months
- (f) Special remarks:

2. CERTIFICATES:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 4.245.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount

Signature: *[Signature]*
Italian Official designation: *[Signature]*
Engineer Date, and place:

- (b) I agree with preceding certificate and recommend approval

251

..... *[Signature]* Date 23 October 1944
Regional Engineer, or his representative.

3. APPROVED (Highway Fund)

(Other funds) *[Signature]* 31/10/44

Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. APPROVED

Director, P.W. & U. Sub-Commission A.C.C.

Lt. Colonel R. E.

Deputy }
/ Acting } Director

P.W. & U. Sub Commission
(Chief Commission)

K/L

FORM AOC 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

CARATTERE MILITARE

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. *Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.*

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo
(APPROVALS)	
Approvazioni	

Region SOUTHERN.Province SALERNO.

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sta., Pumping Sta. etc. and location S.S. N/ro 18 - manutenzione
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate circa 1.000.000,00
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion fino al 31 agosto 1944.
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks lavori già eseguiti per disposizioni del Capitano Weber;
Note speciali

a mezzo Impresa Velotesta

2 Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (Ing. R. lo Nancini)

uma

Italian Engineer

Official designation Capo Commissione to A.A.S.S. - Salerno

250

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo
---------	-------

Region Southern.

(APPROVALS)

Approvazioni

Province **SALERNO**

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Sln., Pumping, Sln. etc. and location S.S. N/ro 19 - manutenzione
Fabbricato ponte, strade, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località straordinario-1° supplemento-
tre Km. 31+600 e Km. 34+600.-
- (b) By contract or direct labour in economia
Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate circa 1.000.000,00
Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: Urgente
Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion fino al 31 agosto 1944.-
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks lavori già eseguiti per disposizioni del Capitano Weber;
Note speciali

2 Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire _____
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire _____

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

È stato preparato da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature _____
Date _____

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

(Ing. R. lo Mengini)
V. Accursi 250

250

Date, and place _____
Data e luogo _____

Quesada, I. I. 28 agosto 1944 R 103 R.A.

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.

2. ~~Approved.~~ (Highway Fund)

~~(Other tumors)~~

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C/C.

- 3 Approved. Lt. Colonel R. E.

Deputy) Director

Inspector Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

W. & U. Sub-Commission

(Affiliated Commission)

Allegato M.6
Form AC/1
(Estimate
REV - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried out

NOTE : This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

1. - a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc., and location *per il servizio sgombrare neve lungo le strade statali del comp. 16 durante*
 (b) By contract or direct labour *1° inverno 944/45 in economia*
 (c) Amount of approximate estimate *£. 750.000,00*
 (d) Urgency of project
 (e) Probable time for completion
 (f) Special remarks

2. - CERTIFICATES:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire **750.000** has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer	Signature <i>Francesco Keller</i>
	Official designation Capo Ufficio speciale Viabilità statale
	Date, and place 10 Ottobre 944

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

William Thompson Date *19 October 1944*
 Regional Engineer, or his representative.

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in the File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

1. - a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping sht etc., and location **Perizia, present**
per il servizio sgombrò neve lungo le strade statali del Comp. 10
 (b) By contract or direct labour **l'inverno 944/45**
 in economia
 (c) Amount of approximate estimate **£. 750.000,00**
 (d) Urgency of project
 (e) Probable time for completion
 (f) Special remarks

2. - CERTIFICATES:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire **750.000** has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian	Signature	<i>Francesco Rella</i>
Engineer	Official designation	Capo Ufficio speciale Viabilità statale
	Date, and place	10 Ottobre 944

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval **249**

William H. Hamilton Date **19 Ottobre 1944**
 Regional Engineer, or his representative.

3. - APPROVED. (Highway Fund)

(Other funds) *W. H. Hamilton* **Nov 16/10/44**
 Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Commission A.C.C.

4. - APPROVED.

Lt. Colonel R. E.

Deputy

Director

& U. Sub Commission

(Head Commission)

Director, P. W. & U. Sub-Commission A C. C.

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
Estimate of Work to be carried out

=====

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm.H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE

1. (a) Building, Bridge, Road Power Stn Pumping Stn etc. and location: Maintenance of road n.100 between Bari and boundry of road n.7 for month October-November and december 1944.
- (b) By contract or direct labour: direct labour
- (c) Amount of approximate estimate: £.625.000,=
- (d) Urgency of project:
- (e) Probable time for completion: 3 months
- (f) Special remarks:

2. CERTIFICATES:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 625.000,= has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

(Signature: *di mare*)

Italian (Official designation: *Ingegnere Capo della Pubblica*
Engineer (Dat and place: 17 OTT 1944)

- (b) I agree with preceding certificate and recommend approval

..... *W. Knight* Date *23 October 1944*
Regional Engineer, or his representative.

3. APPROVED (Highway Fund)

(Other funds) *Thompson* *31/10/44*

Chief, Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. APPROVED

.....
Director, P.W. & U. Sub-Commission A.C.C.

W. Knight
Lt. Colonel R. E.

Deputy }
Acting } Director

P. W. & U. Sub Commission
(Allied Commission)

K/L

248

FORM ACC.
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region	Province
(a) Building, Bridge, Road, Power, Stry, Pumping, Str etc. and location <i>Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località</i>		Southern	Potenza
Partial reconstruction of Don Ciccio Bridge at Km. 101+980 supplementary estimate			Potenza Pilo 3131

Contract

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 45.680,00

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione eight months

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 45,680,000 247
Certifico che l'attesa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers all requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

ESTIMATES-CAPITAL EXPENDITURE

Perizia _____ Costo _____ Region Southem
 (APPROVALS) Province Potenza File 3181
 Approvazioni _____

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sm, Pumping Sm etc. and location By 93rd Army 2nd Division Military
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località By Section Potenza Atella
Partial reconstruction of Don Cicco Bridge at Km. 101+980 supplementary
estimate

(b) By contract or direct labour _____ Contract _____
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate _____
Ammontare della perizia L. 15.680,00

(d) Urgency of project: _____
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion _____
Data probabile per l'esecuzione eight months

(f) Special remarks _____
Note speciali

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 247
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire L. 15.680,000

has been prepared by me: it covers all requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER LA
VIABILITÀ-POTENZA

Date, and place
Data e luogo

Potenza 19
1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.

2. **Approved.** (Highway Fund)

(Other funds)

Chief, Public Work Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. **Approved.** Lt. Colonel R. E.

Deputy } Director
 Acting }

P. W. & U. Sub-Comm.

(Allied Commission)

SOUTHERN REGION
ALLIED CONTROL, COMMISSION
BARI ZONE

31 OCT Recd
c/pw-
Ceb

Ref. BZ/PU/2/4
27. October 1944

Subject: SUPPLEMENTARY ESTIMATE

To : LT. COL THOMPSON, HQ. A.C.C. PW&U S.C. ROME

Herewith Form ACC/1 in triplicate for Don Ciccio (Potenza) bridge, your reference number for this project is 192. The original estimate for L. 600.000 was approved by you. The lowest bid which could be accepted was the at the estimated figure, less 8%, therefore it was necessary for the Genio Civile to submit a supplementary estimate to cover the increased cost. Will you please approve same and pass through to the Ministry of Public Works.

W. Knight
MAJOR W. KNIGHT
PUBLIC WORKS ENGINEER
BARI ZONE

Form. AAC/1
(Estimate
Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

Estimate of Work to be carried out

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Commn. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Sistemaz. tratto
strada S. Cecilia
Campo di aviazione
Km. 3,00

1. - (a) Building, Bridge, Road, Power Stn Pumping stn etc., and location
(b) ~~By contract~~ or direct labour in economia
(c) Amount of approximate estimate L. 750.000,00
(d) Urgency of project urgente per necessità militari
(e) Probable time for completion mesi 1 e giorni 15
(f) Special remarks I lavori servono anche per facilitare l'accesso
ai campi di aviazione.

2. - CERTIFICATES:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 750.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer	Signature (Emilio Simeoni)
Official designation	Ingegnere Capo del Genio Civile
Date, and place	Foggia, 15 settembre 1944

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE (APPROVALS)

Sistemaz. tratto
strada S. Cecilia
campo di aviazione
L. 3,00

1. - (a) Building, Bridge, Road, Power S'n Pumping sin etc., and location
- (b) ~~By contract~~ or direct labour in economia
- (c) Amount of approximate estimate L. 750.000,00
- (d) Urgency of project urgente per necessità militari
- (e) Probable time for completion mesi 1 e giorni 15
- (f) Special remarks I lavori servono anche per facilitare l'accesso ai campi di aviazione.

2. - CERTIFICATES:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 750.000,00 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian	Signature	(Emilio Simeoni)
Engineer	Official designation	Ingegnere Capo del Genio Civile
	Date, and place	Foggia, 15 settembre 1944

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Capt. Lambie Date 22 September

Regional Engineer, or his representative.

3. - APPROVED. (Highway Fund)

(Other funds)

4. - APPROVED.

Chief, Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Commission C.C.C.

Col. Li. Colonel R. E. Deputy Director

Director, P. W. & U. Sub-Commission C.C.C.

P. W. & U. Sub-Commission C.C.C.

(Attended Commission)

SOUTHERN REGION
 ALIEN CONTROL COMMISSION
 BARI PROVINCE

PW+U
 REF.BZ/PU/2/4
 29. September 44

4 Oct 1944 108
Subject: ESTIMATE FOR MAINTENANCE W.D. VEHICLES *2472*

To : PUBLIC WORKS & UTILITIES, SUB COMMISSION, ROME
For : LT.COL. THOMPSON

Herewith Form ACC/1 in triplicate in respect of
 3 months expenditure for maintenance of W.D. lorries operating
 in Potenza Province.

This can be debited to the Military Highway fund.

W. Knight
 Major W. Knight
 P.U. Engineer
 ACC&(L)ROADS
 Southern Region



Serial POT/33

FORM ACC.
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, *Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.*

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region ROMANIAProvince Yokohama 5,3000

WORKS

1. (a) Building Bridge Road Power Station and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Ordinary maintenance and repair of 100000.

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

Direct labour

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

7,215,000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

Three months

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 225,000
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer

Modelled by Giulio Civile

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, *in via all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.*

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia _____ Costo _____
 (APPROVALS)
 Approvazioni _____

Region MontenegroProvince Podgorica

TOWN

I. (a) Building Bridge, Road, Power, etc. Pumping Station and location
Fabbricato, ponti, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Ordinary maintenance and replacement of town.

(b) By contract or direct labour _____
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate _____
Ammontore della perizia

(d) Urgency of project : _____
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion _____
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks _____
Note speciali

2. Certificates :
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 335,000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me : it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me : essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
FirmaItalian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione UfficialeDate, and place
Data e luogo

Podgorica 11 September 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

L. Kujum Regional Engineer, or his representative. Date 27 Sept. 1944

2. Approved. (Highway Fund)

~~(Other funds)~~

Podgorica 27 Sept 1944
 Chief, Public Work Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C. C.

3. Approved.

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

SOUTHERN REGION
 ALLIED CONTROL COMMISSION
 BARI ZONE

22 OCT Recd

c/pw
LWS

Ref. BZ/10/2/4
 19. October 1944

Subject: PROVINCIAL ROAD

To : LT.COL. THOMPSON, HQ. A.C.C. P.W.&U. S.C. ROME

Herewith Form ACC/1 in triplicate in respect of
 Provincial road S.Basilio-Castellaneta, which runs from
 the main Bari-Taranto, Hy 100 to Taranto-Matera, Hy 7.

This road is being done on request of the
 Military, as it runs past the Polish camp.

HEADQUARTERS
 to the Highway Fund.
 22 OCT 1944

A.C.C.

Major "W. Knight"
 P.W.&U. Sub Com.
 Bari Zone

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT.

PUBLIC WORKS AND UTILITIES - SUB-COMMITTEE

396

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT.

Form ACS/1
(Intro. to
Reg-5 June 44)

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in sub-Comm. P.C., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
(APPROXIMATE)

- A. a) Building, Bridge, Road, Power
Sta, Pumping Sta etc, and location. *Road I. Bahio - Castellana (Km. 2,500)*
- b) By contract or direct labour..... *direct labour*
- c) Amount of approximate estimate..... *\$ 370,000. =*
- d) Urgency of project..... *perfect*
- e) Probable time for completion..... *50 hours*
- f) Special remarks..... *=*

3. Certification:

- a) Certified that the attached approximate estimate amounting to
Lira..... has been prepared by me; it covers the full
requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian
Engineer

Signature.....

Venezia Nicola

Official Designation.....

Ingegnere Ufficio Tecnico Provinciale

Date, and place.....

12 ottobre 1944

- b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

.....
Regional Engineer
(Highway Fund)

Luigi M. Majo

..... Date *19 October 1944*

4. Approved:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Approved:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Director, P.W. Sub-Commission A.C.C.

LT. 244 RE

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region SOUTH

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Catanzaro

1. (a) ~~Spanning Bridge~~, Road, ~~Power-San Pumping Station~~, and location S.S.19 Auro di sostegno
(T 7743)
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
- (b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate Lire 53,000,00
Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: Urgente per la sicurezza della viabilità
Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion UN mese
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 53,000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. e stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Capo	Compartimento	Viabilità
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Date, and place 28 settembre 1944 - Catanzaro
Data e luogo

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimurrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE		Region SOUTH
Perizia	Costo	
(APPROVALS)		Province Catanzaro
Approvazioni		

1. (a) ~~Bridge, Road, Power Station, Pumping Station~~ and location S.S.19 ~~Auto di sostegno~~
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
(T 7743)
- (b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate Lire 53.000,00
Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: Urgente per la sicurezza della viabilità
Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion UN mese
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates: Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 53.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Capo Compartimento Viabilità

Date, and place 28 settembre 1944 - Catanzaro
Data e luogo

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

William H. Hamilton Date 12 October 1944

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

Other funds

Champion 17/10/44
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. 243.

3. Approved.

Colonel F. E.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Deputy Director
Acting
P. W. & U. Sub Commission
(Attied Commission)

IT. Col., R.E.

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region *South*

(APPROVALS)

Approvazioni

Province *Adriatic*

33.11.18 "Città di Tronco"
Bivio S. Giovanni-Bivio
Mastrella. 20157

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
- (b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: urgenti riparazioni del piano viabile per assicurare la
Urgenza del progetto normalità e la sicurezza del transito.
- (e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.200.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
e stata preparata da me: essa risponde a tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
FirmaItalian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione ufficiale

Capo Compartimento Viabilità Catanzaro

Date, and place
Data e luogo

30 Agosto 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Works.
Publici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region *South*

(APPROVALS)

Approvazioni

Province *Calabria*SS. N. 13 *Trinacra Inf. M. Troc.*

Bivio S. Gianni-Bivio

Mastrella. 20757

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia L. 1.200.000,00(d) Urgency of project: *urgenti riparazioni del piano viabile per assicurare la*
Urgenza del progetto *normalità e la sicurezza del transito.*(e) Probable time for completion *Mesi tre*
Data probabile per l'esecuzione(f) Special remarks *Fabbriano emulsione bituminosa q.li 500.*
Note speciali2. Certificates:
Certificati(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.200.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.Signature
FirmaItalian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione ufficiale

Cappo Compartimento Viabilità Catanzaro

Date, and place
Data e luogo

30 Agosto 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Francesco R. R. Date *28 September 1944*
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other Funds)

W. Thompson 11/10/44
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved.

G. R. *LT. Col. R. E.*
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

N° ACC/1
(Estimate)
Rey = 7 June 44

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
Estimate of Works to be carried out

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H Q File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc, and Location
 Reconstruction of Bridges Bivento and Portofino and of two lifts bridges (Valente I and II) on State Road N° 16 between Foglia and Saccione River
 £. 1,070,900 = by contract and £. 149,100 = direct labour.
 (b) By contract or direct labour £. 1,220,000 =
 (c) Amount of approximate estimate £. 1,220,000 =
 (d) Urgency of project Urgent.
 (e) Probable time for completion 4 Months
 (f) Special remarks Required Cement Tons 118; Briks N. 70,000 = Iron Tons 1,6.
 2. Certificates
 (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1,220,000 = has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian Engineer
 Signature... *Severino Foglia*
 Official Designation Chief Section of the Special Office
 Genio Civile per la Viabilità+Sezione
 Staccata di Foglia dipendente dallo
 Ufficio di Bari.
 Date and place, 29 / 9 / 1944. Foggia.

Note: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H Q File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE
(APPROVALS)

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc, and Location
 Reconstruction of Bridges Divenno and Portofino and of two little bridges (Valente I and II) on State Road No 16 between Fog-
 Gia and Saccione River
 £. 1.070.900 = by contract and £. 149.100 = di-
 rect labour.
 (b) By contract or direct labour £. 1.220.000 =
 (c) Amount of approximate estimate £. 1.220.000 =
 Urgent.
 (d) Urgency of project 4 Months
 (e) Probabl. time for completion
 Required Cement Tons 118; Briks N. 70.000 = Iron Tons 1,6.
 (f) Special remarks.....
2. Certificates
 (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 1.220.000 = has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

Italian
Engineer

{ Signature... *Donatello Foglia*
 { Official Designation Chief Section of the Special Office
 { Genio Civile per la Viabilità e Sezione
 { Staccata di Foggia dipendente dallo
 { Ufficio di Bari.

(Date and Place. 29 / 9 / 1944. Foggia.
 (I agree with the foregoing certificate and recommend approval.

R. Amato Date. 30. 9. 44.
 Regional Engineer, or his representative.

3. Approved
 (Highway fund) *Donatello Foglia* 29/9/44
 (~~other funds~~)
 Chief Public Works P.W. and U. Sub-Commission ACC.
G. E. Amato
 Director P.W. and U. Sub-Commission A.C.C. *L. T. Col. R. E.*

4. Approved

Subject: ACC forms for
Reconstruction of
Bridges Bivento
Fortorino & 2 Other
small Bridges.

PW + W
ALLIED CONTROL COMMISSION
Highways Division
Foggia Province
Tel 14. *9 OCT Recd*
Ref: SRB/203. *108 Cels*

TO: P.W. & U. Sub-Commission ✓
A.C.C. H.Q.
C.M.F.

1. Attached are ACC I forms of above ~~four~~ small bridges.
2. Cement and bricks can be obtained from usual sources and ~~steel~~ is available here.

Prefettura Vecchia
Foggia
5.Sep.44.

J. Lambie
Capt.
Highways Engineer.



FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This module is filled in in triplicate copies; one copy remains at the General Office of the Sub-Commission, one is returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This module is filled in in triplicate copies; one copy remains at the General Office of the Sub-Commission, one is returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Region ~~ITALY~~ SOUTHERN
Province SALERNO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sn, Pumping Sn etc. and location Strada Statale N. 91 - " Della Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Valle del Sele " - Ponticelli sul torrente ACERRA alle prog. Km. 120 e 120 + 100.-
- (b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate I. 160.000 -
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Precedenza 1.
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 2 mesi
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks è necessario provvedere d'urgenza alla rimozione del materiale delle acque del torrente ACERRA.
Note speciali

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I. 160.000-
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature *G. Scialoja* (Ing. Giuseppe Scialoja)
Firma

Official designation
Designazione Ufficiale
L'ing. dirigente la Sezione Progetti

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Date, and place Salerno, settembre 1944
Data e luogo

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Region ~~ITALY~~ SOUTHERN
Province SALERNO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Str, Pumping Str etc. and location Strada Statale N. 91 - " Della Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Valle del Sele " - Ponticelli sul torrente ACERRA alle prog. Km. 120 e 120 + 100. -
(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate I. 160,000 -
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project: Precedenza 1^a -
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion 2 mesi
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks è necessario provvedere d'urgenza alla rimozione del materia-
Note speciali

le che costituisce l'attuale opera provvisoria per assicurare lo scolo delle acque del torrente ACERRA.

2. Certificates:
Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire I. 160,000 -
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma

Official designation
Designazione Ufficiale

Date, and place Salerno, 7 settembre 1944
Data e luogo

L'ing. dirigente la Sezione Disaccidi
(Ing. Giuseppe SPALIERA)

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (Highway Fund)


(Other funds)

Regional Engineer, or his representative.

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm.-A. C. C.

3. Approved.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

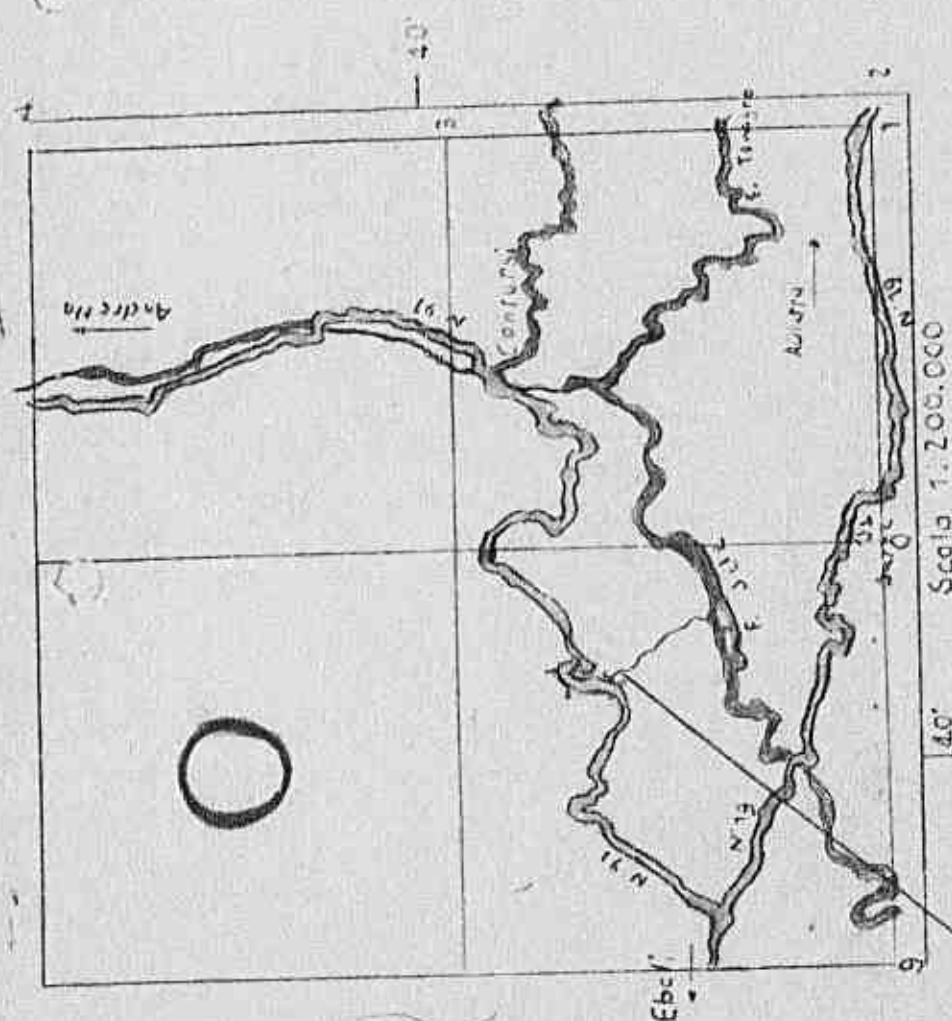

PONTICELLI SUL TORRENTE "ACERRA"

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

MILITARY HIGHWAYS.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region LE SOUTHERN

Province Salerno

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sin, Pumping Sin etc. and location. Strada Statale 19 - Tronco : Fabbicato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Battipaglia - Km. 13,500 (ponte S. le) Sistemazione piano viabile - Perizia Suppletiva.

- (b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate £. 1.500.000,00 (suppletiva)

Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

Urgente

(e) Probable time for completion 30 giorni

Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Il materiale contingentato dovrà essere fornito dagli

Note speciali

Allenti.

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.500.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Salerno (Ing. Giuseppe SCALERA)



Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

L'Ing. dirigente la Sez.

accata

Date, and place

Data e luogo

Salerno

Not to be used with the preceding certificate and recommend approval.

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
In via all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

MILITARY HIGHWAYS.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni
Region SOUTHERN
Province Salerno

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sn, Pumping Sn etc. and location Strada Statale 19 - Treno :
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Battipaglia - Km. 13,500 (ponte 3
(b) By contract or direct labour 12) Sistemazione piano viabile - Perizia Suppletiva.
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 1.500.000,00 (suppletiva)
Ammontare delle perizie

(d) Urgency of project: Urgente
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion 30 giorni
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Il materiale contingente dovrà essere fornito dagli
Note speciali

Allesti.

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 1.500.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me, essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano
Official designation
Designazione Ufficiale
L'Ing. dirigente la Ser. accata
Date, and place
Data e luogo
Salerno
12 settembre 1944

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

15.9.44 12 settembre 1944 239
12 settembre 1944
Regional Engineer, or his representative.
Approved. (Highway Fund)
Other funds
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.
12 settembre 1944

3. Approved.
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.
12 settembre 1944



Scale 1:250,000
Strada ST 19 = Tronca, Berthouglia - km 13 500 (Ponte Sela)

0 3 5 5
